



การติดตามความก้าวหน้า

# การบริหารจัดการ งบประมาณ

เขตสุขภาพที่ 8

1 เมษายน 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2568 เวลา 11.30 น.



# 1.การบริหารจัดการงบลงทุนปี 2567 ที่กันเงินเหลือมปีไว้ใช้จ่ายในปี 2568

ภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบลงทุน เขตสุขภาพที่ 8 แยกรายจังหวัด

ลำดับ	จังหวัด	ก่อสร้างปีเดียว				ก่อสร้างผูกพัน				ครุภัณฑ์				ผลรวม			
		กันเงินสุทธิ	เบิกจ่าย	%การเบิกจ่าย	งบคงเหลือ	กันเงินสุทธิ	เบิกจ่าย	%การเบิกจ่าย	งบคงเหลือ	กันเงินสุทธิ	เบิกจ่าย	%การเบิกจ่าย	งบคงเหลือ	กันเงินสุทธิ	เบิกจ่าย	%การเบิกจ่าย	งบคงเหลือ
1	อุดรธานี	3,313,575.00	3,313,575.00	100.00%	-	36,647,100.00	6,330,900.00	17.28%	30,316,200.00				0.00	39,960,675.00	9,644,475.00	24.13%	30,316,200.00
2	สกลนคร	4,362,500.00	4,362,500.00	100.00%	-	65,396,200.00	4,151,300.00	6.35%	61,244,900.00	2,936,004.00	2,936,004.00	100.00%	-	72,694,704.00	11,449,804.00	15.75%	61,244,900.00
3	นครพนม				0.00	58,444,900.00	0.00	0.00%	58,444,900.00	1,899,000.00	1,898,000.00	99.95%	1,000.00	60,343,900.00	1,898,000.00	3.15%	58,445,900.00
4	เลย	37,724,043.09	10,604,683.98	28.11%	27,119,359.11	38,817,700.00	3,468,400.00	8.94%	35,349,300.00	23,493,000.00	23,493,000.00	100.00%	-	100,034,743.09	37,566,083.98	37.55%	62,468,659.11
5	หนองคาย	13,455,969.69	1,224,769.69	9.10%	12,231,200.00	116,685,618.00	0.00	0.00%	116,685,618.00	12,053,800.00	12,053,800.00	100.00%	-	142,195,387.69	13,278,569.69	9.34%	128,916,818.00
6	หนองบัวลำภู				0.00	8,308,600.00	0.00	0.00%	8,308,600.00				0.00	8,308,600.00	0.00	0.00%	8,308,600.00
7	บึงกาฬ	15,555,718.00	1,949,649.00	12.53%	13,606,069.00	39,668,207.95	18,487,955.31	46.61%	21,180,252.64				0.00	55,223,925.95	20,437,604.31	37.01%	34,786,321.64
<b>ผลรวม</b>		<b>74,411,805.78</b>	<b>21,455,177.67</b>	<b>28.83%</b>	<b>52,956,628.11</b>	<b>363,968,325.95</b>	<b>32,438,555.31</b>	<b>8.91%</b>	<b>331,529,770.64</b>	<b>40,381,804.00</b>	<b>40,380,804.00</b>	<b>99.998%</b>	<b>1,000.00</b>	<b>478,761,935.73</b>	<b>94,274,536.98</b>	<b>19.69%</b>	<b>384,487,398.75</b>

ลำดับ	จังหวัด	งบลงทุนปี 67 (งบกลาง)				งบลงทุนปี 68 (ครุภัณฑ์)				งบลงทุนปี 68 (สิ่งก่อสร้าง)				ผลรวม			
		วงเงินรวม(บาท)	เบิกจ่าย	%การเบิกจ่าย	งบคงเหลือ	วงเงินรวม(บาท)	เบิกจ่าย	%การเบิกจ่าย	งบคงเหลือ	กันเงินสุทธิ	เบิกจ่าย	%การเบิกจ่าย	งบคงเหลือ	กันเงินสุทธิ	เบิกจ่าย	%การเบิกจ่าย	งบคงเหลือ
1	อุดรธานี	13,000,000.00	695,700.00	5.35%	12,304,300.00	45,792,400.00	4,111,793.50	8.98%	41,680,606.50	559,523,300.00	916,000.00	0.16%	558,607,300.00	618,315,700.00	5,723,493.50	0.93%	612,592,206.50
2	สกลนคร	11,800,000.00	3,500,000.00	29.66%	7,700,000.00	194,340,000.00	6,543,200.00	3.37%	187,796,800.00	113,665,200.00	0.00	0.00%	113,665,200.00	319,805,200.00	10,043,200.00	3.14%	309,762,000.00
3	นครพนม	550,000.00	0.00	0.00%	5,500.00	33,100,000.00	33,075,600.00	99.93%	24,400.00				33,650,000.00	33,075,600.00	98.29%	574,400.00	
4	เลย	16,850,000.00	16,833,205.00	99.90%	16,795.00	51,393,000.00	29,210,200.00	56.84%	22,182,800.00	12,377,100.00	300,000.00	2.42%	12,077,100.00	80,620,100.00	46,343,405.00	57.48%	34,276,695.00
5	หนองคาย	7,600,000.00	3,087,000.00	40.62%	4,513,000.00	137,720,500.00	817,500.00	0.59%	120,822,300.00	92,429,900.00	0.00	0.00%	92,009,200.00	237,750,400.00	3,904,500.00	1.64%	233,845,900.00
6	หนองบัวลำภู	3,350,000.00	0.00	0.00%	453,000.00	24,385,400.00	11,473,275.00	47.05%	2,514,775.00	34,894,300.00	1,027,000.00	2.94%	33,867,300.00	62,629,700.00	12,500,275.00	19.96%	50,129,425.00
7	บึงกาฬ	1,150,000.00	1,243,955.00	108.17%	-	17,625,000.00	2,810,000.00	15.94%	14,815,000.00	20,809,000.00	0.00	0.00%	20,809,000.00	39,584,000.00	4,053,955.00	10.24%	35,530,045.00
<b>ผลรวม</b>		<b>54,300,000.00</b>	<b>25,359,860.00</b>	<b>46.70%</b>	<b>24,992,595.00</b>	<b>504,356,300.00</b>	<b>88,041,568.50</b>	<b>17.46%</b>	<b>389,836,681.50</b>	<b>833,698,800.00</b>	<b>2,243,000.00</b>	<b>0.27%</b>	<b>831,035,100.00</b>	<b>1,392,355,100.00</b>	<b>115,644,428.50</b>	<b>8.31%</b>	<b>1,276,710,671.50</b>

ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2568 เวลา 11.30 น.

# 1.การบริหารจัดการงบลงทุนปี 2567 ที่กันเงินเหลือในปีไว้ใช้จ่ายในปี 2568

1.1 สรุปรายการงบลงทุน(สิ่งก่อสร้าง)ปี 2567 ที่กันเงินเหลือปี 2568 **จำแนกตามความเสี่ยงแยกรายจังหวัด**

จังหวัด	ก่อสร้างปีเดียว(รายการ)					ก่อสร้างผูกพัน(รายการ)					รวม				
	ทั้งหมด	เสียงต่ำ	เสียงกลาง	เสียงสูง	เสียงพิบ	ทั้งหมด	เสียงต่ำ	เสียงกลาง	เสียงสูง	เสียงพิบ	ทั้งหมด	เสียงต่ำ	เสียงกลาง	เสียงสูง	เสียงพิบ
นครพนม	0					2				2	2	0	0	0	2
บึงกาฬ	10		8	1	1	2		1		1	12	0	9	1	2
เลย	8		1	7		3		1	1	1	11	0	2	8	1
สกลนคร	4		4			4			2	2	8	0	4	2	2
หนองคาย	7		1	5	1	3		3			10	0	4	5	1
หนองบัวลำภู	0					2			1	1	2	0	0	1	1
อุดรธานี	3	2		1		5		4		1	8	2	4	1	1
<b>รวม</b>	<b>32</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>53</b>	<b>2</b>	<b>23</b>	<b>18</b>	<b>10</b>

ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2568 เวลา 11.30 น.

## หลักเกณฑ์จำแนกความเสี่ยง ณ ก.พ. 2568

ประเภทงบลงทุน	เสียงต่ำ	เสียงกลาง	เสียงสูง	เสียงพิบ
ครุภัณฑ์			เบิกจ่ายไม่ทัน ก.ย. 67 เสียงสูงทุกรายการ	เบิกจ่ายไม่ทัน ก.ย. 68
ก่อสร้างปีเดียว		เบิกจ่ายภายใน มี.ค. 68	เบิกจ่ายภายใน ก.ค. 68	เบิกจ่ายไม่ทัน ก.ย. 68
ก่อสร้างผูกพัน	ล่าช้า 1-2 งวด/เบิกจ่ายภายใน ธ.ค. 67	ล่าช้า 3-4 งวด/เบิกจ่ายภายใน มี.ค. 68	ล่าช้า 5 งวดขึ้นไป/ผู้รับจ้างทิ้งงาน/ยังไม่ลงนามสัญญา/แก้ไขสัญญา	เบิกจ่ายไม่ทัน ก.ย. 68

# 1.การบริหารจัดการงบลงทุนปี 2567 ที่กันเงินเหลื่อมปีไว้ใช้จ่ายในปี 2568

ภาพรายการงบลงทุนปี 2567 เหลื่อมปี 2568(ก่อสร้างปีเดียว) แยกรายจังหวัด

ลำดับ	จังหวัด	จำนวนทั้งหมด (รายการ)	ทำถึงขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง						จำนวนงวดงานที่ล่าช้า					สถานะความเสี่ยง					
			ประกาศผู้ชนะเสนอราคา	รอลงนามสัญญา	ลงนามสัญญา	เริ่มงานก่อสร้างตามแผน	กรรมการตรวจรับงานจ้าง	เบิกจ่ายเงินตามงวดงาน	เบิกจ่ายงวดสุดท้าย	ไม่มีล่าช้า	ช้า 1 งวด	ช้า 2 งวด	มากกว่า 2 งวด	ไม่มีข้อมูล	เสี่ยงต่ำ	เสี่ยงกลาง	เสี่ยงสูง	เสี่ยงพบ	
												จำนวน	ร้อยละ						
1	อุดรธานี	3	0	0	0	0	0	1	2	0	2	1	0	0.00%	0	2	0	1	0
2	สกลนคร	4	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0.00%	0	0	4	0	0
3	นครพนม																		
4	เลย	8	0	0	0	6	1	0	1	3	1	3	1	12.50%	0	0	1	7	0
5	หนองคาย	7	0	0	0	7	0	0	0	3	1	2	1	14.29%	0	0	1	5	1
6	หนองบัวลำภู																		
7	บึงกาฬ	10	0	0	0	2	0	8	0	1	0	2	7	70.00%	0	0	8	1	1
<b>ผลรวม</b>		<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>28.13%</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>2</b>

ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2568 เวลา 11.30 น.

# 1.การบริหารจัดการงบลงทุนปี 2567 ที่กันเงินเหลื่อมปีไว้ใช้จ่ายในปี 2568

1.1 รายการงบลงทุนปี 2567 เหลื่อมปี 2568(ก่อสร้างปีเดียว) **ที่เสี่ยงสูง/เสี่ยงพับ แยกรายจังหวัด**

## จังหวัดอุดรธานี

ลำดับ	ชื่อรายการตาม พ.ร.บ.	ชื่อสถานที่	จังหวัด	ทำถึงขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง	วันที่คาดว่าจะลงนามสัญญา	วันที่ลงนามจริง	วันครบกำหนดส่งมอบตามสัญญา	วันที่เบิกจ่ายเงินจริง	จำนวนงวดงานปี 2568 (ระบุงวดงาน)	ปัจจุบันดำเนินการถึงงวดงานที่	จำนวนงวดงานที่ล่าช้า	สาเหตุความล่าช้า	สถานะความเสี่ยง
6	บ้านพักข้าราชการระดับปฏิบัติงาน (บ้านแฝด) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 130 ตารางเมตร โรงพยาบาลทุ่งฝน ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง	โรงพยาบาลทุ่งฝน	อุดรธานี	25.เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างตามงวดงาน		27/6/2567	4/1/2568	26/3/2568	5	5	0ไม่มีล่าช้า	ดำเนินการก่อสร้างและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	เสี่ยงสูง

ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2568 เวลา 11.30 น.

# 1.การบริหารจัดการงบลงทุนปี 2567 ที่กันเงินเหลื่อมปีไว้ใช้จ่ายในปี 2568

## 1.1 รายการงบลงทุนปี 2567 เหลื่อมปี 2568(ก่อสร้างปีเดียว) ที่เสี่ยงสูง/เสี่ยงพับ แยกรายจังหวัด

### จังหวัดเลย

ลำดับ	ชื่อรายการตาม พ.ร.บ.	ชื่อสถานที่	จังหวัด	ทำถึงขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง	วันที่คาดว่าจะลงนามสัญญา	วันที่ลงนามจริง	วันครบกำหนดส่งมอบตามสัญญา	วันที่เบิกจ่ายเงินจริง	จำนวนงวดงานปี 2568 (ระบุถึงงวดงานที่)	ปัจจุบันดำเนินการถึงงวดงานที่	จำนวนงวดงานที่ล่าช้า	สาเหตุความล่าช้า	สถานะความเสี่ยง
12	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 480 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลหนองหิน ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย 1 หลัง	โรงพยาบาลหนองหิน	เลย	18.ผู้ควบคุมงานรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน	20มีย67	20มีย67	23เมย68	จ่ายงวดที่1 27 ธค67 งวดที่2 3 มีค68 งวดที่3 3 มีค68	7	6	2	อยู่ระหว่างการส่งมอบงานงวดที่4และ5	เสี่ยงสูง
13	บ้านพักข้าราชการระดับปฏิบัติงาน (บ้านแฝด) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 130 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลนาแห้ว ตำบลนาแห้ว อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 1 หลัง	โรงพยาบาลนาแห้ว	เลย	18.ผู้ควบคุมงานรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน	21มีย67	21มีย67	24ธค67	งวดที่1และงวด2 13มีค68	5	3	2	คาดว่าจะส่งมอบงานแล้วเสร็จวันที่12พฤษภาคม2568	เสี่ยงสูง
14	บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ ปฏิบัติการ/ อาวุโส/ ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลผาขาว ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย 1 หลัง	โรงพยาบาลผาขาว	เลย	23.รายงานผลการตรวจรับ และบันทึกยอมรับ-ส่งมอบใน MIS	28พค67	21มีย67	31พย67	เบิกจ่ายครบทุกงวด งวดสุดท้าย13มีค68	5	5	0ไม่มีล่าช้า	ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว	เสี่ยงสูง
15	บ้านพักข้าราชการระดับปฏิบัติงาน (บ้านแฝด) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 130 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลภูกระดึง ตำบลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 1 หลัง	โรงพยาบาลภูกระดึง	เลย	18.ผู้ควบคุมงานรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน	4มีย67	4มีย67	9ธค67	เบิกจ่ายงวด1 และ2 10มีค68	5	4	1	คาดว่าจะส่งมอบงานแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนเมษายน2568	เสี่ยงสูง
17	บ้านพักข้าราชการระดับปฏิบัติงาน (บ้านแฝด) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 130 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลนาด้วง ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย 1 หลัง	โรงพยาบาลนาด้วง	เลย	18.ผู้ควบคุมงานรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน	5มีย67	5มีย67	30พย67	เบิกงวดที่1 21 พย67	5	3	2	งวดอยู่ที่งวดงานที่3อยู่ระหว่างรอส่งงานงวดที่2 ผู้รับจ้างยินยอมเสียค่าปรับ และทำแผนการก่อสร้างภายในสิ้นเดือน 12พฤษภาคม2568	เสี่ยงสูง
18	อาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 576 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลปากชม ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย 1 หลัง	โรงพยาบาลปากชม	เลย	18.ผู้ควบคุมงานรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน	1กค67	1กค67	5พค68	เบิกจ่ายงวด1 และ2 29มค68 เบิกจ่ายงวด3 27 กพ68	5	5	0ไม่มีล่าช้า		เสี่ยงสูง
21	อาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพ เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 514 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลเอราวัณ ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 1 หลัง	โรงพยาบาลเอราวัณ	เลย	18.ผู้ควบคุมงานรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน	1ธค67	1ธค67	19พค68		6		3	ตรวจรับงานงวด1และ2วันที่26มีค68	เสี่ยงสูง

# 1.การบริหารจัดการงบลงทุนปี 2567 ที่กันเงินเหลือในปีไว้ใช้จ่ายในปี 2568

## 1.1 รายการงบลงทุนปี 2567 เหลือปี 2568(ก่อสร้างปีเดียว) ที่เสี่ยงสูง/เสี่ยงพับ แยกรายจังหวัด

### จังหวัดหนองคาย

ลำดับ	ชื่อรายการตาม พ.ร.บ.	ชื่อสถานที่	จังหวัด	ทำถึงขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง	วันที่คาดว่าจะลงนามสัญญา	วันที่ลงนามจริง	วันครบกำหนดส่งมอบตามสัญญา	วันที่เบิกจ่ายเงินจริง	จำนวนงวดงานปี 2568 (ระบุงวดงาน)	ปัจจุบันดำเนินการถึงงวดงานที่	จำนวนงวดงานที่ล่าช้า	สาเหตุความล่าช้า	สถานะความเสี่ยง
25	บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ ปฏิบัติการ/ อาวุโส/ ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่านศรีสุข ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย 1 หลัง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่านศรีสุข	หนองคาย	18.ผู้ควบคุมงานรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน		7/3/2568	3/9/2568	3/9/2568	5	1	0ไม่มีล่าช้า	ผู้รับจ้างรายเดิมทิ้งงาน บอกลิกสัญญา 21 ม.ค.68 จัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ดำเนินการแทน ลงนามในสัญญาแล้ว 7 มีนาคม 2568 กำหนดส่งมอบตามสัญญา 3 กันยายน 2568 สามารถดำเนินการได้ทัน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 1	เสี่ยงสูง
26	บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ ปฏิบัติการ/ อาวุโส/ ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเทพประทับ ตำบลนาจิว อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 1 หลัง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเทพประทับ	หนองคาย	18.ผู้ควบคุมงานรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน		14/3/2568	10/9/2568	10/9/2568	5	1	0ไม่มีล่าช้า	ผู้รับจ้างรายเดิมทิ้งงาน บอกลิกสัญญา 21 ม.ค.68 จัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ดำเนินการแทน ลงนามในสัญญาแล้ว 14 มีนาคม 2568 กำหนดส่งมอบตามสัญญา 13 กันยายน 2568 สามารถดำเนินการได้ทัน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 1	เสี่ยงพับ
27	บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ ปฏิบัติการ/ อาวุโส/ ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าสำราญ ตำบลน้ำโมง อำเภอกำบัง จังหวัดหนองคาย 1 หลัง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าสำราญ	หนองคาย	18.ผู้ควบคุมงานรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน		7/3/2568	3/9/2568	3/9/2568	5	1	0ไม่มีล่าช้า	ผู้รับจ้างรายเดิมทิ้งงาน บอกลิกสัญญา 21 ม.ค.68 จัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ดำเนินการแทน เริ่มดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 1	เสี่ยงสูง
28	บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ ปฏิบัติการ/ อาวุโส/ ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาดี ตำบลนาดี อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 1 หลัง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาดี	หนองคาย	18.ผู้ควบคุมงานรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน		20/9/2567	19/3/2568		5	3	2	ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างในงานงวดที่ 3 สิ้นสุดสัญญา 19 มี.ค.68 มีค่าปรับวันละ 1,109 บาท ได้แจ้งเรียกค่าปรับให้ผู้รับจ้างรับทราบแล้ว	เสี่ยงสูง
29	บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ ปฏิบัติการ/ อาวุโส/ ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผือ ตำบลบ้านผือ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 1 หลัง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผือ	หนองคาย	18.ผู้ควบคุมงานรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน		20/9/2567	19/3/2568		5	2	3	ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างในงานงวดที่ 2 สิ้นสุดสัญญา 19 มี.ค.68 มีค่าปรับวันละ 1,149 บาท ได้แจ้งเรียกค่าปรับให้ผู้รับจ้างรับทราบแล้ว ให้ผู้รับจ้างปรับแผนการดำเนินงานและเพิ่มแรงงาน ลงนามในสัญญาแล้ว 20 กันยายน 2567 สัญญาสิ้นสุด วันที่ 19 มีนาคม 2568 มีการปรับแผนการส่งงานงวดสุดท้าย ภายในเดือน กรกฎาคม 2568	เสี่ยงสูง
32	อาคารชกฟอก เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 225 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลโพธิ์ตาก ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย 1 หลัง	โรงพยาบาลโพธิ์ตาก	หนองคาย	18.ผู้ควบคุมงานรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน		24/6/2567	20/4/2568		4	4	1	อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 4 (สุดท้าย) ล่าช้า 1 งวดงาน	เสี่ยงสูง

# 1.การบริหารจัดการงบลงทุนปี 2567 ที่กันเงินเหลื่อมปีไว้ใช้จ่ายในปี 2568

1.1 รายการงบลงทุนปี 2567 เหลื่อมปี 2568(ก่อสร้างปีเดียว) **ที่เสี่ยงสูง/เสี่ยงพัว** แยกรายจังหวัด

## จังหวัดบึงกาฬ

ลำดับ	ชื่อรายการตาม พรบ.	ชื่อสถานที่	จังหวัด	ทำถึงขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง	วันที่คาดว่าจะลงนามสัญญา	วันที่ลงนามจริง	วันครบกำหนดส่งมอบตามสัญญา	วันที่เบิกจ่ายเงินจริง	จำนวนงวดงานปี 2568 (ระบุถึงงวดงานที่)	ปัจจุบันดำเนินการถึงงวดงานที่	จำนวนงวดงานที่ล่าช้า	สาเหตุความล่าช้า	สถานะความเสี่ยง
48	บ้านพักข้าราชการระดับอำนวยการต้น/ ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคารคสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 1 หลัง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหญ้าขาว	บึงกาฬ	17.ผู้รับจ้างก่อนเริ่มงานก่อสร้างตามแผนบริหารสัญญาและแผนควบคุมงาน	21/3/2568	21/3/2568	19/7/2568		4	1	0ไม่มีล่าช้า	ยกเลิกสัญญา ประกาศครั้งที่ 2 และได้ผู้รับจ้างใหม่แล้ว จัดทำสัญญา เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2568 กวดงาน 120 วัน และตามแผนผู้รับจ้างจะดำเนินการแล้วเสร็จ กรกฎาคม 2568	เสี่ยงสูง
55	บ้านพักข้าราชการระดับอำนวยการต้น/ ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคารคสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลบุงคล้า ตำบลบุงคล้า อำเภอบุงคล้า จังหวัดบึงกาฬ 1 หลัง	โรงพยาบาลบุงคล้า	บึงกาฬ	25.เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างตามงวดงาน	25/9/2567	25/9/2567	24/3/2568		5	1	4	ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างล่าช้า ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างในงวดที่ 1 ล่าช้า 4 งวด เนื่องจากผู้รับเหมาดำเนินการก่อสร้างล่าช้า ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 1 ผู้รับเหมาจะนำเครื่องมืออุปกรณ์ในการก่อสร้างเข้ามาเพิ่มเติม จะดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ภายใน 70 วัน (ภายในเดือนมิถุนายน 2568)	เสี่ยงพัว

ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2568 เวลา 11.30 น.

# 1.การบริหารจัดการงบลงทุนปี 2567 ที่กันเงินเหลื่อมปีไว้ใช้จ่ายในปี 2568

ภาพรายการงบลงทุนปี 2567 เหลื่อมปี 2568(ก่อสร้างผูกพัน) แยกรายจังหวัด

ลำดับ	จังหวัด	จำนวนทั้งหมด (รายการ)	ทำถึงขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง					จำนวนงวดงานที่ล่าช้า					สถานะความเสี่ยง					
			จัดทำแผน/TOR/BOQ	รอลงนามสัญญา	ลงนามสัญญา	เริ่มงานก่อสร้างตามแผน	ผู้ควบคุมงานรายงานสรุป	เบิกจ่ายเงินตามงวดงาน	ไม่มีล่าช้า	ช้า 1 งวด	ช้า 2 งวด	มากกว่า 2 งวด	ไม่มีข้อมูล	เสี่ยงต่ำ	เสี่ยงกลาง	เสี่ยงสูง	เสี่ยงพิบ	
										จำนวน	ร้อยละ							
1	อุดรธานี	5	0	0	0	2	0	3	0	4	1	0	0.00%	0	0	4	0	1
2	สกลนคร	4	0	2	0	1	0	1	0	0	0	4	100.00%	0	0	0	2	2
3	นครพนม	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	100.00%	0	0	0	0	2
4	เลย	3	0	0	0	3	0	0	1	0	0	2	66.67%	0	0	1	1	1
5	หนองคาย	3	0	0	0	2	0	1	0	2	0	1	33.33%	0	0	3	0	0
6	หนองบัวลำภู	2	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	50.00%	0	0	0	1	1
7	บึงกาฬ	2	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	50.00%	0	0	1	0	1
<b>ผลรวม</b>		<b>21</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>52.38%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>8</b>

ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2568 เวลา 11.30 น.

# 1.การบริหารจัดการงบลงทุนปี 2567 ที่กันเงินเหลื่อมปีไว้ใช้จ่ายในปี 2568

## 1.2 รายการงบลงทุนปี 2567 เหลื่อมปี 2568(ก่อสร้างผูกพัน) ที่เสี่ยงสูง/เสี่ยงพับ แยกรายจังหวัด

### จังหวัดนครพนม

ลำดับ	ชื่อรายการตาม พ.ร.บ.	ชื่อสถานที่	จังหวัด	กำลังขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง	วันที่คาดว่าจะลงนามสัญญา	วันที่ลงนามจริง	วันครบกำหนดส่งมอบตามสัญญา	วันที่เบิกจ่ายเงินจริง	จำนวนงวดงานปี 2568 (ระบุ)	ปัจจุบันดำเนินการถึงงวดงานที่	จำนวนงวดงานที่ล่าช้า	สาเหตุความล่าช้า	สถานะความเสี่ยง
45	อาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง (มาตรฐาน) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,508 ตารางเมตร (โครงสร้างต้นแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลศรีสงคราม ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 1 หลัง	โรงพยาบาลศรีสงคราม	นครพนม	15.ส่งสำเนาสัญญา/ข้อตกลง ให้ สตง. และ กรมสรรพากร		14/3/2568	11/3/2569		8	0	8	ผู้รับจ้างแจ้งลงงานแล้วลงนามสัญญาวันที่ 14 มีนาคม 2568 สิ้นสุดสัญญา 11 มีนาคม 2569 อยู่ในขั้นตอนการลงพื้นที่เพื่อวางผังแล้ว	เสี่ยงพับ
		← รายการที่ กบร.ส.ติดตามเป็นพิเศษ											
46	อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,919 ตารางเมตร (โครงสร้างต้นแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลนาหว้า ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 1 หลัง	โรงพยาบาลนาหว้า	นครพนม	3.กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ/ขอบเขตของงาน (TOR) /BOQ					10	0	10	อยู่ในขั้นตอนยกเลิกประกาศ E-Bidding เพื่อประกาศครั้งที่ 2 ณ วันที่ 27 - 31 มีนาคม 2568 คาดว่าจะได้ลงนามในสัญญาภายใน 19 พฤษภาคม 2568 คาดว่าเบิกจ่ายได้เพียงงวด 1 (เดือน ส.ค.68) งวด 2 - 3 เสี่ยงพับวงเงิน 6 ล้านบาท	เสี่ยงพับ
		← รายการที่ กบร.ส.ติดตามเป็นพิเศษ											

ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2568 เวลา 11.30 น.

# 1.การบริหารจัดการงบลงทุนปี 2567 ที่กันเงินเหลื่อมปีไว้ใช้จ่ายในปี 2568

1.2 รายการงบลงทุนปี 2567 เหลื่อมปี 2568(ก่อสร้างผูกพัน) ที่เสี่ยงสูง/เสี่ยงพัว แยกรายจังหวัด

## จังหวัดบึงกาฬ

ลำดับ	ชื่อรายการตาม พรบ.	ชื่อสถานที่	จังหวัด	กำลังขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง	วันที่คาดว่าจะลงนามสัญญา	วันที่ลงนามจริง	วันครบกำหนดส่งมอบตามสัญญา	วันที่เบิกจ่ายเงินจริง	จำนวนงวดงานปี 2568 (ระบุงวดงาน)	ปัจจุบันดำเนินการถึงงวดงานที่	จำนวนงวดงานที่ล่าช้า	สาเหตุความล่าช้า	สถานะความเสี่ยง
57	อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 23,765 ตารางเมตรโรงพยาบาลบึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 หลัง	โรงพยาบาลบึงกาฬ	บึงกาฬ	17.ผู้รับจ้างก่อนเริ่มงานก่อสร้างตามแผนแผนบริหารสัญญาและแผนควบคุมงาน		22/3/2567		18/10/2569	23	1	6	เนื่องจาก สัญญาจ้างก่อสร้าง ลงนามในวันที่ 11 มีนาคม 2567 เริ่มเข้าดำเนินการก่อสร้างในเดือนเมษายน 2567 ** การดำเนินงานก่อสร้าง ในงวดงานที่ 1 การก่อสร้างฐานราก อยู่ในช่วงฤดูฝน ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2567- เดือน สิงหาคม 2567 มีน้ำท่วมขังฐานราก และบริเวณโครงการก่อสร้างเป็นบ่อน้ำเดิม (ตาน้ำ) ทำให้มีน้ำซึม ส่งผลให้ไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างได้	เสี่ยงพัว
58	อาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,487 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลบึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 หลัง	โรงพยาบาลบึงกาฬ	บึงกาฬ	18.ผู้ควบคุมงานรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน		11/9/2567		5/3/2569	9	1	1	ตรวจรับงวด 3 วันที่ 21 มีนาคม 2568 เนื่องจากเบิกจ่ายไม่ทัน จึงทำเรื่องขอยกยเวลาเบิกจ่ายงวด 3 วงเงิน 3 ล้านบาท	เสี่ยงปานกลาง

\*\*อาคารอำนวยการ OPD และอุบัติเหตุ 7 ชั้น รพ.บึงกาฬ ไม่มีในรายการติดตาม โปรแกรม กบรส.

ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2568 เวลา 11.30 น.

# 1.การบริหารจัดการงบลงทุนปี 2567 ที่กันเงินเหลื่อมปีไว้ใช้จ่ายในปี 2568

## 1.2 รายการงบลงทุนปี 2567 เหลื่อมปี 2568(ก่อสร้างผูกพัน) ที่เสี่ยงสูง/เสี่ยงพัว แยกรายจังหวัด

### จังหวัดเลย

ลำดับ	ชื่อรายการตาม พ.ร.บ.	ชื่อสถานที่	จังหวัด	ทำถึงขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง	วันที่คาดว่าจะลงนามสัญญา	วันที่ลงนามจริง	วันครบกำหนดส่งมอบตามสัญญา	วันที่เบิกจ่ายเงินจริง	จำนวนงวดงานปี 2568 (ระบุงวดงาน)	ปัจจุบันดำเนินการถึงงวดงานที่	จำนวนงวดงานที่ล่าช้า	สาเหตุความล่าช้า	สถานะความเสี่ยง
19	หอผู้ป่วยใน 7 ชั้น (จำนวน 156 เตียง) เป็นอาคาร คสล.7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,184 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลวังสะพุง ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 1 หลัง	โรงพยาบาลวังสะพุง	เลย	18.ผู้ควบคุมงานรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน	9มค68	9มค68	7ธค69		1	3	0ไม่มีล่าช้า	เป็นไปตามงวดงาน ปีงบ 68 จำนวน 7 งวดงาน ซึ่งคาดว่าจะไม่ทันเวลาเสี่ยงที่จะถูกปรับ 2 งวดงาน ลงนามในสัญญา 9 มกราคม 2568 สิ้นสุดสัญญา 7 ธันวาคม 2569 ผู้บริหารมีการติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์	เสี่ยงพัว
22	ห้องชุดครอบครัว 24 ครอบครัว เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 819 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลนาด้วง ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย 1 หลัง	โรงพยาบาลนาด้วง	เลย	18.ผู้ควบคุมงานรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน	30กย67	30กย67	3ตค68	เบิกจ่ายงวด1 1,644,000 เบิกจ่ายงวด2 1,507,000	8	4	4	ตรวจรับงานงวด 1 วันที่ 27 ม.ค. 68 ตรวจรับงานงวดที่ 2 วันที่ 4 มีนาคม 2568 ตรวจรับงวด3 วันที่27มีค68เบิกจ่ายเงิน ปี2567 ที่กันไว้เรียบร้อยแล้ว	เสี่ยงสูง

ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2568 เวลา 11.30 น.

# 1.การบริหารจัดการงบลงทุนปี 2567 ที่กันเงินเหลือในปีไว้ใช้จ่ายในปี 2568

## 1.2 รายการงบลงทุนปี 2567 เหลือปี 2568(ก่อสร้างผูกพัน) ที่เสี่ยงสูง/เสี่ยงพัว แยกรายจังหวัด


### จังหวัดสกลนคร

ลำดับ	ชื่อรายการตาม พรบ.	ชื่อสถานที่	จังหวัด	กำลังขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง	วันที่คาดว่าจะลงนามสัญญา	วันที่ลงนามจริง	วันครบกำหนดส่งมอบตามสัญญา	วันที่เบิกจ่ายเงินจริง	จำนวนงวดงานปี 2568 (ระบุงวดงาน)	ปัจจุบันดำเนินการถึงงวดงานที่	จำนวนงวดงานที่ล่าช้า	สาเหตุความล่าช้า	สถานะความเสี่ยง
39	อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,410 ตารางเมตร โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้นอาจาริ ตำบลพรรณานิคม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 1 หลัง	โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้นอาจาริ	สกลนคร	25.เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างตามงวดงาน	-	25/9/2567	19/12/2568		7	3	4	อยู่ระหว่างก่อสร้าง งวดที่ 3	เสี่ยงสูง
				รายการที่ กบรส.ติดตามเป็นพิเศษ									
40	อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุฉุกเฉิน บำบัดรักษาและสำนักงาน เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 11,600 ตารางเมตร โรงพยาบาลพังโคน ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 1 หลัง	โรงพยาบาลพังโคน	สกลนคร	11.จัดทำบันทึกรายงานผลการพิจารณา	12-30 เม.ย. 2568	-			6	0	19	- ยังไม่ลงนามในสัญญา เนื่องจากอยู่ระหว่างส่งหนังสือไปที่กระทรวงสาธารณสุข อนุมัติสั่งจ้าง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง และส่งสำนักงานประมาณ เพื่อขอยกยเวลาการดำเนินงานก่อสร้าง ในปี 2567 มีจำนวน 6 งวดคาดว่าจะเบิกจ่ายได้เพียง 1 งวด จากกรณีวิเคราะห์ของ กบรส. คาดว่าจะถูกพัวในงวดที่ 2 - 6 วงเงิน 37 ล้านบาท และได้ทำเรื่องกันเหลือปีไว้แล้ว - ล่าสุดบริษัทที่ 2 แจ้งยื่นราคาและลดราคาให้เท่ากับบริษัทที่ 1 ที่ทำความตกลงกับสำนักงานประมาณไว้ ขณะนี้รอหนังสือจากบริษัทที่ 2 ส่งมา คาดว่ามาถึงสัปดาห์นี้ สสจ.จะทำหนังสือแจ้ง กบรส. เพื่อลงนามในสัญญาต่อไป	เสี่ยงพัว
41	อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,919 ตารางเมตร โรงพยาบาลบ้านม่วง ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 1 หลัง	โรงพยาบาลพระอาจารย์มัน ภริภักดีโต	สกลนคร	13.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา	กลางเดือน พฤษภาคม	-			0	0	10	อยู่ระหว่าง ประกาศผู้ชนะ ครบระยะเวลาอุทธรณ์ วันที่ 3 เม.ย.68	เสี่ยงพัว
				รายการที่ กบรส.ติดตามเป็นพิเศษ									
42	ห้องชุดครอบครัว 24 ครอบครัว เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 819 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่องดาว ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 1 หลัง	โรงพยาบาลพระอาจารย์วัน อุตต	สกลนคร	17.ผู้รับจ้างก่อนเริ่มงานก่อสร้างตามแผนแผนบริหารสัญญาและแผนควบคุมงาน	-	31/10/2567	26/10/2568		2	1	7	อยู่ระหว่างก่อสร้าง งวดที่ 1	เสี่ยงสูง

ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2568 เวลา 11.30 น.

# 1.การบริหารจัดการงบลงทุนปี 2567 ที่กันเงินเหลื่อมปีไว้ใช้จ่ายในปี 2568

**Time line** ก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุฉุกเฉิน บำบัดรักษาและสำนักงาน โรงพยาบาลพังโคน จังหวัดสกลนคร

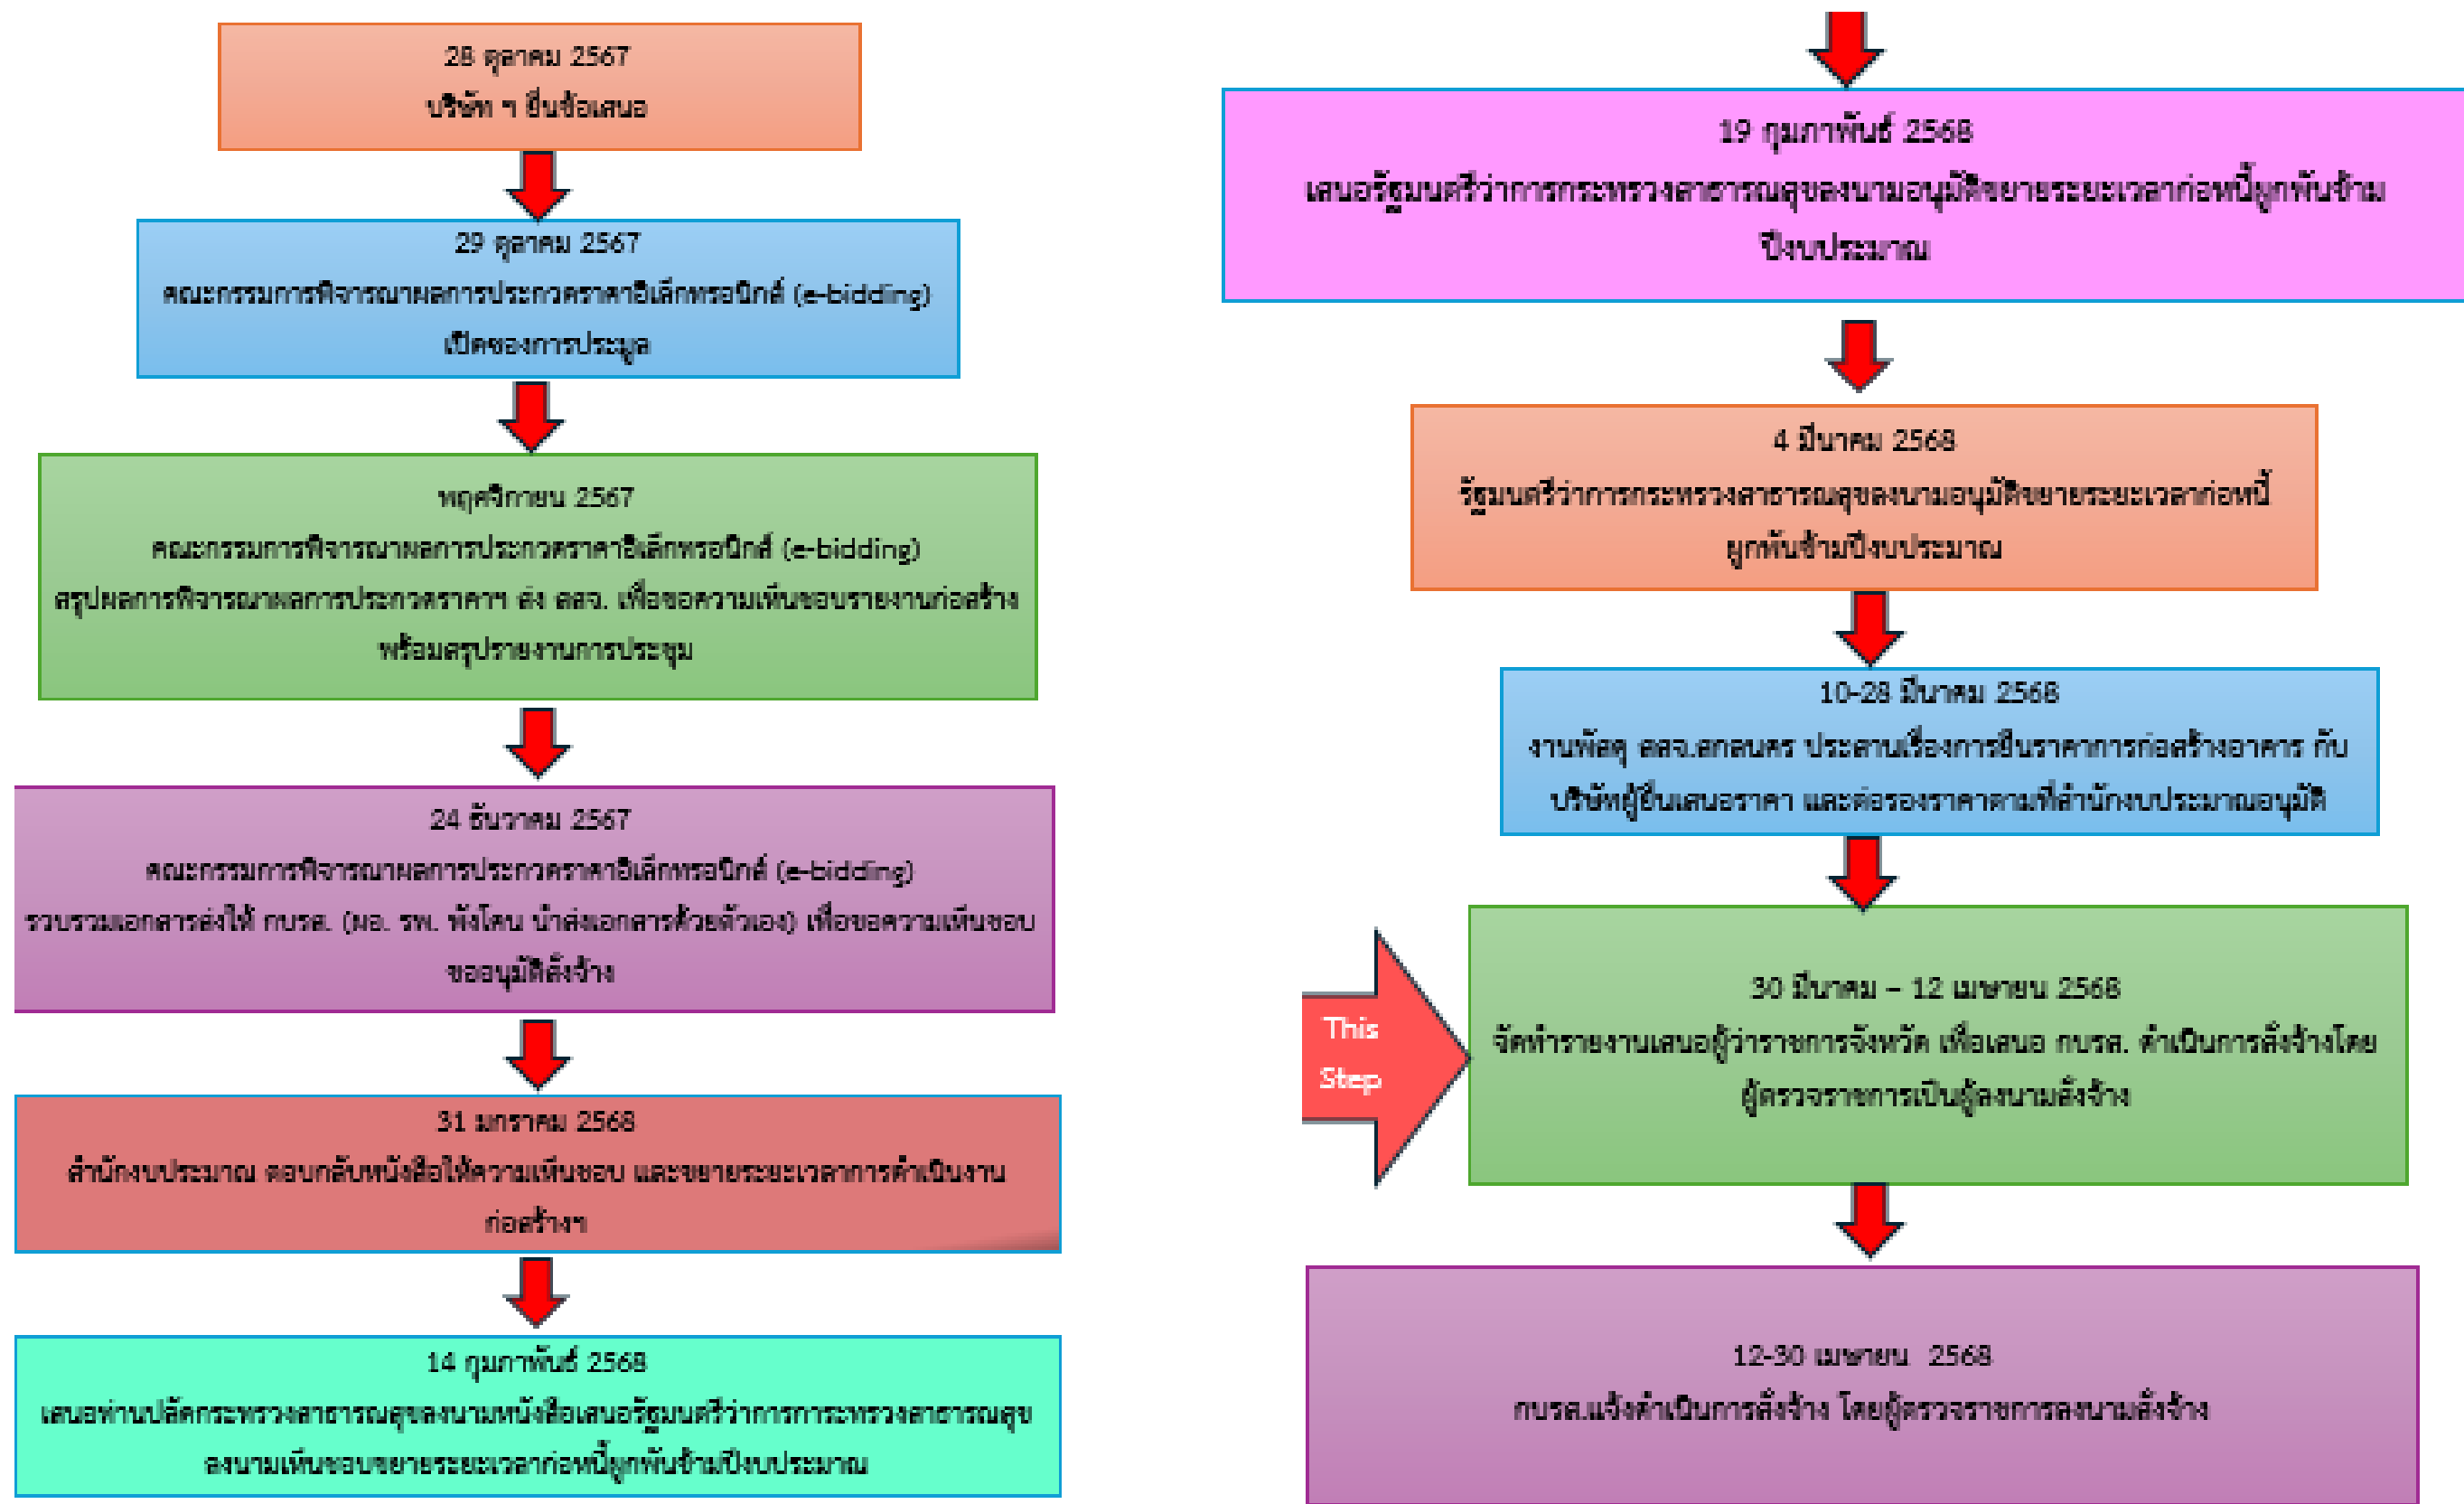

This Step

# 1.การบริหารจัดการงบลงทุนปี 2567 ที่กันเงินเหลื่อมปีไว้ใช้จ่ายในปี 2568

1.2 รายการงบลงทุนปี 2567 เหลื่อมปี 2568(ก่อสร้างผูกพัน) ที่เสี่ยงสูง/เสี่ยงพับ แยกรายจังหวัด

## จังหวัดหนองบัวลำภู

ลำดับ	ชื่อรายการตาม พรบ.	ชื่อสถานที่	จังหวัด	ทำถึงขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง	วันที่คาดว่าจะลงนามสัญญา	วันที่ลงนามจริง	วันครบกำหนดส่งมอบตามสัญญา	วันที่เบิกจ่ายเงินจริง	จำนวนงวดงานปี 2568 (ระบุงวดงาน)	ปัจจุบันดำเนินการถึงงวดงานที่	จำนวนงวดงานที่ล่าช้า	สาเหตุความล่าช้า	สถานะความเสี่ยง
1	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,724 ตารางเมตร โรงพยาบาลสุพรรณคูหา ตำบลสุพรรณคูหา อำเภอสุพรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 1 หลัง	โรงพยาบาลสุพรรณคูหา	หนองบัวลำภู	15.ส่งสำเนาสัญญา/ข้อตกลง ให้ สตง. และ กรมสรรพากร					2	1	2	ลงนามสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2567 จำนวน 10 งวด ปัจจุบันผู้รับจ้างได้ดำเนินงานในงวดที่ 1 ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้าง งวดที่ 2 ตอกเสาเข็ม จำนวน 61 ต้นแล้ว อยู่ระหว่างปรับพื้นที่เพื่อทดสอบเสาเข็มเมื่อผ่านแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการแก้ไขสัญญา คาดว่าผลจะออกวันที่ 4 เมษายน 2568 และจะประชุมการแก้ไขสัญญาระหว่าง 8 - 10 เมษายน 2568 คาดว่าจะผู้รับจ้างจะส่งงานงวดที่ 1 และ 2 พร้อมกันภายในเดือน 10 พฤษภาคม 2568 แต่ยังไม่ล่าช้าอยู่ 90 วัน คาดว่าผูกพันงวด 3	เสี่ยงพับ
2	อาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 936 ตารางเมตร โรงพยาบาลหนองบัวลำภู ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 1 หลัง	โรงพยาบาลหนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	13.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา					8	0	8	1.ยกเลิกประกาศประกวดราคา เมื่อวันที่ 1 ต.ค.67 และขอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกวดราคา bidding ใหม่ / 2. อยู่ระหว่างเปิดวิจารณ์ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา 3 วันทำการ สิ้นสุดวันที่ 15 ม.ค.68 / 3. ดำเนินการเผยแพร่ประกาศประกวดราคา 12 วันทำการ ประกาศวันที่ 22 ม.ค.68 - 7 ก.พ.68 ยื่นเสนอราคา วันที่ 10 ก.พ.68 เปิดพิจารณาได้ 11 ก.พ.68 เป็นต้นไป / 4. คณะกรรมการพิจารณาผลจัดทำบันทึกรายงานผลการพิจารณา 17 ก.พ.68 - ปัจจุบันได้ทำหนังสือเสนอ ผวจ. เพื่อแจ้งผู้รับจ้างลงนามในสัญญา คาดว่าจะลงนามในสัญญา ภายในวันที่ 10 เมษายน 2568	เสี่ยงสูง

รายการที่ กบส.ติดตามเป็นพิเศษ

ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2568 เวลา 11.30 น.

# 1.การบริหารจัดการงบลงทุนปี 2567 ที่กันเงินเหลื่อมปีไว้ใช้จ่ายในปี 2568

1.2 รายการงบลงทุนปี 2567 เหลื่อมปี 2568(ก่อสร้างผูกพัน) ที่เสี่ยงสูง/เสี่ยงพัว แยกรายจังหวัด

## จังหวัดอุดรธานี

ลำดับ	ชื่อรายการตาม พรบ.	ชื่อสถานที่	จังหวัด	ทำถึงขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง	วันที่คาดว่าจะลงนามสัญญา	วันที่ลงนามจริง	วันครบกำหนดส่งมอบตามสัญญา	วันที่เบิกจ่ายเงินจริง	จำนวนงวดงานปี 2568 (ระบุงวดงาน)	ปัจจุบันดำเนินการถึงงวดงานที่	จำนวนงวดงานที่ล่าช้า	สาเหตุความล่าช้า	สถานะความเสี่ยง
7	อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,796 ตารางเมตร โรงพยาบาลหนองหาน ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง	โรงพยาบาลหนองหาน	อุดรธานี	18.ผู้ควบคุมงานรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน		26/11/2567	21/7/2569		3	1	1	- ประชุมเพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงฐานรากเสาเข็มเจาะ เป็นฐานรากชนิดแผ่ เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 68 มีมติอนุมัติในหลักการให้ผู้รับจ้างก่อสร้างฐานรากแบบแผ่ และอยู่ระหว่างส่งเอกสารแบบแปลนให้กองแบบแผนพิจารณา - กองแบบแผนพิจารณาเปลี่ยนแปลงฐานรากอาคาร (ฐานรากแผ่) แล้ว ตรงตามข้อกำหนดและรูปแบบ เห็นควรให้ผู้รับจ้างใช้เป็นแนวทางในการก่อสร้างได้ (ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างฐานรากแผ่) - ณ ปัจจุบัน ผู้รับเหมาได้ดำเนินงานก่อสร้างฐานรากชนิดแผ่เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดที่ 1 - 6 ภายในเดือน กันยายน 2568 ผู้บริหารมีการติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง	เสี่ยงพัว

ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2568 เวลา 11.30 น.

# 2.การบริหารจัดการงบประมาณปี 2568

## 2.1 การบริหารงบลงทุน(ครุภัณฑ์)ปี 2568

ลำดับ	จังหวัด	จำนวนทั้งหมด (รายการ)	จัดทำแผน/กำหนด spec		ประกาศเชิญชวน		รอลงนามสัญญา		ลงนามสัญญา		รอส่งมอบ/ตรวจรับ		เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	
			24/3/68	24/3/68	24/3/68	24/3/68	24/3/68	24/3/68	24/3/68	24/3/68	24/3/68	24/3/68	24/3/68	24/3/68
1	อุดรธานี	495	0	0	0	0	1	1	10	5	1	1	483	488
2	สกลนคร	36	0	1	0	0	1	0	9	8	1	1	25	26
3	นครพนม	28	0	0	0	0	0	0	11	0	0	4	17	24
4	เลย	73	0	0	0	1	0	0	2	2	1	1	70	69
5	หนองคาย	127	0	0	10	10	2	2	57	47	1	5	57	63
6	หนองบัวลำภู	502	0	0	1	1	6	6	26	25	173	2	296	468
7	บึงกาฬ	15	0	0	0	0	0	0	10	10	2	2	3	3
<b>ผลรวม</b>		<b>1,276</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>125</b>	<b>97</b>	<b>179</b>	<b>16</b>	<b>951</b>	<b>1141</b>

ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2568 เวลา 11.30 น.

## 2.การบริหารจัดการงบลงทุนปี 2568

2.1 การบริหารงบลงทุน(ครุภัณฑ์)ปี 2568 เฉพาะรายการที่ยังไม่กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ/ยังไม่ลงนาม **แยกรายจังหวัด**

### จังหวัดสกลนคร

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวน	ชื่อสถานที่	จังหวัด	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	ทำถึงขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง	วันที่คาดว่าจะลงนามสัญญา	วันที่ลงนามสัญญาจริง	วันครบกำหนดส่งมอบตามสัญญา	วันที่ส่งมอบจริง	เดือนที่คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	วันที่เบิกจ่ายจริง	สาเหตุความล่าช้า
5	เครื่องเร่งอนุภาคแบบอุโมงค์หมุนด้วยอัตราความเร็วสูง พร้อมระบบภาพนำวิถี ชนิดทิลโทลด์	150,000,000.00	1	โรงพยาบาลสกลนคร	สกลนคร	E_bidding	1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	เม.ย.-68		ก.ค.-68				

ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2568 เวลา 11.30 น.

# 2.การบริหารจัดการงบลงทุนปี 2568

2.1 การบริหารงบลงทุน(ครุภัณฑ์)ปี 2568 เฉพาะรายการที่ยังไม่กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ/ยังไม่ลงนาม **แยกรายจังหวัด**

## จังหวัดหนองคาย

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวน	ชื่อสถานที่	จังหวัด	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	ทำถึงขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง	วันที่คาดว่าจะลงนามสัญญา	วันที่ลงนามสัญญาจริง	วันครบกำหนดส่งมอบตามสัญญา	วันที่ส่งมอบจริง	เดือนที่คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	วันที่เบิกจ่ายจริง	สาเหตุความล่าช้า
106	ชุดกล้องส่องตรวจทางเดินอาหารด้วยคลื่นความถี่สูง(EUS)	8,000,000.00	1	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ	หนองคาย	E_bidding	15.เว็บไซต์ระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา							รอบริษัทมาทำสัญญา
176	กล้องส่องตรวจและผ่าตัดกระดูกลิ้นหลัง	6,000,000.00	1	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ	หนองคาย	E_bidding	10.จัดทำบันทึกรายงานผลการพิจารณาพร้อมเสนอข้อแนะนำ หน่วยงานให้ความเห็นชอบ							คณะกรรมการพิจารณา e-bidding
185	เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร และความดัน พร้อมระบบเครื่องอัตโนมัติ	1,500,000.00	10	โรงพยาบาลหนองคาย	หนองคาย	E_bidding	5.รายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศ/จัดทำประกาศและเอกสารประกวดราคา	9-พ.ค.-68				ก.ย.-68		ประกาศเชิญชวนทั่วไป ครั้งที่ 2 เสนอรองผู้ว่าราชการอนุมัติประกาศจริง (ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยฯ ว.195 ลว. 20 มี.ค.68 ) ตามมาตรการ เร่งรัดการลงนามในสัญญา

ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2568 เวลา 11.30 น.

## 2.การบริหารจัดการงบลงทุนปี 2568

2.1 การบริหารงบลงทุน(ครุภัณฑ์)ปี 2568 เฉพาะรายการที่ยังไม่กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ/ยังไม่ลงนาม แยกรายจังหวัด

### จังหวัดหนองบัวลำภู

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวน	ชื่อสถานที่	จังหวัด	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	ทำถึงขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง	วันที่คาดว่าจะลงนามสัญญา	วันที่ลงนามสัญญาจริง	วันครบกำหนดส่งมอบตามสัญญา	วันที่ส่งมอบจริง	เดือนที่คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	วันที่เบิกจ่ายจริง	สาเหตุความล่าช้า
80	เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า 15 kW	5,000,000.00	1	โรงพยาบาลหนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	E_bidding	14.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP/ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/จัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	21 มี.ค.68				ก.ย.-68		รายงานผลการพิจารณา ประกาศประกวดราคาไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติตามที่ sw.กำหนด จึงขอยกเลิกประกาศประกวดราคาใหม่ ลงวันที่ 25/12/2567
117	เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติด้วยแก๊สเอทิลีนออกไซด์ 100 % แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 150 ลิตร	790,000.00	1	โรงพยาบาลากลาง	หนองบัวลำภู	E_bidding	6.เผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง					มี.ค.-68		ประกาศยกเลิกการประกวดราคาลงวันที่ 11กพ.68 เนื่องจากไม่มีผู้ผ่านเงื่อนไขการเสนอราคา เริ่มแต่งตั้ง กก.กำหนดราคากลางและรายงานขอซื้อลงร่างประกาศใหม่ภายใน 7 มีนาคม 2568
157	อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ (Web Application Firewall)	530,000.00	1	โรงพยาบาลศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	E_bidding	15.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา					มี.ค.-68		

ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2568 เวลา 11.30 น.

## 2.การบริหารจัดการงบลงทุนปี 2568

2.1 การบริหารงบลงทุน(ครุภัณฑ์)ปี 2568 เฉพาะรายการที่ยังไม่กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ/ยังไม่ลงนาม **แยกรายจังหวัด**

### จังหวัดอุดรธานี

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวน	ชื่อสถานที่	จังหวัด	วิธีจัดซื้อจัด จ้าง	ทำถึงขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง	วันที่คาดว่าจะ ลงนามสัญญา	วันที่ลงนาม สัญญาจริง	วันครบกำหนด ส่งมอบตาม สัญญา	วันที่ส่ง มอบจริง	เดือนที่คาดว่าจะ เบิกจ่ายแล้ว เสร็จ	วันที่ เบิกจ่ายจริง	สาเหตุความล่าช้า
71	กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดีทัศน์แบบคมชัด พร้อมชุด ควบคุมสัญญาณภาพ	2,000,000.00	1	โรงพยาบาลบ้านฝ้อ	อุดรธานี	E_bidding	15.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา							อยู่ระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์ คาดว่าจะลงนาม ได้ เดือน เมษายน 68ก

ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2568 เวลา 11.30 น.

## 2.การบริหารจัดการงบลงทุนปี 2568

### 2.2 การบริหารงบลงทุน(สิ่งก่อสร้าง)ปี 2568

ลำดับ	จังหวัด	จำนวน ทั้งหมด (รายการ)	ทำถึงขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง							สถานะความเสี่ยง				
			จัดทำแผน/ TOR/BOQ/ ร่างประกาศ	ประกาศ เชิญชวน	รอลงนาม สัญญา	ลงนาม สัญญา	เริ่มก่อสร้าง/ จัดหาตามแผน	คกก. ตรวจรับ	เบิกจ่าย เงินงวด สุดท้าย	ส่งคืน งบประมาณ	เสี่ยงต่ำ (รายการ)	เสี่ยงกลาง (รายการ)	เสี่ยงสูง (รายการ)	ร้อยละ ร้อยละ
1	อุดรธานี	14	0	1	0	0	3	4	4	2	1	2	12	85.71%
2	สกลนคร	4	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	5	125.00%
3	นครพนม													
4	เลย	3	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	3	100.00%
5	หนองคาย	4	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4	100.00%
6	หนองบัวลำภู	7	1	1	0	5	0	0	0	0	4	2	1	14.29%
7	บึงกาฬ	5	0	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0.00%
<b>รวม</b>		<b>37</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>25</b>	<b>67.57%</b>

ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2568 เวลา 11.30 น.

**\*\*งบลงทุน(สิ่งก่อสร้าง) ปี 2568 ที่อยู่ระหว่างจัดทำTOR/BOQ เชิญชวน และรอลงนาม รวม 10 รายการ\*\***

## 2.การบริหารจัดการงบลงทุนปี 2568

### 2.2 การบริหารงบลงทุน(สิ่งก่อสร้าง)ปี 2568 เฉพาะรายการที่ยังไม่ลงนามสัญญา แยกรายจังหวัด

#### จังหวัดอุดรธานี

ลำดับ	รายการ	จำนวน	วงเงินรวม(บาท)	ชื่อสถานที่	จังหวัด	ทำถึงขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง	วันที่คาดว่าจะลงนามสัญญา	วันที่ลงนามจริง	วันครบกำหนดส่งมอบตามสัญญา	วันที่คาดว่าจะส่งมอบงานงวดสุดท้าย	เดือนที่คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ	งวดงานที่ถึงสิ้น	จำนวนงวดงานปี 2568	ปัจจุบันดำเนินการถึงงวดงานที่	จำนวนงวดงานที่ล่าช้า	สาเหตุความล่าช้า	
1	อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.9 ชั้น และ 1 ชั้น ใต้ดิน พื้นที่ใช้สอยประมาณ 31,420 ตารางเมตร	1	537,170,000.00	โรงพยาบาลอุดรธานี	อุดรธานี	6.รายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา และจัดทำประกาศและเอกสารประกวดราคา	2/7/1968										

#### จังหวัดหนองบัวลำภู

ลำดับ	รายการ	จำนวน	วงเงินรวม(บาท)	ชื่อสถานที่	จังหวัด	ทำถึงขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง	วันที่คาดว่าจะลงนามสัญญา	วันที่ลงนามจริง	วันครบกำหนดส่งมอบตามสัญญา	วันที่คาดว่าจะส่งมอบงานงวดสุดท้าย	เดือนที่คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ	งวดงานที่ถึงสิ้น	จำนวนงวดงานปี 2568	ปัจจุบันดำเนินการถึงงวดงานที่	จำนวนงวดงานที่ล่าช้า	สาเหตุความล่าช้า	
8	อาคารทันตกรรม 8 ยูนิต เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 766 ตารางเมตร	1	25,147,900.00	โรงพยาบาลสุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	5.ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา											นัดประชุม กก.กำหนดราคากลาง ,ร่างขอบเขตงานก่อสร้าง ในวัน จันทร์ ที่ 17 กพ..68
23	อาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 576 ตารางเมตร	1	8,596,400.00	โรงพยาบาลโนนสัง	หนองบัวลำภู	7.เผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง											อยู่ระหว่างการลงร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา สิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็นฯ 24 กพ.68

ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2568 เวลา 11.30 น.

# 2.การบริหารจัดการงบลงทุนปี 2568

## 2.2 การบริหารงบลงทุน(สิ่งก่อสร้าง)ปี 2568 เฉพาะรายการที่ยังไม่ลงนามสัญญา แยกรายจังหวัด

### จังหวัดหนองคาย

ลำดับ	รายการ	จำนวน	วงเงินรวม(บาท)	ชื่อสถานที่	จังหวัด	ทำถึงขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง	วันที่คาดว่าจะลงนามสัญญา	วันที่ลงนามจริง	วันครบกำหนดส่งมอบตามสัญญา	วันที่คาดว่าจะส่งมอบงานงวดสุดท้าย	เดือนที่คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ	งวดงานที่ถึงสิ้น	จำนวนงวดงานปี 2568	ปัจจุบันดำเนินการถึงงวดงานที่	จำนวนงวดงานที่ล่าช้า	สาเหตุความล่าช้า	
2	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง เป็นอาคาร คสล.7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,908 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	1	75,239,200.00	โรงพยาบาลโพธิ์ชัย	หนองคาย	3.กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ/ขอบเขตของงาน (TOR) /BOQ	15/5/1968	ยกเลิกประกาศ เนื่องจากไม่มีผู้ยื่น		27/10/2569		15	5				กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 26 มี.ค.68
13	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	1	1,600,500.00	โรงพยาบาลเฟื้อไร้	หนองคาย	13.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา	28/3/1968			24/9/2568		5	5				
16	บ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 130 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	1	2,109,200.00	โรงพยาบาลรัตนวาปี	หนองคาย	13.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา	28/3/1968			ก.ย.-68		5	5				
33	อาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพ (ระดับปฐมภูมิ) เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓1 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	1	13,481,000.00	โรงพยาบาลรัตนวาปี	หนองคาย	2.แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่าง TOR/Spec/ราคากลาง	9-พ.ค.-68	ยกเลิกประกาศ เนื่องจากไม่มีผู้ยื่น		26-มี.ค.-69		6	2				กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 14 มี.ค.68 แต่ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ดำเนินการประกาศใหม่ ครั้งที่ 2

ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2568 เวลา 11.30 น.


# 2.การบริหารจัดการงบประมาณปี 2568

## 2.2 การบริหารงบลงทุน(สิ่งก่อสร้าง)ปี 2568 เฉพาะรายการที่ยังไม่ลงนามสัญญา แยกรายจังหวัด จังหวัดสกลนคร

ลำดับ	รายการ	จำนวน	วงเงินรวม(บาท)	ชื่อสถานที่	จังหวัด	ทำถึงขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง	วันที่คาดว่าจะลงนามสัญญา	วันที่ลงนามจริง	วันครบกำหนดส่งมอบตามสัญญา	วันที่คาดว่าจะส่งมอบงานงวดสุดท้าย	เดือนที่คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ	งวดงานที่สิ้น	จำนวนงวดงานปี 2568	ปัจจุบันดำเนินการถึงงวดงานที่	จำนวนงวดงานที่ล่าช้า	สาเหตุความล่าช้า
10	หอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (จำนวน 114 เตียง) เป็นอาคารคสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,797 ตารางเมตร	1	108,861,600.00	โรงพยาบาลพังโคน	สกลนคร	5.ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา	สิ้นเดือน พฤษภาคม	-				14				อยู่ระหว่างเสนอร่างประกาศประกวดราคา

ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2568 เวลา 11.30 น.

### Time line ก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เตียง โรงพยาบาลพังโคน

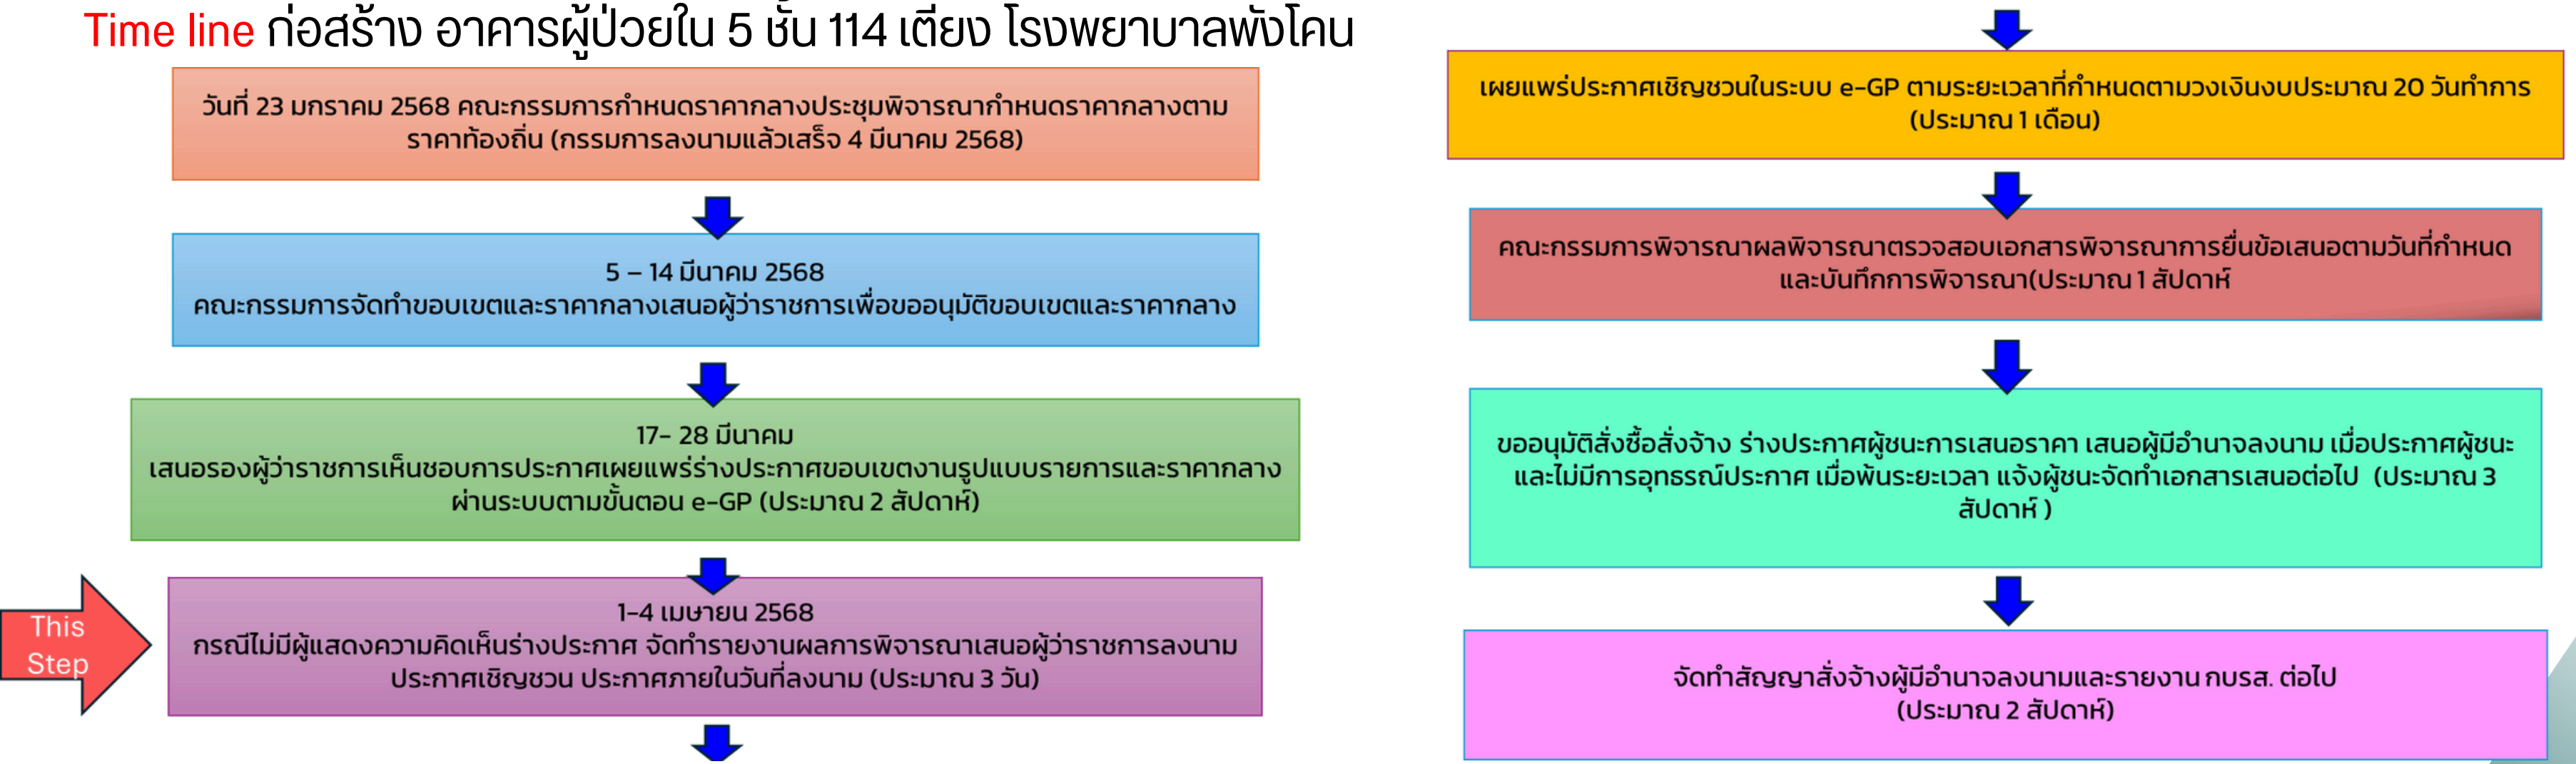

This Step



การติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการ

# งบค่าเสื่อม

เขตสุขภาพที่ 8


1 เมษายน 2568



# 3.งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม)

## 3.1 การบริหารจัดการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



ร้อยละ เงินจัดสรร ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง ในสังกัด สป.สร.

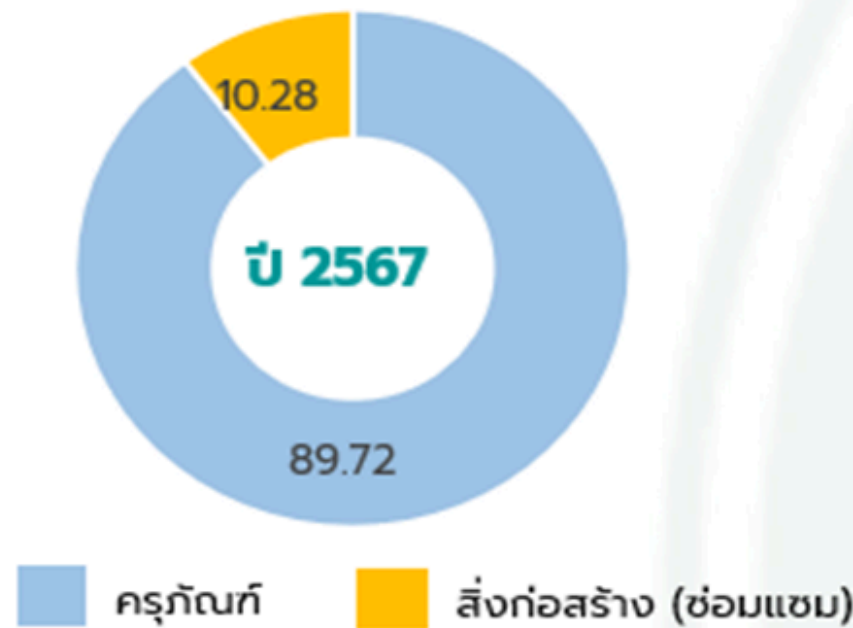

**ภาพรวมการจัดสรร ปี 2567 วงเงินทั้งสิ้น 521,816,797.42 บาท**

รายการ	70%	20%	10%
จัดสรร	365,271,758.19 (2,846 รายการ)	104,363,359.49 (541 รายการ)	52,181,679.74 (135 รายการ)
เบิกจ่าย	320,295,838.91 (2,778 รายการ)	76,007,281.89 (510 รายการ)	40,791,679.74 (118 รายการ)
คงเหลือ	44,975,919.28 (68 รายการ)	28,356,077.60 (31 รายการ)	11,390,000 (17 รายการ)

วงเงินและร้อยละการเบิกจ่าย (งบค่าเสื่อม) ในสังกัด สป.สร. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

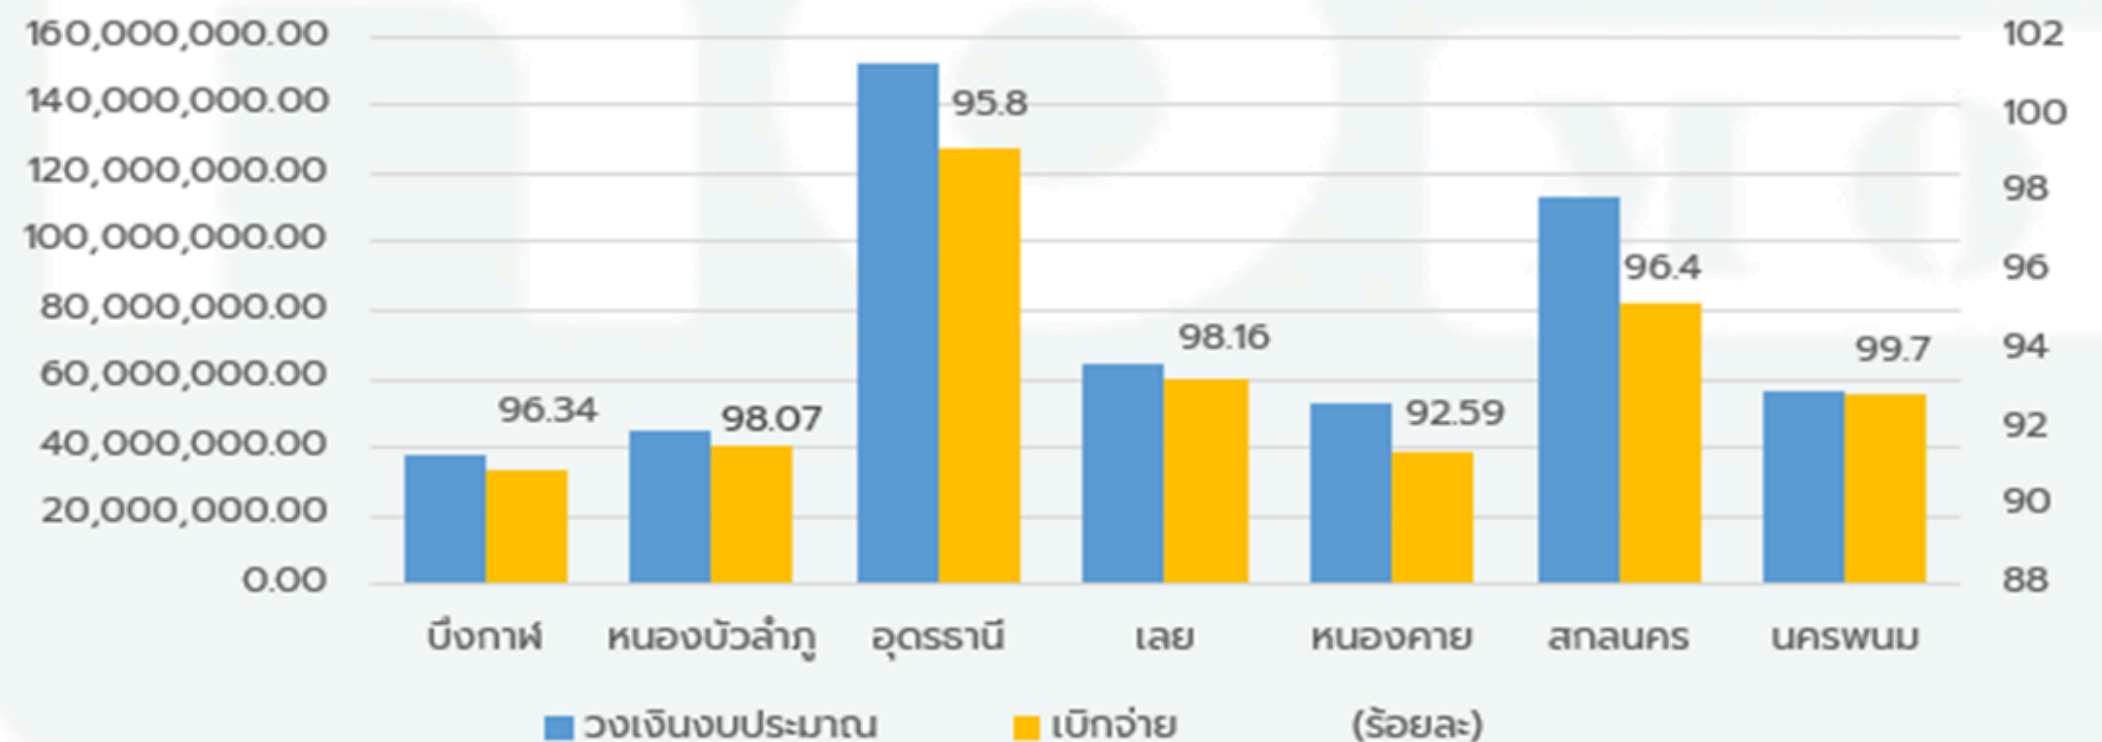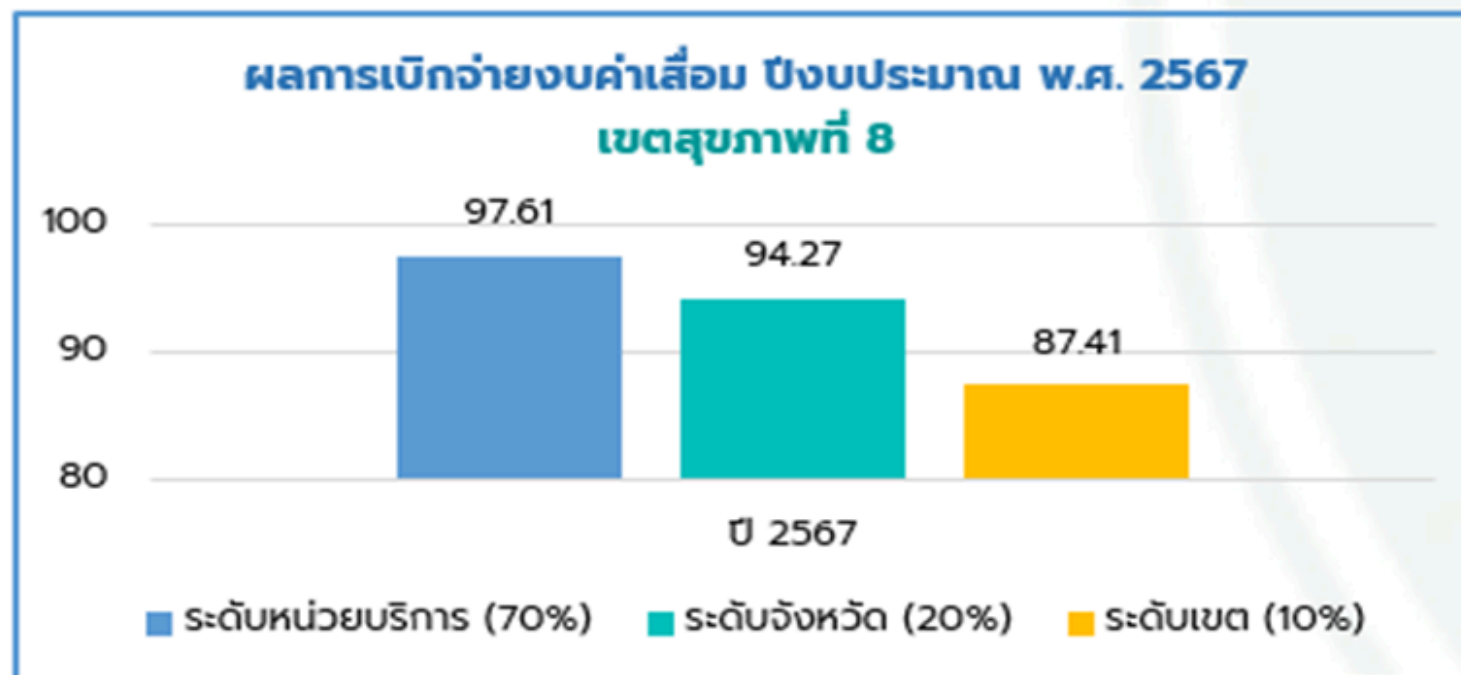

# 3.งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม)

3.2 สรุปสถานการณ์ดำเนินงาน (ตามจำนวนรายการ) ปีงบประมาณ 2567 ประเภทงบในสังกัด สป.สร.

ลำดับ	จังหวัด	วงเงินงบประมาณ	รายการ	บอมนุมัติจัดซื้อ/จ้างแล้ว		ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว		ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว		เบิกจ่ายเงินแล้ว					
				รายการ	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	งบตามแผน	งบที่ใช้ไป	เงินเหลือจ่าย	%เงินเหลือจ่าย
1	บึงกาฬ	37,928,558.17	164	0	0	6	3.66	0	0	158	96.34	32,993,297.90	32,551,803.91	441,493.99	1.34
2	หนองบัวลำภู	44,586,238.65	569	4	0.7	5	0.88	0	0	560	98.42	40,736,238.65	40,503,938.18	232,300.47	0.57
3	อุดรธานี	152,357,970.55	953	3	0.31	30	3.15	7	0.73	913	95.8	127,232,471.64	124,716,061.63	2,516,410.01	1.98
4	เลย	64,203,282.05	490	1	0.2	3	0.61	5	1.02	481	98.16	60,038,282.05	59,819,466.88	218,815.17	0.36
5	หนองคาย	52,570,194.50	324	0	0	11	3.4	13	4.01	300	92.59	38,501,370.44	38,084,469.11	416,901.33	1.08
6	สกลนคร	113,617,212.36	694	2	0.29	21	3.03	2	0.29	669	96.4	82,479,798.72	81,962,949.44	516,849.28	0.63
7	นครพนม	56,553,341.14	328	0	0	1	0.3	0	0	327	99.7	55,783,341.14	55,619,443.29	163,897.85	0.29
<b>รวม เขต 8</b>		<b>521,816,797.42</b>	<b>3,522</b>	<b>10</b>	<b>0.28</b>	<b>70</b>	<b>1.99</b>	<b>27</b>	<b>0.77</b>	<b>3,415</b>	<b>96.96</b>	<b>447,878,350.32</b>	<b>443,283,682.22</b>	<b>4,594,668.10</b>	<b>1.03</b>


**\*\* บอเร่งรัดให้ดำเนินการลงนามในสัญญา-เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จก่อน กรกฎาคม 2568 \*\***

ข้อมูล : โปรแกรม สปสร. เขต 8 อุดรธานี ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568 เวลา 16.00 น. รายงานโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (R8-CIO)

# 3.งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกง่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม)

3.3 การบริหารจัดการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกง่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ไม่รวม รพ.สต.ถ่ายโอน)



ร้อยละ เงินจัดสรร ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง ในสังกัด สป.สร.

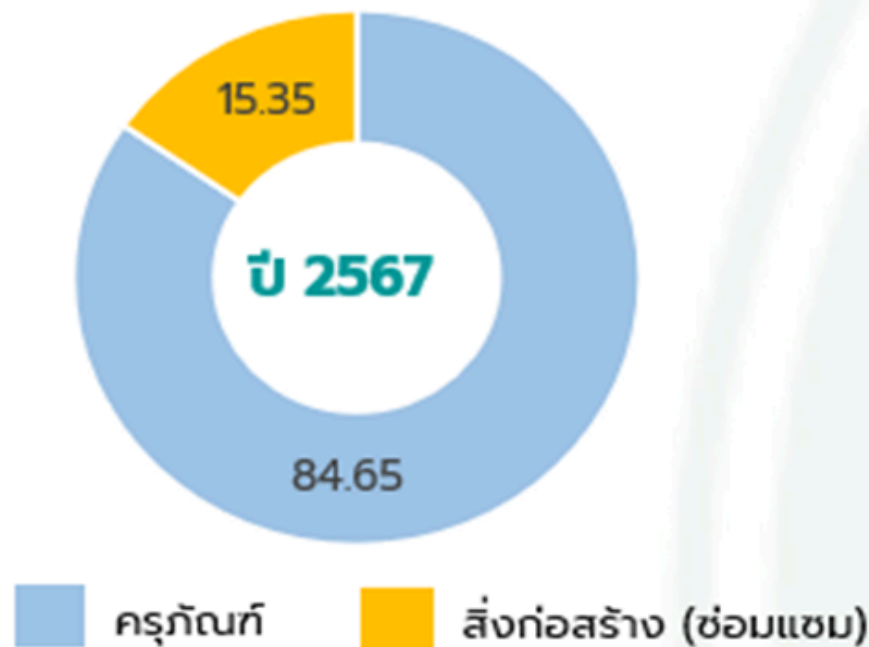

**ภาพรวมการจัดสรร ปี 2567 วงเงินทั้งสิ้น 486,486,750.12 บาท**

รายการ	70%	20%	10%
จัดสรร	333,217,010.89 (1,828 รายการ)	101,183,559.49 (475 รายการ)	52,086,679.74 (131 รายการ)
เบิกง่าย	288,241,091.61 (1,769 รายการ)	72,827,481.89 (447 รายการ)	40,696,679.74 (117 รายการ)
คงเหลือ	44,975,919.28 (59 รายการ)	28,356,077.60 (28 รายการ)	11,390,000.00 (14 รายการ)

วงเงินและร้อยละการเบิกง่าย (งบค่าเสื่อม) ในสังกัด สป.สร. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

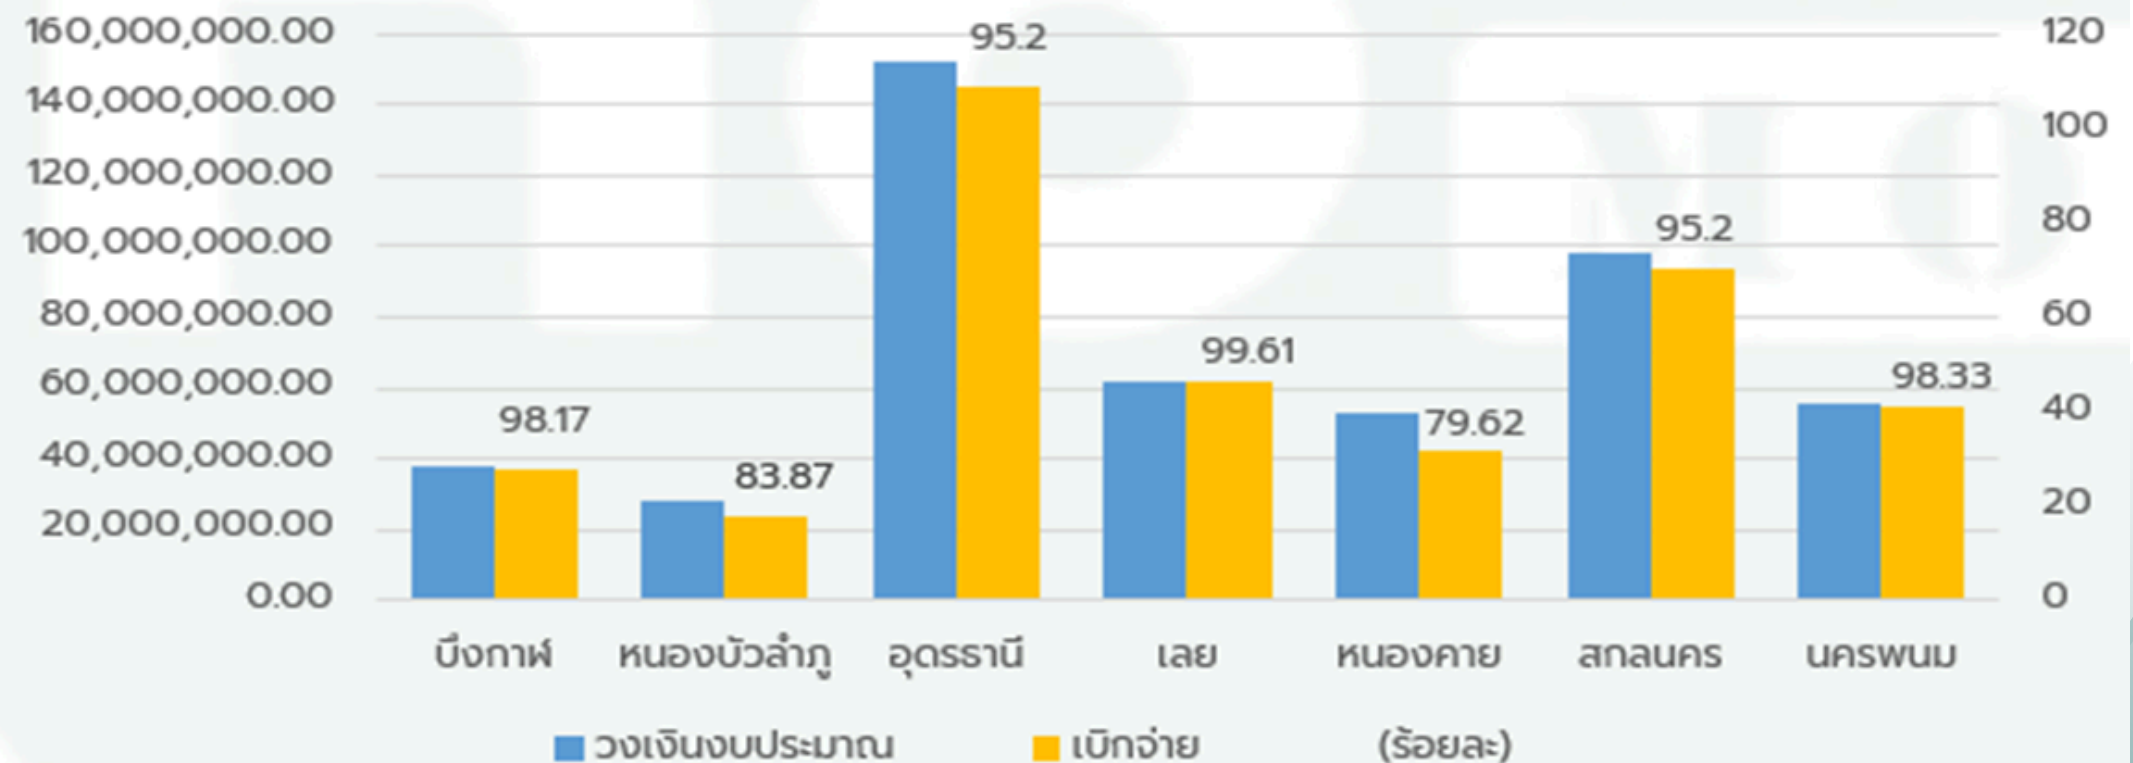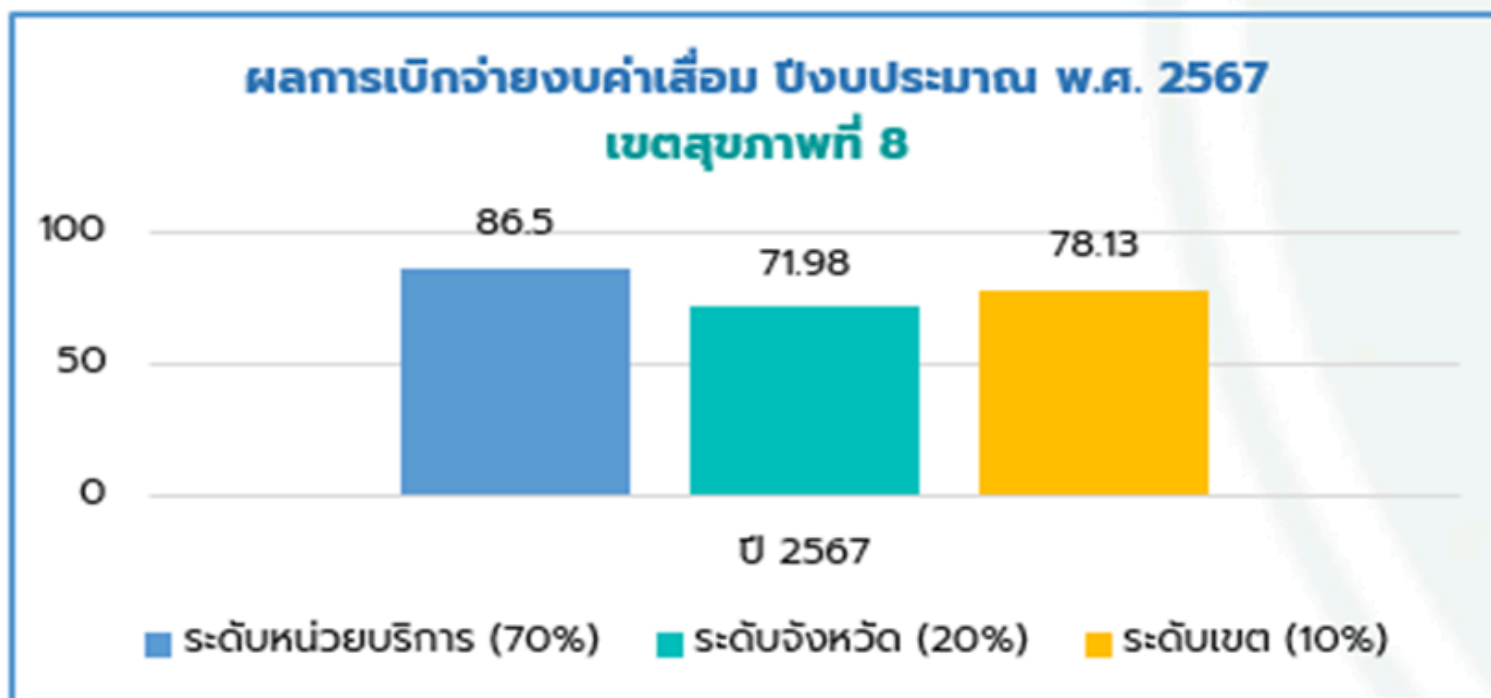

# 3.งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม)

3.4 สรุปสถานการณ์ดำเนินงาน (ตามจำนวนรายการ) ปีงบประมาณ 2567 ประเภทงบ ในสังกัด สป.สร.(ไม่รวม รพ.สต. ต่ายโอน)

ลำดับ	จังหวัด	วงเงินงบประมาณ	รายการ	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้างแล้ว		ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว		ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว		เบิกจ่ายเงินแล้ว					
				รายการ	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	งบตามแผน	งบที่ใช้ไป	เงินเหลือจ่าย	%เงินเหลือจ่าย
1	บึงกาฬ	37,928,558.17	164	0	0	6	3.66	0	0	158	96.34	32,993,297.90	32,551,803.91	441,493.99	1.34
2	หนองบัวลำภู	28,377,251.61	72	4	0.7	5	6.94	0	0	63	87.50	24,527,251.61	24,400,331.61	126,920.00	0.52
3	อุดรธานี	152,357,970.55	953	3	0.31	30	3.15	7	0.73	913	95.80	127,232,471.64	124,716,061.63	2,516,410.01	1.98
4	เลย	61,662,182.05	386	1	0.2	3	0.78	5	1.02	377	97.67	57,497,182.05	57,281,467.88	215,714.17	0.38
5	หนองคาย	52,570,194.50	324	0	0	11	3.40	13	4.01	300	92.59	38,501,370.44	38,084,469.11	416,901.33	1.08
6	สกลนคร	98,067,152.10	243	2	0.29	17	7.00	2	0.29	222	91.36	68,226,588.46	67,786,035.18	440,553.28	0.65
7	นครพนม	55,523,441.14	292	0	0	1	0.34	0	0	291	99.66	54,753,441.14	54,598,153.29	155,287.85	0.28
<b>รวม เขต 8</b>		<b>486,486,750.12</b>	<b>2,434</b>	<b>10</b>	<b>0.41</b>	<b>73</b>	<b>3.00</b>	<b>27</b>	<b>1.11</b>	<b>2,324</b>	<b>95.48</b>	<b>403,731,603.24</b>	<b>399,418,322.61</b>	<b>4,313,280.63</b>	<b>1.07</b>

**\*\* ขอร่งรัดให้ดำเนินการลงนามในสัญญา-เบิกจ่าย ให้แล้วเสร็จก่อน กรกฎาคม 2568 \*\***

# 3.งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม)

3.5 สรุปการโอนเงิน ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2568

หน่วยบริการในสังกัด สป.สร. ตามวงเงินที่จัดสรร รวมงบประมาณ 100% ภาพรวม 7 จังหวัด

จังหวัด	ครุภัณฑ์		สิ่งก่อสร้าง		รวมจำนวนรายการ	รวมงบ UC
	จำนวนครุภัณฑ์	งบ UC ครุภัณฑ์	จำนวนสิ่งก่อสร้าง	งบ UC สิ่งก่อสร้าง		
บึงกาฬ	169	29,926,832.68	24	6,468,461.98	193	36,395,294.66
หนองบัวลำภู	352	40,743,641.76	5	789,825.88	357	41,533,467.64
อุดรธานี	535	140,607,823.10	70	11,962,440.80	605	152,570,263.90
เลย	361	59,312,666.89	8	2,513,014.58	369	61,825,681.47
หนองคาย	279	47,807,135.53	22	4,392,102.03	301	52,199,237.56
สกลนคร	632	114,565,586.50	15	5,344,316.63	647	119,909,903.13
นครพนม	252	44,618,378.87	52	12,969,639.95	304	57,588,018.82
<b>รวม</b>	<b>2,580</b>	<b>477,582,065.33</b>	<b>196</b>	<b>44,439,801.85</b>	<b>2,776</b>	<b>522,021,867.18</b>



# GROUP LINE CPO



# THANK YOU

FOR YOUR ATTENTION

 <https://r8way.moph.go.th>

