

รายงานความก้าวหน้า

การบริหารจัดการ งบประมาณ เขตสุขภาพที่ 8

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2568

30 กันยายน 2568



CPO R8way
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8



1.การบริหารจัดการงบลงทุนปี 2567 ที่กันเงินเหลื่อมปีไว้ใช้จ่ายในปี 2568

รายการงบลงทุนปี 2567 เหลื่อมปี 2568(ก่อสร้างปีเดียว) แยกรายจังหวัด

ลำดับ	จังหวัด	จำนวนทั้งหมด (รายการ)	ทำถึงขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง							จำนวนงวดงานที่ล่าช้า					
			ประกาศเชิญชวน	รอลงนามสัญญา	ลงนามสัญญา	เริ่มงานก่อสร้างตามแผน	กรรมการตรวจรับงานจ้าง	เบิกจ่ายเงินตามงวดงาน	เบิกจ่ายงวดสุดท้ายแล้วเสร็จ	ไม่มีล่าช้า	ช้า 1 งวด	ช้า 2 งวด	มากกว่า 2 งวด		ไม่มีข้อมูล
													จำนวน	ร้อยละ	
1	อุดรธานี	3	0	0	0	0	0	1	2	1	2	0	0	0.00%	0
2	สกลนคร	4	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0.00%	0
3	นครพนม														
4	เลย	8	0	0	0	0	0	1	7	8	0	0	0	0.00%	0
5	หนองคาย	7	0	0	0	0	0	1	6	6	1	0	0	0.00%	0
6	หนองบัวลำภู														
7	บึงกาฬ	10	0	0	0	1	0	9	0	9	0	0	1	10.00%	0
ผลรวม		32	0	0	0	1	0	12	19	28	3	0	1	3.13%	0

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2568 เวลา 17.00 น.

รายการงบลงทุนปี 2567 เหลื่อมปี 2568 (ก่อสร้างปีเดียว) ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

- บึงกาฬ 1 รายการ
 - บ้านพักข้าราชการระดับอำนวยการต้น/ ชำนาญการพิเศษ 2 ชั้น sw.มุงค้ำ

1.การบริหารจัดการงบลงทุนปี 2567 ที่กันเงินเหลื่อมปีไว้ใช้จ่ายในปี 2568

1.1 รายการงบลงทุนปี 2567 เหลื่อมปี 2568(ก่อสร้างปีเดียว) ที่ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ แยกรายจังหวัด

ลำดับ	ชื่อรายการตาม พรบ.	ชื่อสถานที่	จังหวัด	ทำถึงขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง	วันที่ลงนามจริง	วันครบกำหนดส่งมอบตามสัญญา	วันที่เบิกจ่ายเงินจริง	จำนวนงวดงานปี 2568 (ระบุงวดงาน)	ปัจจุบันดำเนินการถึงงวดงานที่	จำนวนงวดงานที่ล่าช้า	สาเหตุความล่าช้า
55	บ้านพักข้าราชการระดับอำนวยการต้น/ หน่วยงานการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลบึงค้อ ตำบลบึงค้อ อำเภอบึงค้อ จังหวัดบึงกาฬ 1 หลัง	โรงพยาบาลบึงค้อ	บึงกาฬ	7.เผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง	26/11/2025	21/7/2026	งวดที่ 1 เบิกจ่าย22/5/2568	5	2	3	ทำสัญญาใหม่ ลงวันที่ 17 กันยายน 68 งวด 1-4(สุดท้าย) เบิกจ่ายจากเงินนำร่อง 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2568 เวลา 17.00 น.




1.การบริหารจัดการงบลงทุนปี 2567 ที่กันเงินเหลื่อมปีไว้ใช้จ่ายในปี 2568

ภาพรายการงบลงทุนปี 2567 เหลื่อมปี 2568(ก่อสร้างผูกพัน) แยกรายจังหวัด

ลำดับ	จังหวัด	จำนวนทั้งหมด (รายการ)	ทำถึงขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง						จำนวนงวดงานที่ล่าช้า					
			จัดทำ แผน/TOR/BOQ/ ร่างประกาศ	รอลงนาม สัญญา	ลงนามสัญญา	เริ่มงาน ก่อสร้างตาม แผน	ผู้ควบคุมงาน รายงานสรุป	เบิกจ่ายเงินตาม งวดงาน	ไม่มีล่าช้า	ช้า 1-2 งวด	ช้า 3-4งวด	5 งวดขึ้นไป		ไม่มีข้อมูล
												จำนวน	ร้อยละ	
1	อุดรธานี	5	0	0	0	2	0	3	0	5	0	0	0.00%	0
2	สกลนคร	4	0	1	0	2	0	1	2	0	0	2	50.00%	0
3	นครพนม	2	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	50.00%	0
4	เลย	3	0	0	0	3	0	0	2	1	0	0	0.00%	0
5	หนองคาย	3	0	0	0	1	0	2	2	0	1	0	0.00%	0
6	หนองบัวลำภู	2	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0.00%	0
7	บึงกาฬ	2	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	50.00%	0
ผลรวม		21	0	1	1	12	0	7	6	10	1	4	19.05%	0

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2568 เวลา 17.00 น.

รายการงบลงทุนปี 2567 เหลื่อมปี 2568 (ก่อสร้างผูกพัน) ที่ยังไม่ลงนามสัญญา/ก่อสร้างล่าช้าเกิน 5 งวดงาน

-  รอลงนามสัญญา 1 รายการ(อาคาร OPD/ER sw.พังโคน สกลนคร)
-  ก่อสร้างล่าช้า 5 งวดขึ้นไป 4 รายการ(สกลนคร 2, นครพนม 1, บึงกาฬ 1)
-  ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ 1 รายการ(อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น sw.นาหว้า นครพนม)

1.การบริหารจัดการงบลงทุนปี 2567 ที่กันเงินเหลื่อมปีไว้ใช้จ่ายในปี 2568

1.2 รายการงบลงทุนปี 2567 เหลื่อมปี 2568(ก่อสร้างผูกพัน) ที่ดำเนินงานล่าช้า/เสี่ยงพับ แยกรายจังหวัด

ลำดับ	ชื่อรายการตาม พ.ร.บ.	ชื่อสถานที่	จังหวัด	ทำถึงขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง	วันที่คาดว่าจะลงนามสัญญา	วันที่ลงนามจริง	วันครบกำหนดส่งมอบตามสัญญา	งวดงานที่ถึง	จำนวนงวดงานปี 2568 (ระบุงวดงาน)	ปัจจุบันดำเนินการถึงงวดงานที่	จำนวนงวดงานที่ล่าช้า	สาเหตุความล่าช้า
1	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,724 ตารางเมตร โรงพยาบาลสุพรรณคูหา ตำบลสุพรรณคูหา อำเภอสุพรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 1 หลัง	โรงพยาบาลสุพรรณคูหา	หนองบัวลำภู	15.ส่งสำเนาสัญญา/ข้อตกลง ให้ สตง. และกรมสรรพากร		29/10/2024		10	7	5	2	เบิกจ่ายงวดงานที่ 1-3 จำนวน 5,379,000 บาท เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 2 กย.68 ผู้รับจ้างดำเนินการถึงงวดที่ 4 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และน่าจะส่งมอบงานงวดที่ 4 ภายใน ต้นเดือน ต.ค. และกค.ตรวจงานจ้างจะได้นัดประชุมตรวจรับ ภายใน 10 ต.ค.
2	อาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 936 ตารางเมตร โรงพยาบาลหนองบัวลำภู ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 1 หลัง	โรงพยาบาลหนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	25.เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างตามงวดงาน	10/4/2025	11/4/2025	6 เมย.68	8	3	2	1	- ณ วันที่ 25 สค.68 นำส่งเอกสารกลุ่มการเบิกจ่ายงวดที่ 1/8 เป็นเงิน 2,056,723.93 บาท เพื่อกำหนดเบิกจ่ายต่อไป - เบิกจ่าย งวดที่ 2/8 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 กย.2568 เป็นเงิน 2,469,183.48 บาท
7	อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,796 ตารางเมตร โรงพยาบาลหนองหาน ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง	โรงพยาบาลหนองหาน	อุดรธานี	18.ผู้ควบคุมงานรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน		26/11/2024	21/7/2026	12	3	1	2	- ผู้รับจ้างได้ดำเนินงานก่อสร้างฐานรากชนิดแผ่เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดที่ 1 - 4 ภายในเดือน กันยายน 2568 ผู้บริหารมีการติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง - ดำเนินการขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง (อยู่ระหว่างทำความเข้าใจความตกลงกับสำนักงบประมาณ) - ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างงานงวดที่ 4 (รอผู้ว่าลงนามแก้ไขสัญญา)
19	หอผู้ป่วยใน 7 ชั้น (จำนวน 156 เตียง) เป็นอาคาร คสล.7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,184 ตารางเมตร (โครงสร้างชั้นแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลวังสะพุง ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 1 หลัง	โรงพยาบาลวังสะพุง	เลย	18.ผู้ควบคุมงานรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน	9มค68	9มค68	7รค69	20	20	2	0ไม่มีล่าช้า	อยู่ระหว่างงานงวด 3
40	อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุฉุกเฉิน นวัตกรรมรักษาและสำนักงาน เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 11,600 ตารางเมตร โรงพยาบาลพังโคน ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 1 หลัง	โรงพยาบาลพังโคน	สกลนคร	11.จัดทำบันทึกรายงานผลการพิจารณา	12-30 เม.ย.2568	-		19	6	0	19	- อยู่ระหว่างเสนออนุมัติสั่งจ้าง สป.ส. รอปลัดลงนาม โดยผู้ชนะการเสนอราคา กิจการร่วมค้า เอ็ม อี ซี ไทยอีสาน วงเงิน 283,200,000 บาท แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ลงนามในเดือนตุลาคม 2568 แต่ต้องใช้งบของปี 2568 ไปก่อน จึงจะดึงงบปี 2567 (48 ล้านบาท) กลับมาภายหลัง ทั้งนี้ กบร. ได้ทราบเรื่องแล้วและมีการขยายเวลาให้ถึงปีงบประมาณ 2571

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2568 เวลา 17.00 น.

1.การบริหารจัดการงบลงทุนปี 2567 ที่กันเงินเหลื่อมปีไว้ใช้จ่ายในปี 2568

1.2 รายการงบลงทุนปี 2567 เหลื่อมปี 2568(ก่อสร้างผูกพัน) ที่ดำเนินงานล่าช้า/เสี่ยงพับ แยกรายจังหวัด(ต่อ)

ลำดับ	ชื่อรายการตาม พ.ร.บ.	ชื่อสถานที่	จังหวัด	ทำถึงขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง	วันที่คาดว่าจะลงนามสัญญา	วันที่ลงนามจริง	วันครบกำหนดส่งมอบตามสัญญา	งวดงานทั้งสิ้น	จำนวนงวดงานปี 2568 (ระบุงวดงาน)	ปัจจุบันดำเนินการถึงงวดงานที่	จำนวนงวดงานที่ล่าช้า	สาเหตุความล่าช้า
41	อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,919 ตารางเมตร โรงพยาบาลบ้านม่วง ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 1 หลัง	โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต	สกลนคร	17.ผู้รับจ้างก่อนเริ่มงานก่อสร้างตามแผนแผนบริหารสัญญาและแผนควบคุมงาน		-	5/9/2026	10	0	1	10	- ประกาศผู้ชนะแล้ว ลงนามในสัญญาในเดือน พฤษภาคม 2568 ในงบประมาณ ปี 2567 มีทั้งหมด 4 งวดงาน, งวดงานที่ 1 ไม่สามารถดำเนินการได้ทันและถูกพับ วงเงินประมาณ 10 ล้านบาท กบรส. ทำเรื่องโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว, งวดงานที่ 2-4 กบรส. ได้ทำเรื่องโอนเปลี่ยนแปลงแล้วเช่นกัน
42	ห้องชุดครอบครัว 24 ครอบครัว เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 819 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่องดาว ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 1 หลัง	โรงพยาบาลพระอาจารย์วัน อุตต	สกลนคร	17.ผู้รับจ้างก่อนเริ่มงานก่อสร้างตามแผนแผนบริหารสัญญาและแผนควบคุมงาน	-	31/10/2024	26/10/2025	8	8	8	0ไม่มีล่าช้า	- จบปี 67 เบิกจ่ายครบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดที่ 6 และดำเนินการก่อสร้างงานงวดที่ 7 คาดว่าสามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน 25 ตุลาคม 2568 ทั้งนี้ ได้ดำเนินการทำเรื่องกันงบแล้ว งวดที่ 8 ดำเนินงานก่อสร้างคิดเป็นร้อยละ 40
45	อาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง (มาตรฐาน) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,508 ตารางเมตร (โครงสร้างชั้นแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลศรีสงคราม ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 1 หลัง	โรงพยาบาลศรีสงคราม	นครพนม	17.ผู้รับจ้างก่อนเริ่มงานก่อสร้างตามแผนแผนบริหารสัญญาและแผนควบคุมงาน		14/3/2025	11/3/2026	8	2	1	2	ตรวจรับงวดงานที่ 1 วันที่ 8 กันยายน 2568 อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารเบิกจ่าย เบิกจ่ายงวดงานที่ 1 วันที่ 19 กันยายน 68 แล้ว
46	อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,919 ตารางเมตร (โครงสร้างชั้นแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลนาหว้า ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 1 หลัง	โรงพยาบาลนาหว้า	นครพนม	14.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดภายหลังพ้นจากระยะเวลาอุทธรณ์	12/9/2025	17/9/2025		10	5	0	5	อยู่ระหว่างส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ
57	อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 23,765 ตารางเมตรโรงพยาบาล บึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 หลัง	โรงพยาบาลบึงกาฬ	บึงกาฬ	17.ผู้รับจ้างก่อนเริ่มงานก่อสร้างตามแผนแผนบริหารสัญญาและแผนควบคุมงาน		22/3/2024	18/10/2026	23	12	7	6	เร่งรัดงานงวดที่ 7 วันที่ 5 กันยายน 2568
58	อาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,487 ตารางเมตร (โครงสร้างชั้นแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลบึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 หลัง	โรงพยาบาลบึงกาฬ	บึงกาฬ	18.ผู้ควบคุมงานรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน		11/9/2024	5/3/2026	14	7	8	1	ตรวจรับงวด 7 วันที่ 4 กันยายน 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2568 เวลา 17.00 น.

2.การบริหารจัดการงบประมาณปี 2568

2.1 การบริหารงบลงทุน(ครุภัณฑ์)ปี 2568

ลำดับ	จังหวัด	เวททั้งหมด(รายการ)	จัดทำแผน/กำหนด spec		ประกาศเชิญชวน		รอลงนามสัญญา		ลงนามสัญญา		รอส่งมอบ/ตรวจรับ		เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	
			25/8/2025	26/9/2025	25/8/2025	26/9/2025	25/8/2025	26/9/2025	25/8/2025	26/9/2025	25/8/2025	26/9/2025	25/8/2025	26/9/2025
1	อุดรธานี	495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495	495
2	สกลนคร	36	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	33	33
3	นครพนม	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28
4	เลย	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	73
5	หนองคาย	127	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	126	126
6	หนองบัวลำภู	502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	502	502
7	บึงกาฬ	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15
ผลรวม		1,276	0	0	0	0	0	0	0	3	4	1	1272	1272

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2568 เวลา 17.00 น.

ภาพรวมรายการงบลงทุนปี 2568 (ครุภัณฑ์)

- เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 1,272 หน่วย (99.69%)
- รอส่งมอบ/อยู่ระหว่างการตรวจรับพัสดุ 4 รายการ 4 หน่วย
 - สกลนคร 3 รายการ 3 หน่วย
 - หนองคาย 1 รายการ 1 หน่วย

2.การบริหารจัดการงบลงทุนปี 2568

2.1 การบริหารงบลงทุน(ครุภัณฑ์)ปี 2568 เฉพาะรายการที่รอส่งมอบ/อยู่ระหว่างการตรวจรับพัสดุ แยกรายจังหวัด

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย(บาท)	จำนวน	ชื่อสถานที่	จังหวัด	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	ทำถึงขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง	วันที่ลงนามสัญญาจริง	วันครบกำหนดส่งมอบตามสัญญา	เดือนที่คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	สาเหตุความล่าช้า
5	เครื่องเร่งอนุภาคแบบอุโมงค์หมุนด้วยอัตราความเร็วสูง พร้อมระบบภาพนำวิถี ชนิดกิโลโวลต์	150,000,000.00	1	โรงพยาบาลสกลนคร	สกลนคร	E_bidding	17.ส่งสำเนาสัญญา/ข้อตกลงให้ สตง. และกรมสรรพากร	21/5/20...	15/2/2026	☹	
68	เครื่องตรวจจ้องวัยอะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ระดับความคมชัดสูง 3 หัวตรวจ	2,500,000.00	1	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน	สกลนคร	E_bidding	17.ส่งสำเนาสัญญา/ข้อตกลงให้ สตง. และกรมสรรพากร	3/12/20...	3/3/2025	☹	
69	กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวิดีโอทัศนแบบคมชัดสูง พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ	3,700,000.00	1	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน	สกลนคร	E_bidding	17.ส่งสำเนาสัญญา/ข้อตกลงให้ สตง. และกรมสรรพากร	3/12/20...	3/3/2025	☹	
176	กล้องส่องตรวจและผ่าตัดกระดูกสันหลัง	6,000,000.00	1	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ	หนองคาย	E_bidding	19.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับพัสดุจากผู้ขาย	1/5/2068	29/8/2025	1/9/2025	

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2568 เวลา 17.00 น.

2.การบริหารจัดการงบลงทุนปี 2568

2.2 การบริหารงบลงทุน(สิ่งก่อสร้าง)ปี 2568

ลำดับ	จังหวัด	จำนวนทั้งหมด (รายการ)	ทำถึงขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง							
			จัดทำ แผน/TOR/BOQ/ ร่างประกาศ	ประกาศเชิญชวน	รอลงนาม สัญญา	ลงนามสัญญา	เริ่มก่อสร้าง/ จัดหาตามแผน	คกก.ตรวจรับ	เบิกจ่ายเงินงวด สุดท้าย	ส่งคืนงบประมาณ
1	อุดรธานี	14	0	0	1	0	1	2	8	2
2	สกลนคร	4	0	0	0	0	1	0	3	0
3	นครพนม									
4	เลย	3	0	0	0	0	0	2	1	0
5	หนองคาย	4	0	0	0	0	3	1	0	0
6	หนองบัวลำภู	7	0	0	1	0	1	0	5	0
7	บึงกาฬ	5	0	0	0	0	5	0	0	0
ผลรวม		37	0	0	2	0	11	5	17	2

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2568 เวลา 17.00 น.

รายการงบลงทุน68(สิ่งก่อสร้าง) ที่ยังไม่เริ่มดำเนินการก่อสร้าง

- จัดทำแผนการจ้าง 1 รายการ(สว.โพนพิสัย จ.หนองคาย)
- รอลงนาม 2 รายการ(สวศ.อุดรธานี จ.อุดรธานี , สว.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู)

2.การบริหารจัดการงบลงทุนปี 2568

2.2 การบริหารงบลงทุน(สิ่งก่อสร้าง)ปี 2568 เฉพาะรายการที่ยังไม่ลงนามสัญญา แยกรายจังหวัด

ลำดับ	รายการ	วงเงินรวม(บาท)	ชื่อสถานที่	จังหวัด	ประเภท คำขอ	วันที่คาดว่าจะลง นามสัญญา	วันที่ลงนาม จริง	ทำถึงขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง	วันครบกำหนด ส่งมอบตาม สัญญา	วันที่คาดว่าจะส่ง มอบงานงวด สุดท้าย	งวดงาน ทั้งสิ้น	จำนวน งวดงานปี 2568	สาเหตุความล่าช้า
2	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง เป็นอาคาร คสล.7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,908 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	75,239,200.00	โรงพยาบาล โพพพิสัย	หนองคาย	ก่อสร้าง ผูกพัน	30/7/2025	7/8/2025	17.ผู้รับจ้างก่อนเริ่มงาน ก่อสร้างตามแผนบริหาร สัญญาและแผนควบคุมงาน		10/3/2070	15	5	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง งวดที่ 1
8	อาคารกันตกรรม 8 ยูนิต เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 766 ตารางเมตร	25,147,900.00	โรงพยาบาล สุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	ก่อสร้าง ผูกพัน	20 สค.68		11.จัดทำบันทึกรายงานผลการ พิจารณา		20 เมย.69	8	2	ลงประกาศร่างฯครั้งที่ 2 ในวันที่ 23 กย.68 และจะรายงานร่างฯ และประกาศ ในวันที่ 29 กย. 68 และกันเงินไว้เบิกหลัอมปี งบ ประมาณ
1	อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.9 ชั้น และ 1 ชั้น ใต้ดิน พื้นที่ใช้สอยประมาณ 31,420 ตารางเมตร	537,170,000.00	โรงพยาบาลอุดรธานี	อุดรธานี	ก่อสร้าง ผูกพัน	31/8/2025		16. ประชุมคณะกรรมการ ตรวจรับงานก่อสร้าง ผู้ ควบคุมงานและผู้รับจ้างก่อน เริ่มงานก่อสร้างเพื่อวางแผน บริหารสัญญาและแผน ควบคุมงาน			34		1070 วัน

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2568 เวลา 17.00 น.



CPO R8way
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

รายการงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เขตสุขภาพที่ 8


30 กันยายน 2568




การบริหารจัดการงบลงทุนปี 2569

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เขตสุขภาพที่ 8 “รายการครุภัณฑ์”

ความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ภาพรวมเขต

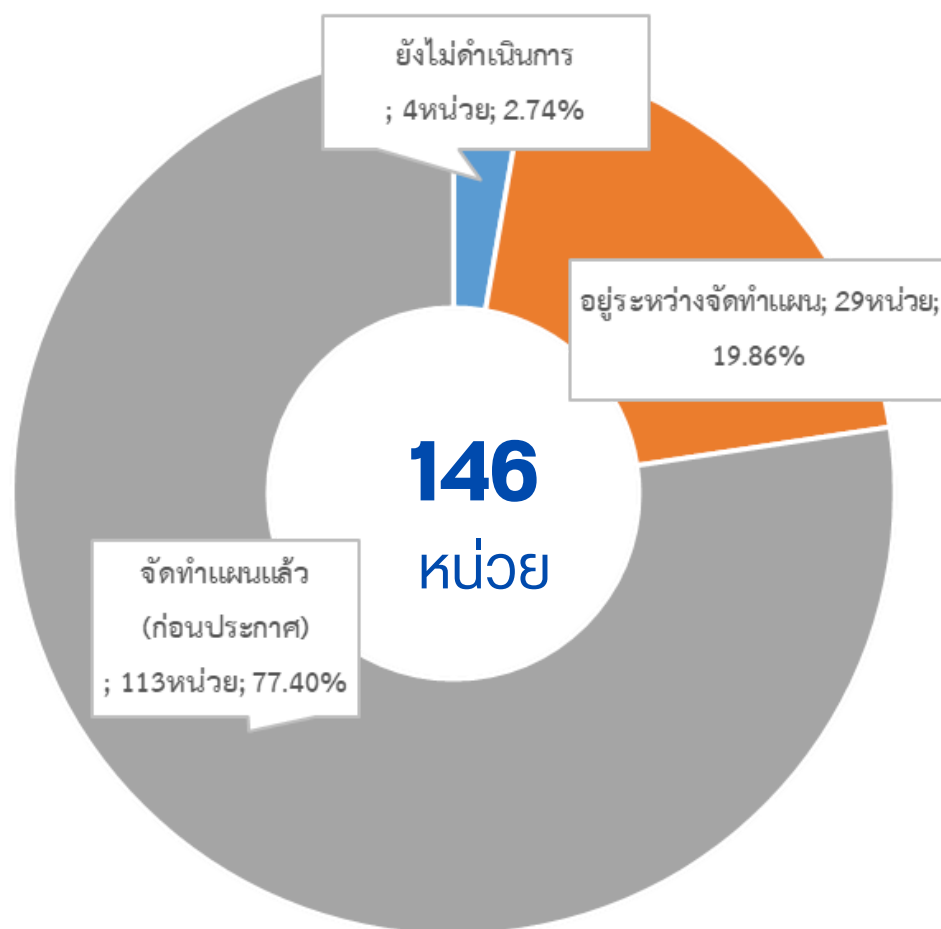


ความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ แยกรายจังหวัด

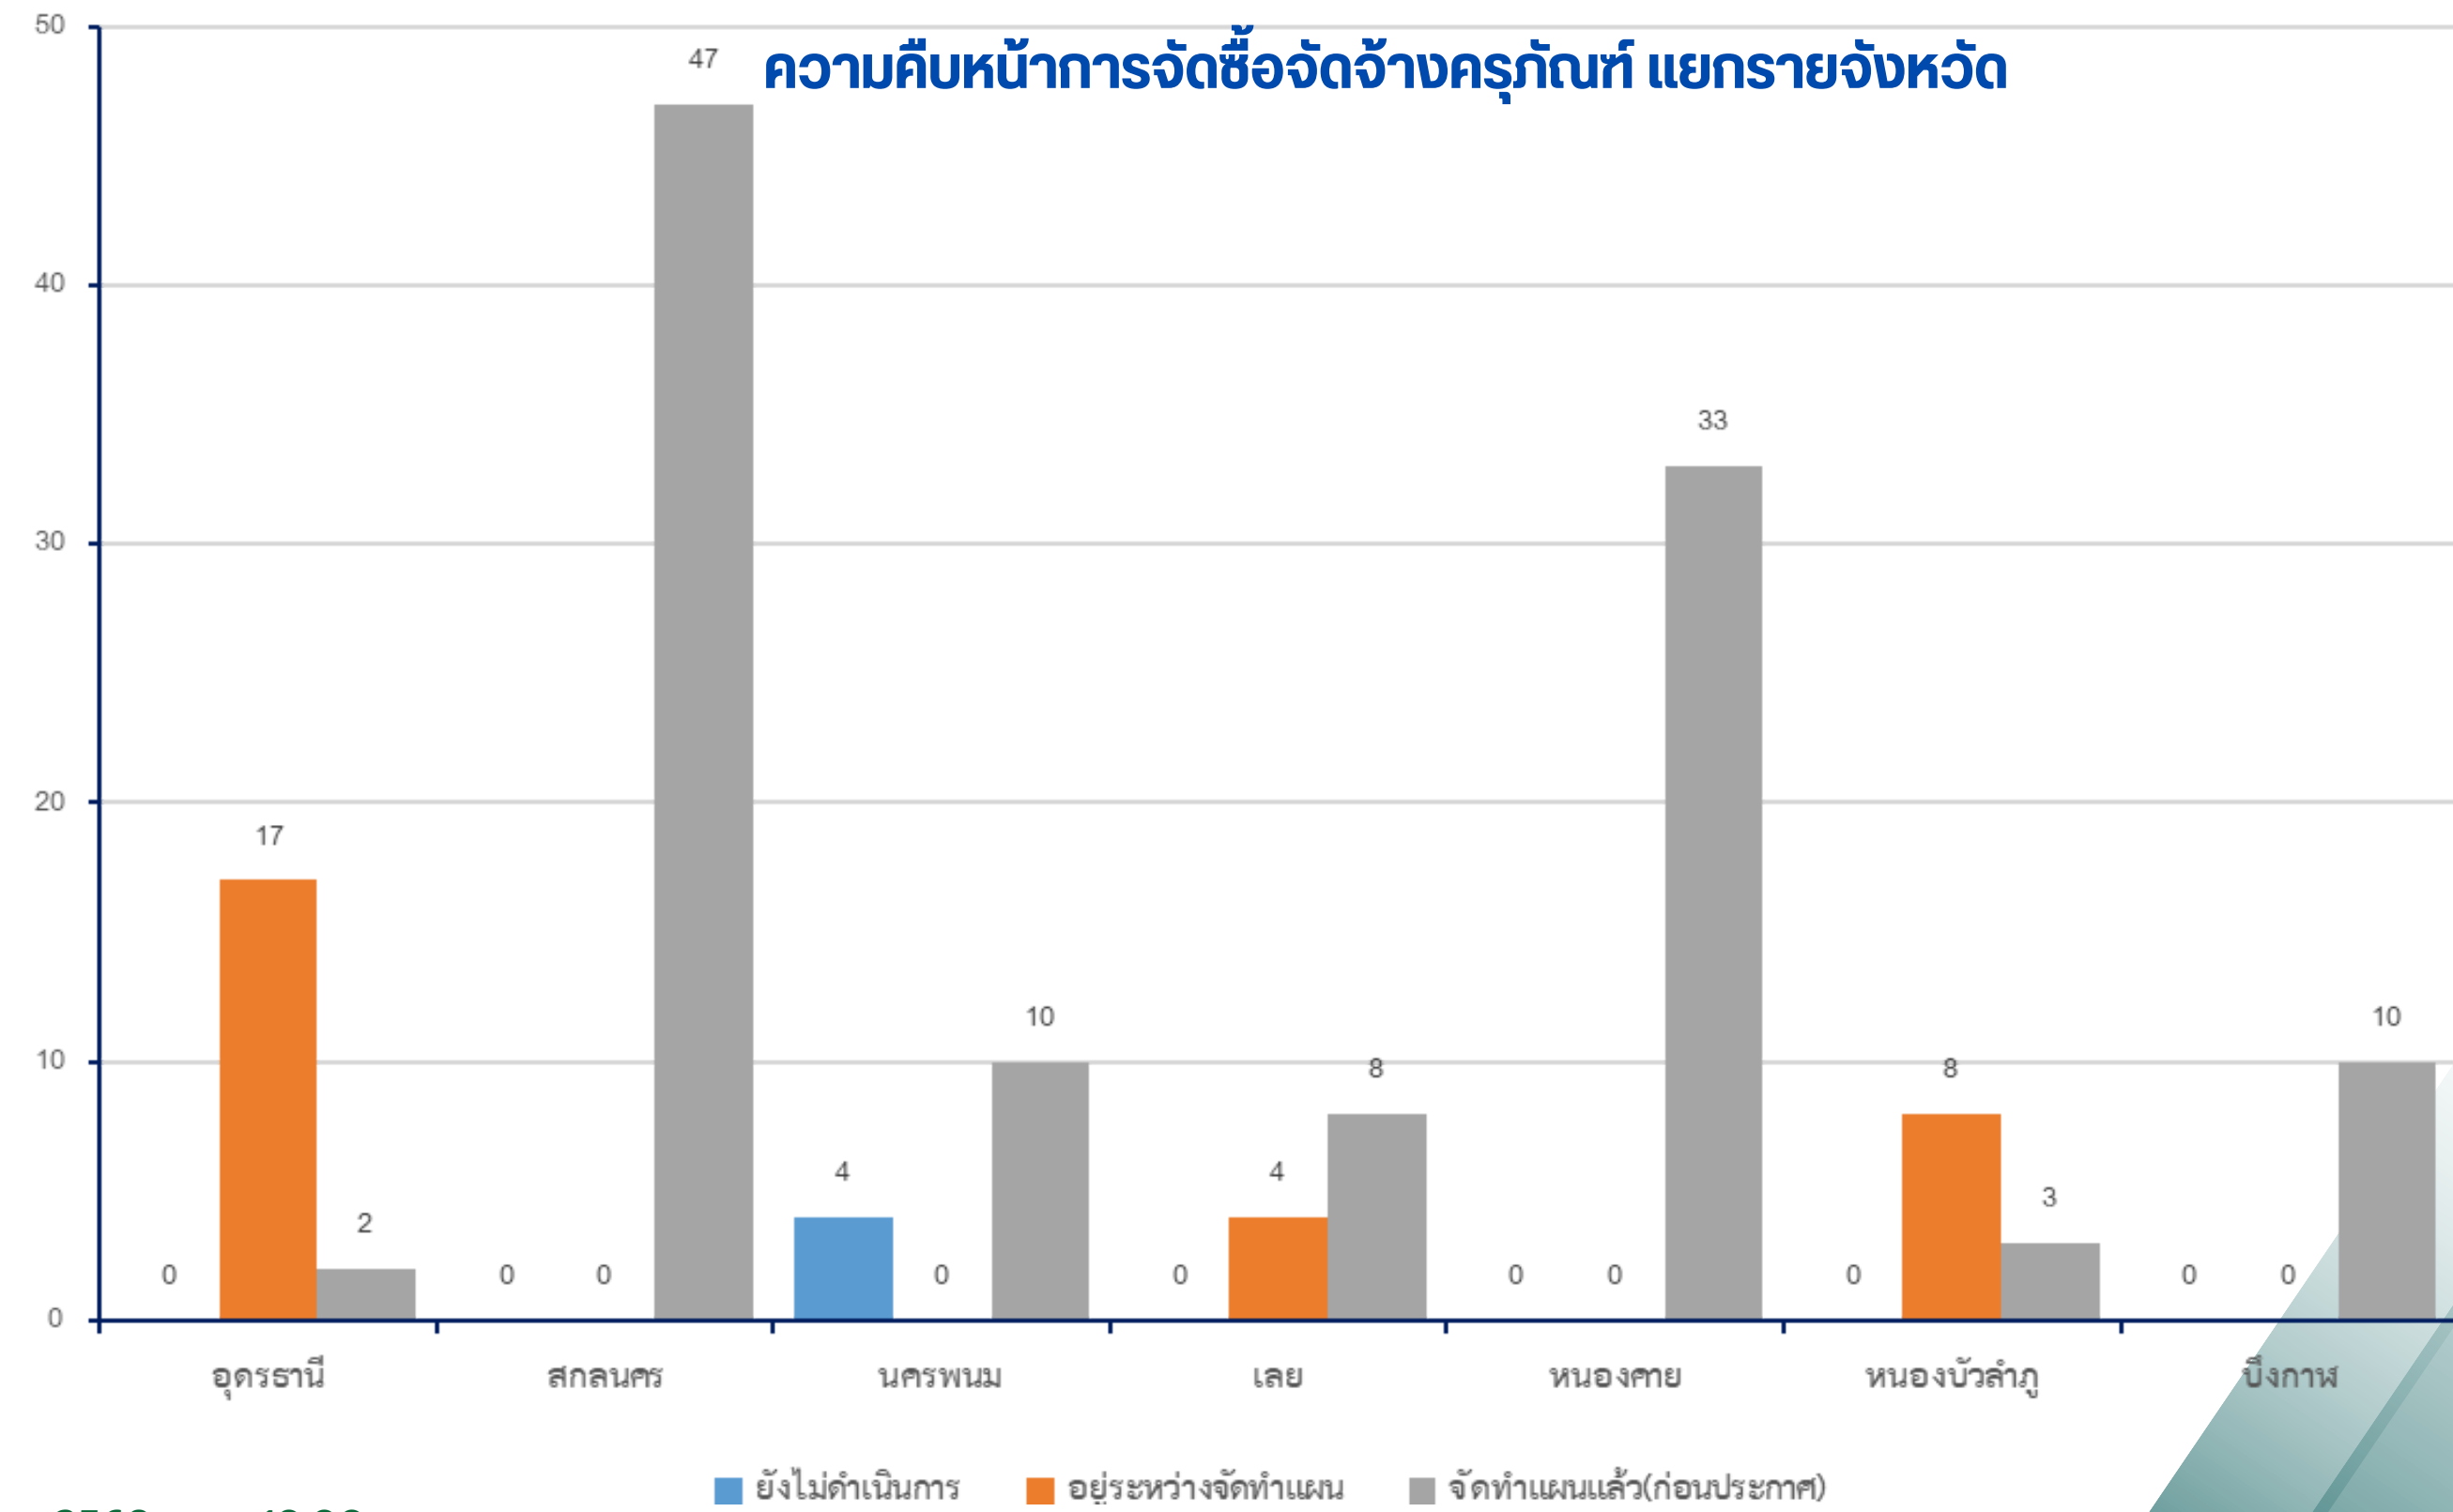


การบริหารจัดการงบลงทุนปี 2569

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เวตสูงภาพที่ 8 “รายการก่อสร้าง”

ความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้าง ภาพรวมเขต

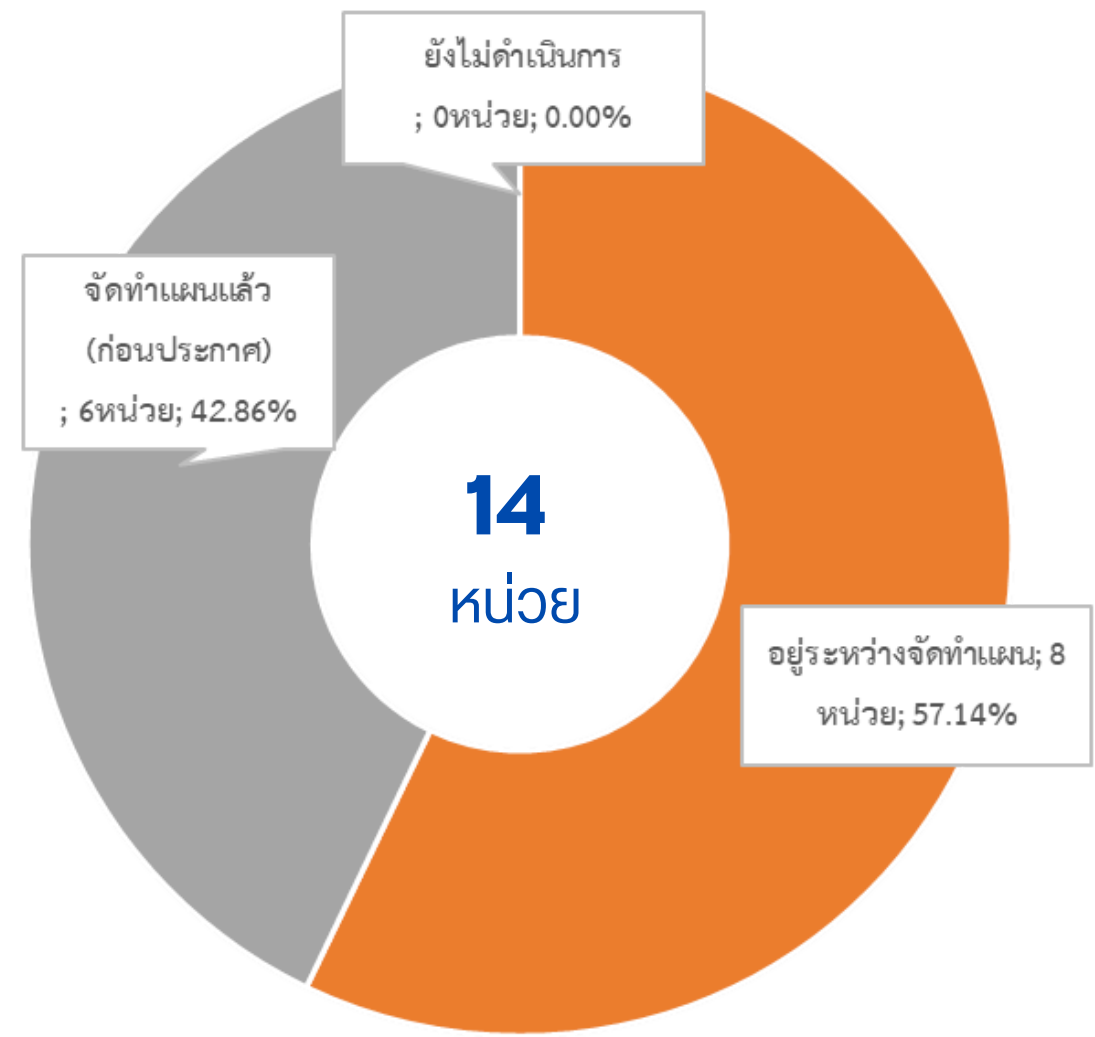

ความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้าง แยกรายจังหวัด

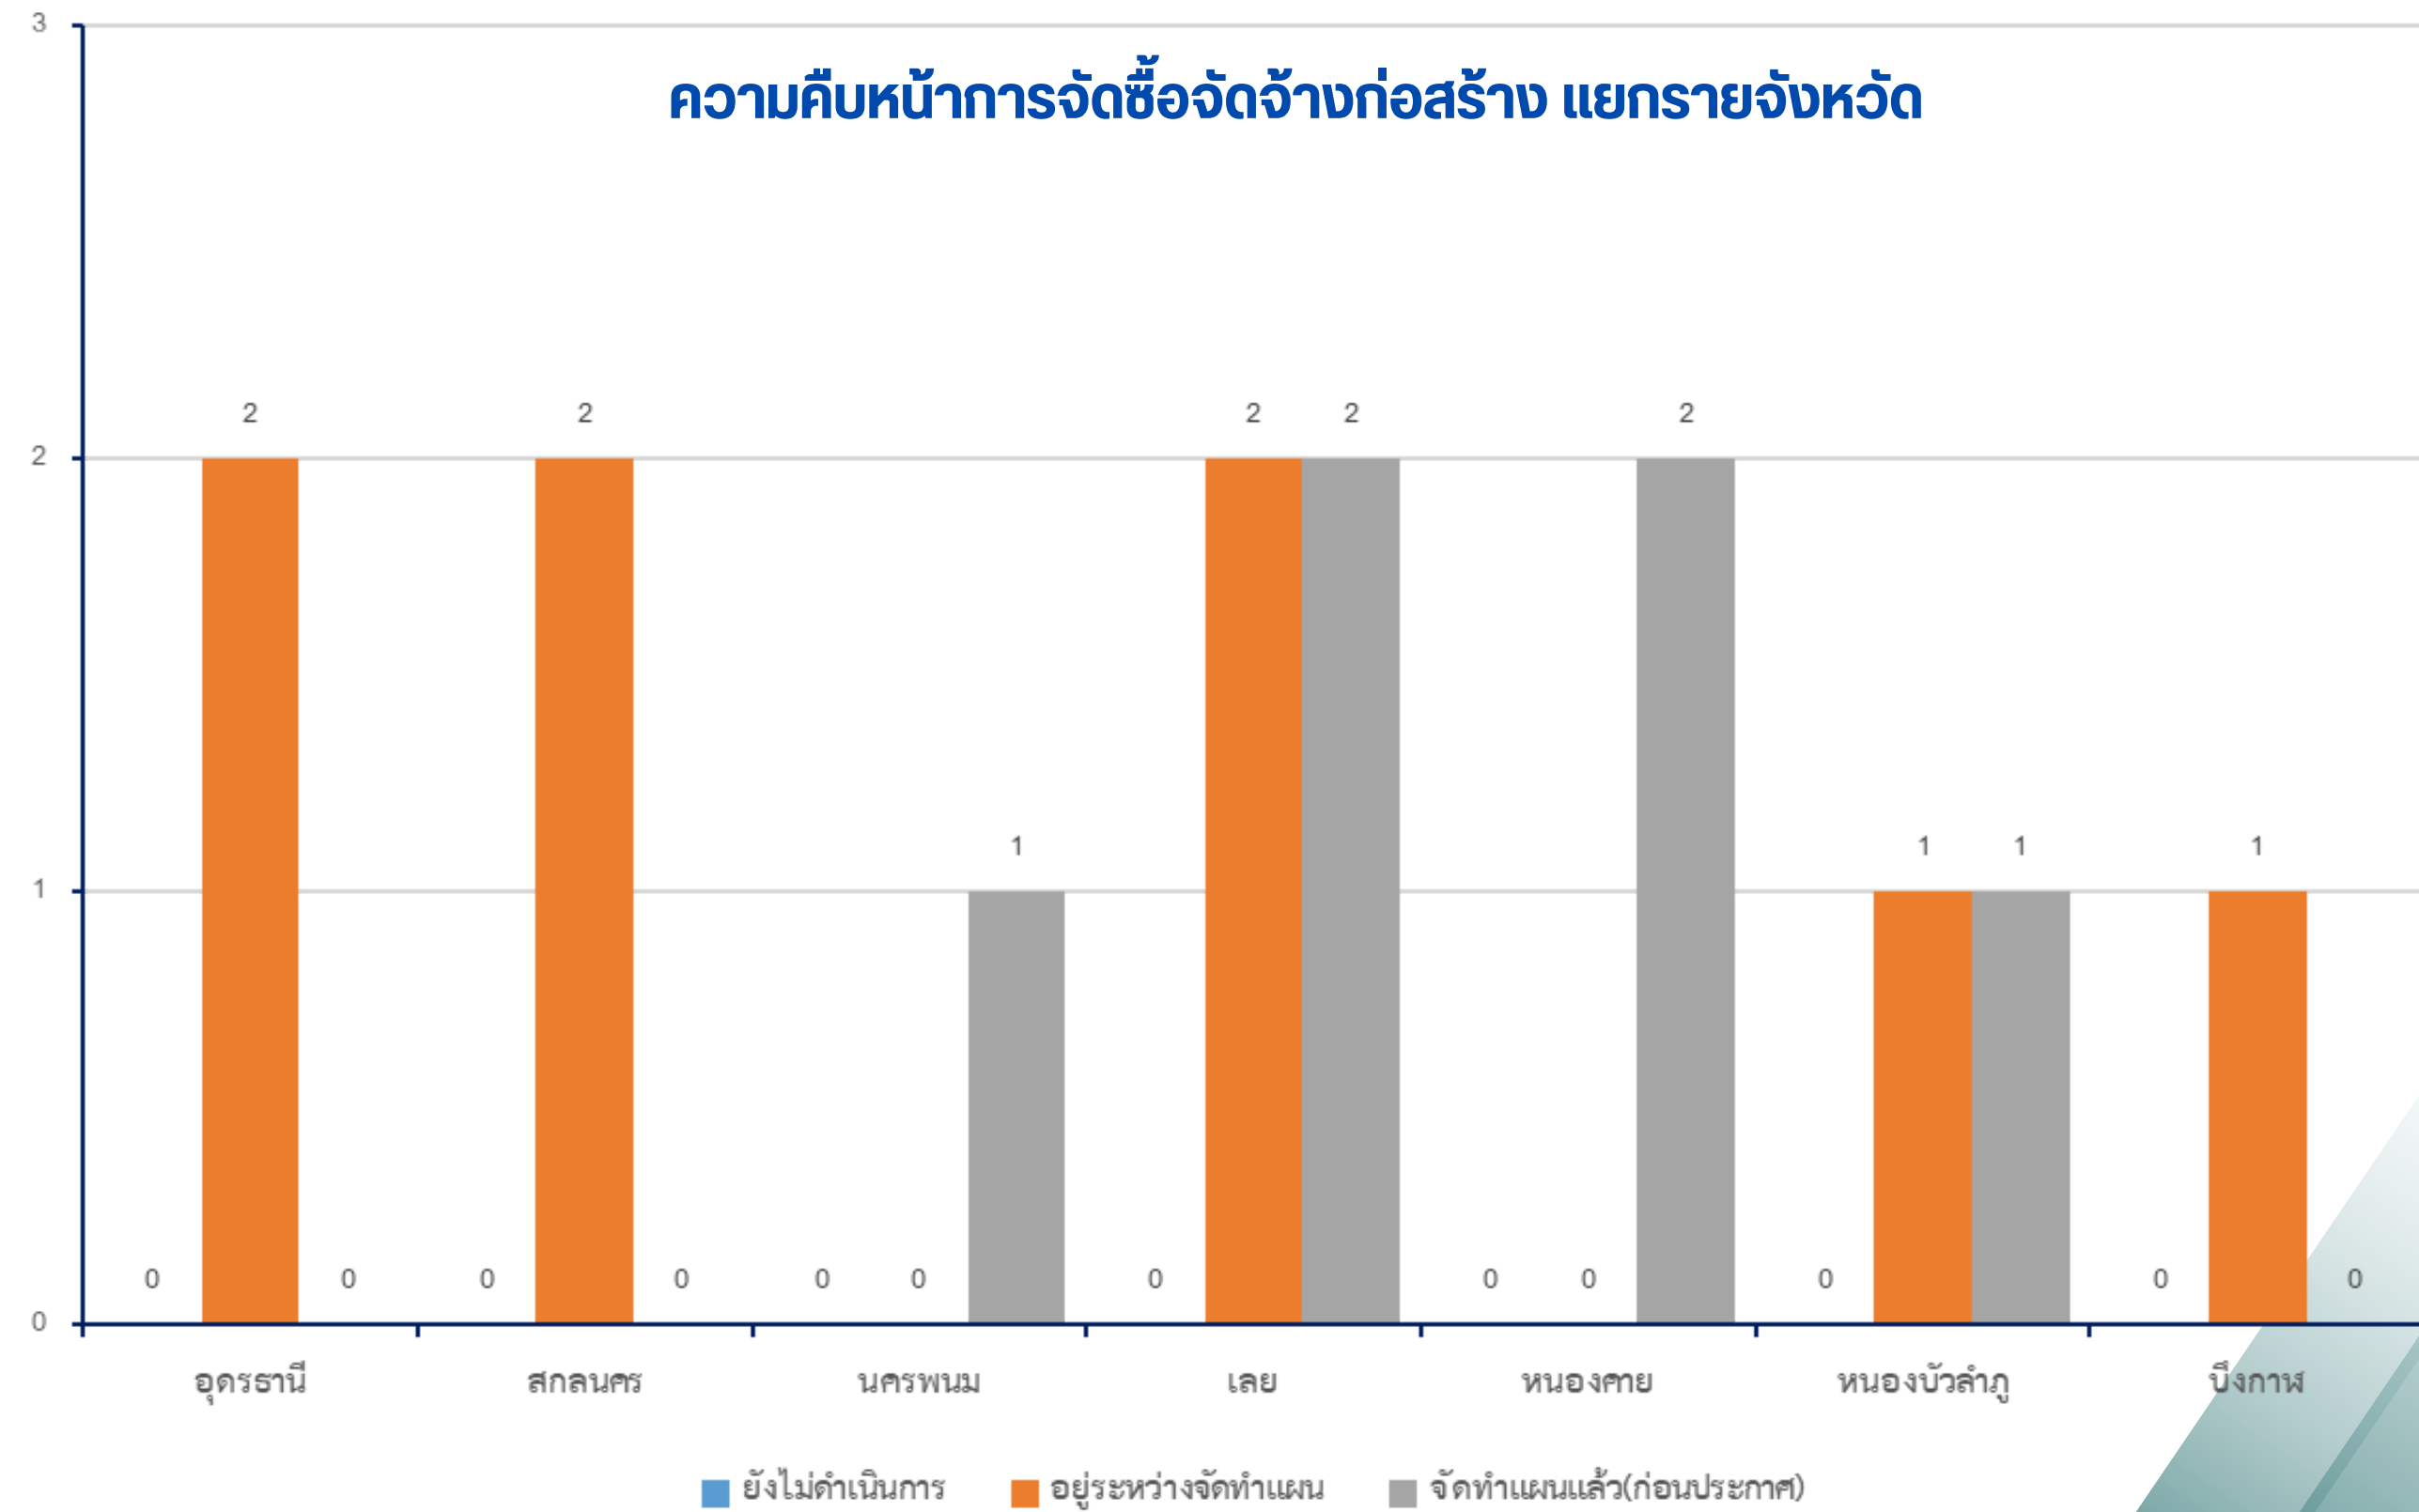

การบริหารจัดการงบลงทุนปี 2569

ความคืบหน้าการดำเนินงานตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 **รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง แยกรายจังหวัด**

หน่วยงาน	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์				ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง สิ่งก่อสร้าง			
	จำนวนรายการ (หน่วย)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างจัดทำแผน	จัดทำแผนแล้ว (ก่อนประกาศ)	จำนวนรายการ (หน่วย)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างจัดทำแผน	จัดทำแผนแล้ว (ก่อนประกาศ)
เขต 8	146	4	29	113	14	0	8	6
อุดรธานี	19		17	2	2		2	
- สสจ.อุดรธานี	17		17		2		2	
- รพ.อุดรธานี	1			1	0			
- รพ.กุมภวาปี	1			1	0			
สกลนคร	47			47	2		2	
- สสจ.สกลนคร	22			22	0			
- รพ.สกลนคร	19			19	2		2	
- รพร.สว่างแดนดิน	4			4	0			
- รพ.วานรนิวาส	2			2	0			
นครพนม	14	4		10	1			1
- สสจ.นครพนม	10			10	1			1
- รพ.นครพนม	4	4			0			

การบริหารจัดการงบลงทุนปี 2569

ความคืบหน้าการดำเนินงานตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 **รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง แยกรายจังหวัด**

หน่วยงาน	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์				ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง สิ่งก่อสร้าง			
	จำนวนรายการ (หน่วย)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างจัดทำแผน	จัดทำแผนแล้ว (ก่อนประกาศ)	จำนวนรายการ (หน่วย)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างจัดทำแผน	จัดทำแผนแล้ว (ก่อนประกาศ)
เลย	12		4	8	4		2	2
- สสง.เลย	8			8	4		2	2
- SW.เลย	4		4		0			
หนองคาย	33			33	2			2
- สสง.หนองคาย	12			12	2			2
- SW.หนองคาย	1			1	0			
- รพร.ท่าบ่อ	20			20	0			
หนองบัวลำภู	11		8	3	2		1	1
- สสง.หนองบัวลำภู	8		8		2		1	1
- SW.หนองบัวลำภู	3			3	0			
บึงกาฬ	10			10	1		1	
- สสง.บึงกาฬ	8			8	0			
- SW.บึงกาฬ	2			2	1		1	



GROUP LINE CPO



THANK YOU

FOR YOUR ATTENTION

 <https://r8way.moph.go.th>

