




รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณงบค่าเสื่อม พ.ศ.2564 และ พ.ศ.2565 (ณ 23 พ.ค.65)

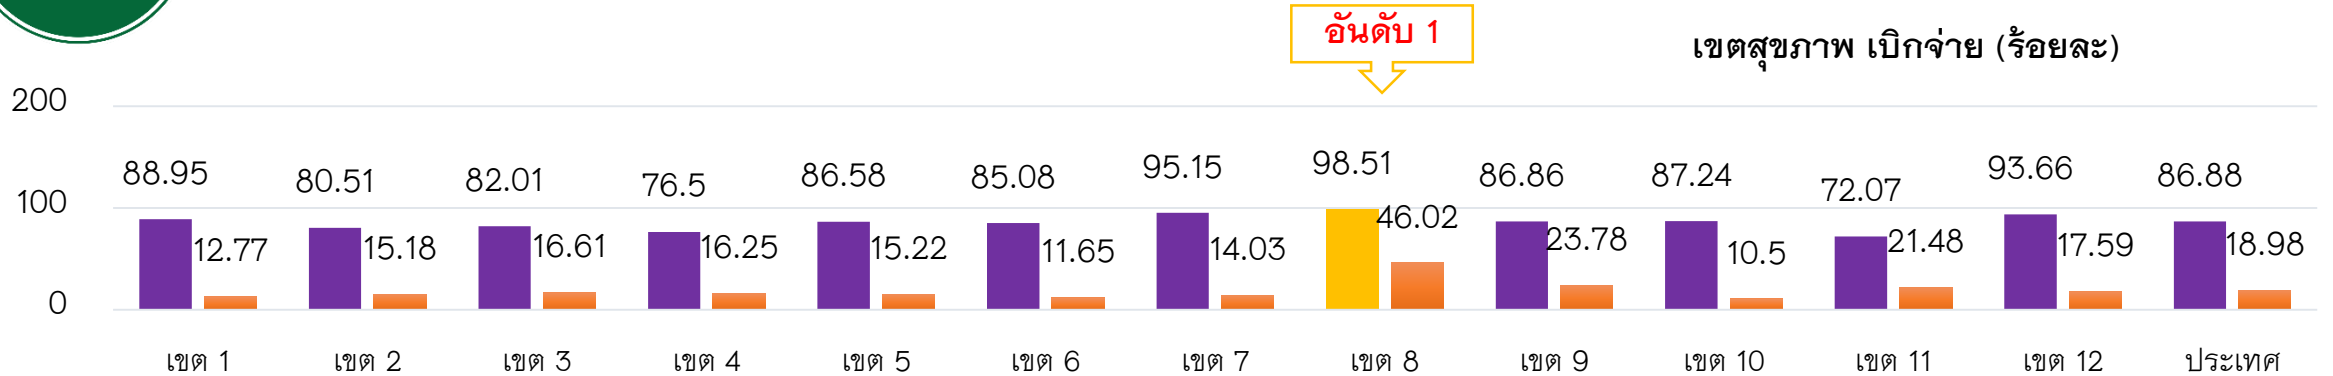

ภาพรวมเขต 8 ปี 64 และ 65 เปิกจ่าย ร้อย 98.51 และ 46.02 อันดับ 1 ของประเทศ

ยังไม่เบิกจ่าย ปี 2564

ลำดับ	จังหวัด	หน่วยบริการ	ยังไม่เบิกจ่าย (รายการ)	เบิกภายใน มิ.ย.65
1	บึงกาฬ	รพ.บึงกาฬ	-	-
2	หนองบัวลำภู	รพ.หนองบัวลำภู	1	1
3	อุดรธานี	-	-	-
4	เลย	รพ.ปากชม	1	1
5	หนองคาย	รพ.ศรีเชียงใหม่, รพ.สระใคร	2, 2	1, 1
6	สกลนคร	-	-	-
7	นครพนม	-	-	-


ยังไม่เบิกจ่าย ปี 2565

ลำดับ	จังหวัด	ยังไม่เบิกจ่าย (รายการ)	เบิกภายใน มิ.ย.65
1	บึงกาฬ	19	19
2	หนองบัวลำภู	95	22
3	อุดรธานี	69	50
4	เลย	235	235
5	หนองคาย	197	115
6	สกลนคร	241	203
7	นครพนม	135	20


ขอให้ทุกจังหวัด
เร่งรัดการเบิกจ่าย
ให้แล้วเสร็จ




รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 (งบดำเนินงาน) (ณ 2 พ.ค.65)

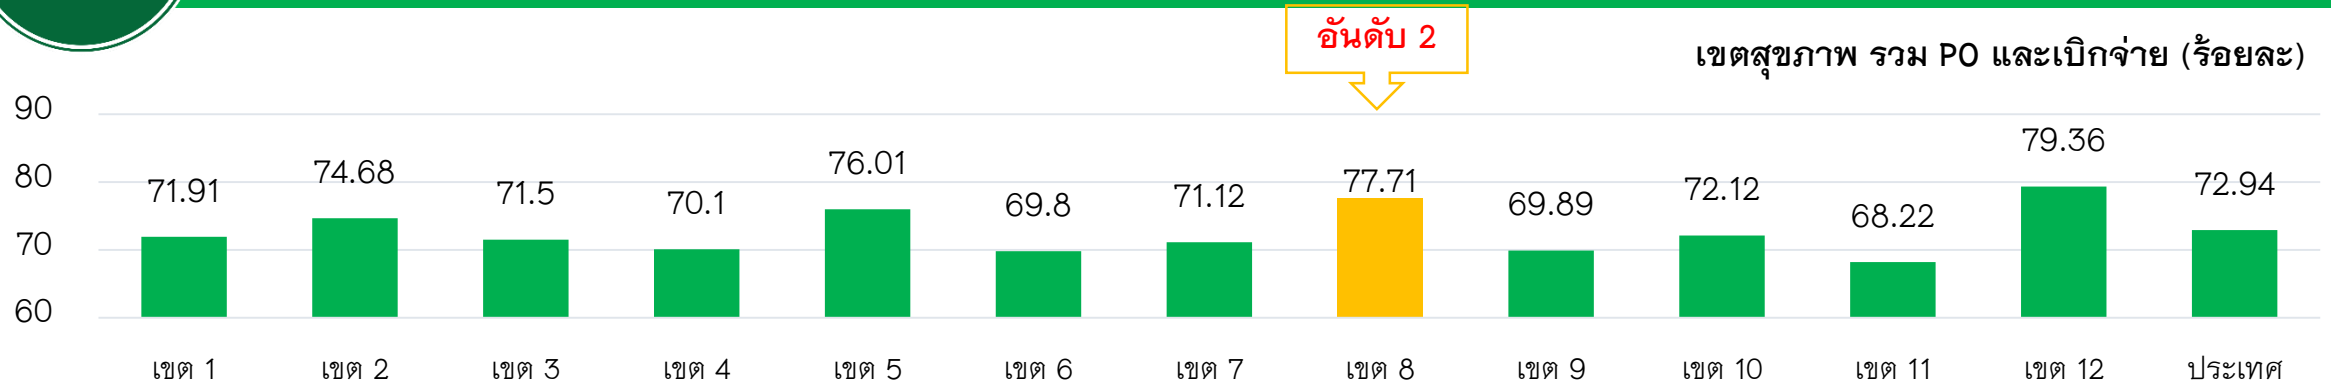

ภาพรวมเขต 8 เบิกจ่าย ร้อยละ 77.71 อันดับ 2 ของประเทศ (เป้าหมายไตรมาส 3 ร้อยละ 81.76) *ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายให้ทันเวลา*

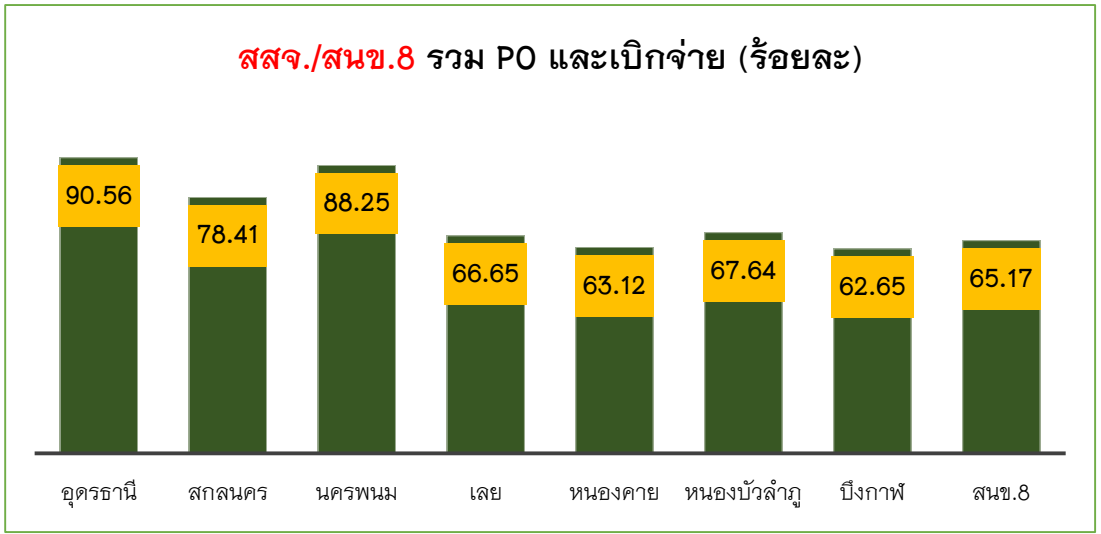


สสจ.อุดรธานี เบิกจ่ายสูงสุด ร้อยละ 90.56
ขอให้เร่งรัดเบิกจ่ายทุกจังหวัด

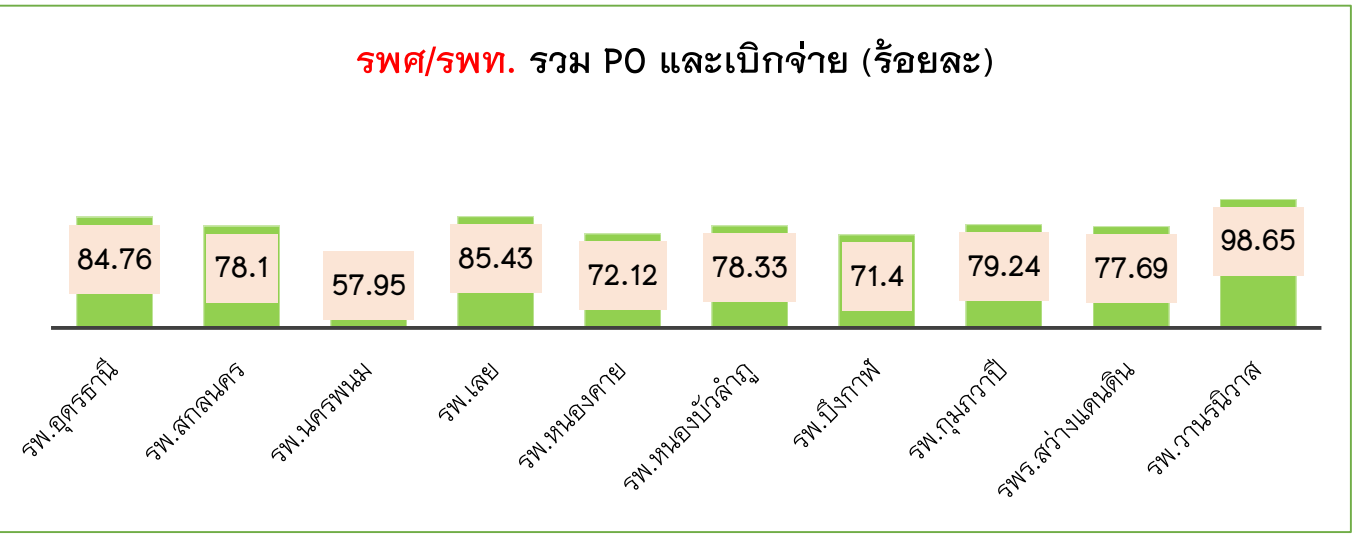

ระดับ รพศ./รพท. เบิกจ่ายสูงสุด ร้อยละ 98.65 >> รพ.วานรนิวาส
ขอให้เร่งรัดเบิกจ่ายทุกโรงพยาบาล



งบลงทุน พ.ร.บ.รายจ่ายประจำปี 2565 (ณ 2 พ.ค.65)

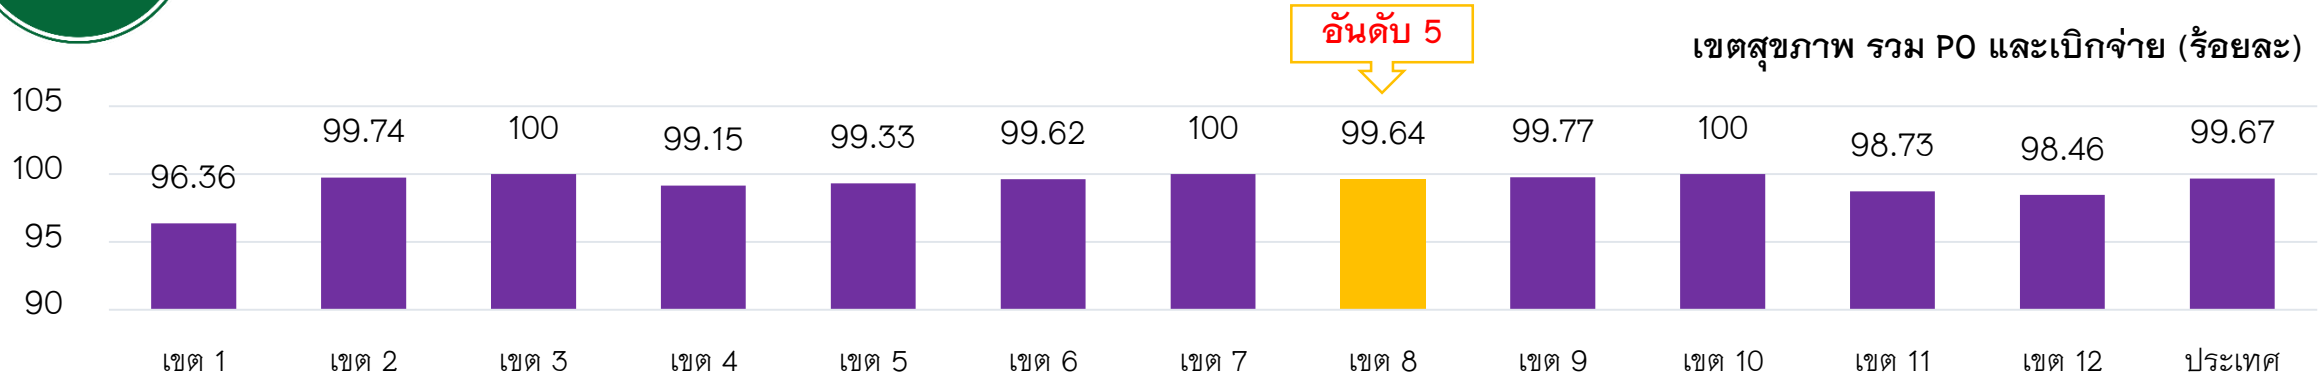

เขตสุขภาพ รวม PO และเบิกจ่าย (ร้อยละ)

อันดับ 5

ภาพรวมเขต 8 เบิกจ่าย ร้อย 99.64 อันดับ 5 ของประเทศ (เป้าหมายไตรมาส 3 ร้อยละ 81.65)

เขต 8 มีรายการปีเดียวที่ลงนามสัญญาแล้ว ยังไม่คืนเงินเหลือจ่าย จำนวน 65 รายการ

- ❖ อุดรธานี 24 รายการ (รพท. 2 รายการ, สสจ. 22 รายการ)
- ❖ สกลนคร 18 รายการ (รพศ. 3 รายการ, รพท. 4 รายการ, สสจ. 11 รายการ)
- ❖ นครพนม 2 รายการ (รพท. 2 รายการ)
- ❖ เลย 8 รายการ (สสจ. 8 รายการ)
- ❖ หนองคาย 3 รายการ (รพท. 3 รายการ)
- ❖ หนองบัวลำภู 10 รายการ (รพท. 5 รายการ สสจ. 5 รายการ)

เขต 8 มีรายการงบประมาณ รอลงนามสัญญา

- ❑ อาคารพักคนไข้ 10 ชั้น วงเงิน 150,000,000 บาท รพ.สกลนคร วันที่ 5 พ.ค.65 ส่งป.เห็นชอบความเหมาะสมของราคาก่อสร้างแล้ว อยู่ระหว่าง เสนอ รมว.ขยายระยะเวลาก่อสร้าง จากปี 2565-2567 เป็น 2565-2568

ขอให้เร่งรัดการดำเนินงาน

- ❑ ทุกจังหวัด คืนเงินเหลือจ่ายของรายการปีเดียว
- ❑ เร่งเบิกจ่ายงบลงทุนกันเหลือมปี 2564
- ❑ เร่งเบิกจ่ายงบเงินกู้ COVID-19 ตาม พ.ร.ก.เงินกู้ พ.ศ.2564 (ภายใน 30 ก.ย.65)

รายการงบบักเบิกเหลือมปี 2564

ลำดับ	รายการ	ประเภทงบลงทุน	จังหวัด	ยอดกักเงิน 64 (GFMS 1 ตค 64)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่ายแล้ว (งวดงาน)	คาดว่าจะเบิกใน มิ.ย.65 (งวดงาน)
1	อาคารตึกผ่าตัด 2 ชั้น 4 ห้อง เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,248 ตารางเมตร โรงพยาบาลศรีบุญเรือง ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 หลัง	ก่อสร้างปีเดียว	หนองบัวลำภู	19,128,163.97		16,672,723.97	2/8	3/8
2	ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ 2 หลัง ที่ชำรุด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโสกน้ำขาว ตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ	ก่อสร้างปีเดียว	อุดรธานี	620,341.00		352,468.00	2/4	3/4 , 4/4
3	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร โรงพยาบาลเชียงคาน ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 1 หลัง	ก่อสร้างปีเดียว	เลย	1,180,000.00		998,280.00	1/5	3/5
4	อาคารไต่เตี้ยม และกายภาพบำบัด โรงพยาบาลวังสะพุง ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 1 หลัง	ก่อสร้างปีเดียว	เลย	13,226,314.96	2,930,187.28	2,833,054.00	6/8	8/8
5	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหิน ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย 1 หลัง	ก่อสร้างปีเดียว	เลย	1,180,000.00		1,180,000.00	1/5	2/5
6	อาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 369 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังไฮ ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 1 หลัง	ก่อสร้างปีเดียว	หนองคาย	2,027,547.15		1,481,796.29	3/5	4/5 , 5/5

รายการงบบักเบิกเหลือมปี 2564

ลำดับ	รายการ	ประเภทงบลงทุน	จังหวัด	ยอดกักเงิน 64 (GFMS 1 ตค 64)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่ายแล้ว (งวดงาน)	คาดว่าจะเบิกใน มิ.ย.65 (งวดงาน)
7	บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกคอน ตำบล โคกคอน อำเภอนาคู จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง	ก่อสร้างปีเดียว	นครราชสีมา	798,940.00		464,500.00	3/5	4/5 , 5/5
8	บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียงคุก ตำบล เวียงคุก อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 หลัง	ก่อสร้างปีเดียว	หนองคาย	773,914.00		449,950.00	3/5	4/5 , 5/5
9	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเฝ้าไร่ ตำบลเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 1 หลัง	ก่อสร้างปีเดียว	หนองคาย	1,045,656.00		524,064.00	3/5	4/5 , 5/5
10	อาคารสนับสนุนบริการ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 4,714 ตารางเมตร โรงพยาบาลหนองคาย ตำบลใน เมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 หลัง	ก่อสร้างผูกพัน	หนองคาย	14,848,900.00	4,239,800.00	9,155,500.00	-	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ
11	อาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 369 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตาลหนองเทา ตำบลหนองเทา อำเภอนาหว้า จังหวัด นครพนม 1 หลัง	ก่อสร้างปีเดียว	นครพนม	3,225,495.00	570,913.00	2,654,582.00	งวด 1	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการส่งงาน งวดที่ 2 วันที่ 27 พ.ค.65 คาดว่าจะดำเนินการ เสร็จภายในเดือน ส.ค.65

รายการงบบักเบิกเหลือมปี 2564

ลำดับ	รายการ	ประเภทงบลงทุน	จังหวัด	ยอดกักเงิน 64 (GFMS 1 ตค 64)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่ายแล้ว (งวดงาน)	คาดว่าจะเบิกใน มิ.ย.65 (งวดงาน)
12	อาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 369 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหาดกวน ตำบลไชยบุรี อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครพนม 1 หลัง	ก่อสร้างปีเดียว	นครพนม	3,341,800.00	513,315.00	1,393,728.00	งวด 3	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ เบิกถึง งวดที่ 3 อยู่ระหว่างการดำเนินการ และจะส่งงานงวดที่ 4 วันที่ 27 พ.ค.65 คาดว่าจะดำเนินการแล้วงวดสุดท้ายภายในเดือน ส.ค. 2565
13	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,124 ตารางเมตร โรงพยาบาลศรีสงคราม ตำบลศรีสงคราม อำเภอสว่างนครพนม จังหวัดนครพนม 1 หลัง	ก่อสร้างผูกพัน	นครพนม	23,988,100.00		8,544,100.00	งวด 2	อยู่ระหว่างการดำเนินการในงวดงานที่ 3 และ 4 คาดว่าจะดำเนินการส่งงวดงาน ภายในเดือน
14	อาคารรักษาโรคระดับสูง-ศูนย์หัวใจ-ศูนย์มะเร็งผ่าตัดและวินิจฉัยโรค เป็นอาคาร คสล. 11 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 23,173 ตารางเมตร โรงพยาบาลนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 หลัง	ก่อสร้างผูกพัน	นครพนม	83,380,000.00		37,900,000.00	22/23	23/23
15	บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยก้านเหลือง ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 1 หลัง	ก่อสร้างปีเดียว	บึงกาฬ	877,200.00		877,200.00	2/5	3/5 , 4/5

รายการงบบักเบิกเหลือมปี 2564

ลำดับ	รายการ	ประเภทงบลงทุน	จังหวัด	ยอดกั้นเงิน 64 (GFMS 1 ตค 64)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่ายแล้ว (งวดงาน)	คาดว่าจะเบิกใน มิ.ย.65 (งวดงาน)
16	บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกก่อง ตำบล โคกก่อง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 หลัง	ก่อสร้างปีเดียว	บึงกาฬ	878,060.00		878,060.00	1/5	2/5 , 3/5
17	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร โรงพยาบาลศรีวิไล ตำบลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 1 หลัง	ก่อสร้างปีเดียว	บึงกาฬ	608,864.00		608,864.00	2/5	3/5 , 4/5
18	อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 23,765 ตารางเมตรโรงพยาบาลบึง กาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 หลัง	ก่อสร้างผูกพัน	บึงกาฬ	21,133,800.00		21,133,800.00	คาดว่าจะยกเลิกสัญญา	-
19	อาคารตึกผ่าตัด 2 ชั้น 4 ห้อง เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 1,248 ตารางเมตร โรงพยาบาลวานรนิวาส ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 1 หลัง	ก่อสร้างปีเดียว	สกลนคร	20,889,000.00		20,889,000.00	-	เบิกเสร็จภายใน ก.ย.65
