



# ความก้าวหน้า

# การบริหารงบประมาณ

## สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนภูมิภาค

นายแพทย์กรฤช ลิ้มสมมุติ

ผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข

28 มิถุนายน 2565

# กรอบการนำเสนอ

1. งบประมาณก้อนเหลืองปี 2564
2. ผลการบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565
3. แนวทางการโอนเปลี่ยนแปลง
4. ผลการดำเนินงานงบประมาณ งบเงินกู้ COVID-19 (โครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการฯ)
5. ผลการดำเนินงานงบเงินกู้ COVID-19 ตามพ.ร.ก. เงินกู้ พ.ศ. 2564 (โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขยายการรองรับการดูแลผู้ป่วย COVID-19 ที่มีอาการจนถึงระยะวิกฤติ)
6. Timeline งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 - 2567





# ภาพรวมงบประมาณก้อนเลื่อนปี 2564

## 6 เดือนแรก (ณ 1 ต.ค. 64)

สถานการณ์เงินเลื่อนปี 2564 (6 เดือนแรก ณ 1 ต.ค. 64)

- เงินขยายเวลาไว้เบิกเลื่อนปี 3,627,027,531.49 บาท
- เบิกจ่าย 1,706,394,319.17 บาท (ร้อยละ 47.05)
- คงเหลือรายการที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ **1,919,762,073.73 บาท**
  - คงเหลือเหลือจ่าย 871,138.59 บาท

## 6 เดือนหลัง (ณ 1 เม.ย. 65)

สถานการณ์เงินเลื่อนปี 2564 (6 เดือนหลัง ณ 1 เม.ย. 65)

- เงินขยายเวลาไว้เบิกเลื่อนปี 1,906,886,465.30 บาท
- เบิกจ่าย 402,908,638.68 บาท (ร้อยละ 21.13)
- คงเหลือรายการที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ **1,503,922,524.06 บาท**
  - คงเหลือเหลือจ่าย 55,302.56 บาท



	รายการ	รวมยอดคงเหลือ
<b>ผลรวม</b>	<b>194</b>	<b>1,503,922,524.06</b>
ครุภัณฑ์	1	685,000.00
ก่อสร้างปีเดียว	135	621,467,939.22
ก่อสร้างผูกพัน	58	881,769,584.84



# งบลงทุนกันเหลื่อมปี 2564 รายการครุภัณฑ์ ที่มีวงเงินคงเหลือ

กองบริหารการสาธารณสุข (กบรส.)

ข้อมูลการเบิกจ่ายจาก GFMS ณ 1 มิถุนายน 2565

จำนวน 1 หน่วย วงเงิน 685,000 บาท

เขต	รายการ	สถานที่	วงเงินกันเหลื่อมปีสุทธิ รอบ 6 เดือนหลัง	สาเหตุความล่าช้า
10	คอมพิวเตอร์ตัดใหญ่คอมพิวเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์	รพ.คำชะอี จ.มุกดาหาร	685,000	ลงนามสัญญาแล้ว แต่ยังไม่ส่งมอบของ จึงขอยกเลิกสัญญาและดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างใหม่



# งบลงทุนกันเห็ลือมปี 2564 ที่มีวงเงินคงเห็ลือ จำแนกรายเขต

กองบริหารการสาธารณสุข (กบรส.)

ข้อมูลการเบิกจ่ายจาก GFMS ณ 1 มิถุนายน 2565

เขต	วงเงินกันเห็ลือมปี ณ 1 เม.ย. 65 (บาท)	ผลเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย	วงเงินคงเห็ลือ (ทั้งสิ้น-เห็ลือจ่าย) (บาท)
รวม	1,906,886,465.30	402,908,638.68	21.13	1,503,922,524.06
1	64,260,291.88	20,514,273.63	31.92	43,746,018.25
2	171,844,284.53	37,764,897.00	21.98	134,079,387.53
3	200,822,370.00	46,804,821.23	23.31	<u>154,017,548.77</u>
4	175,456,660.25	18,315,598.38	10.44	<u>157,141,061.87</u>
5	54,720,503.25	5,089,603.25	9.30	49,630,900.00
6	434,478,959.20	78,122,674.00	17.98	<u>356,356,285.20</u>
7	117,379,014.46	47,263,611.20	40.27	70,115,403.26
8	148,970,937.57	22,368,371.28	15.02	126,602,566.29
9	158,865,163.56	35,713,638.00	22.48	123,096,226.00
10	87,889,322.91	35,744,903.50	40.67	52,144,419.41
11	161,065,420.94	30,513,762.21	18.94	130,551,655.73
12	131,133,536.75	24,692,485.00	18.83	106,441,051.75

3  
2  
1



# งบลงทุนกันเห็ลือมปี 2564 ที่คาคาคว่าจะถูกพับ ณ 30 ก.ย. 65

กองบริหารการสาธารณสุข (กบรส.)

ข้อมูลการเบิกจ่ายจาก GFMS ณ 1 มิถุนายน 2565

ประเภทงบลงทุน	รวมยอดคงเห็ลือ		แนวทางการบริหารงบกันเห็ลือมปี 2564		
			วงเงินที่คาคาคว่าจะเบิกจ่าย ทัน ก.ย. 2565	คาคาคว่าจะเบิกจ่ายไม่ทัน 244,835,104.76 บาท แนวทางการบริหารวงเงินที่คาคาคว่าจะถูกพับ	
	รายการ	วงเงินคงเห็ลือ		วงเงิน (บาท)	เงินนอกงบประมาณ (บำรุง/บริจาค)
				วงเงิน (บาท)	วงเงิน (บาท)
ผลรวม	194	1,503,922,524.06	1,259,087,419.30	77,055,808.12	167,779,296.64
ครุภัณฑ์	1	685,000.00	685,000.00	-	
ก่อสร้างปีเดียว	135	621,467,939.22	567,263,730.22	54,204,209.00	
ก่อสร้างผูกพัน	58	881,769,584.84	691,138,689.08	22,851,599.12	167,779,296.64



# การบริหารงบประมาณลงทุนกันเหลื่อมปี 2564 ที่คาดว่าจะถูกพับ ณ 30 ก.ย. 65 [จำแนกรายเขต](#)

กองบริหารการสาธารณสุข (กบรส.)

ข้อมูลการเบิกจ่ายจาก GFMS ณ 1 มิถุนายน 2565

เขต	รวมยอดคงเหลือ		แนวทางการบริหารงบกันเหลื่อมปี 2564		
			วงเงินที่คาดว่าจะเบิกจ่าย ทัน ก.ย. 2565	แนวทางการบริหารวงเงินที่คาดว่าจะถูกพับ	
				เงินนอกงบประมาณ (บำรุง/บริจาค)	ตั้งงบประมาณปี 2567 (ผูกพันฯ)
รายการ	วงเงิน (บาท)	วงเงิน (บาท)	วงเงิน (บาท)	วงเงิน (บาท)	
<b>ผลรวม</b>	<b>194</b>	<b>1,503,922,524.06</b>	<b>1,259,087,419.30</b>	<b>77,055,808.12</b>	<b>167,779,296.64</b>
1	9	43,746,018.25	43,746,018.25	-	-
2	16	134,079,387.53	117,034,823.53	11,998,944.00	5,045,620.00
3	17	154,017,548.77	136,197,048.77	-	17,820,500.00
4	25	157,141,061.87	127,095,261.87	-	30,045,800.00
5	3	49,630,900.00	45,580,200.00	4,050,700.00	-
6	21	356,356,285.20	273,100,693.56	29,513,468.00	53,742,123.64
7	18	70,115,403.26	66,751,030.04	3,364,373.22	-
8	18	126,602,566.29	88,966,156.29	16,502,610.00	21,133,800.00
9	18	123,096,226.00	111,474,226.00	-	11,622,000.00
10	18	52,144,419.41	48,702,053.51	3,442,365.90	-
11	13	130,551,655.73	100,243,562.73	1,938,640.00	28,369,453.00
12	18	106,441,051.75	100,196,344.75	6,244,707.00	-




# ผลการบริหารงบประมาณ ปี 2565

ข้อมูลจากกองบริหารการคลัง  
วันที่ 22 มิถุนายน 2565  
ไม่รวมส่วนกลาง และสบพช.

## ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค สป.สธ.

วงเงินงบประมาณสุทธิ 11,707.71 ลบ.

- การใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่าย+PO) 10,959.50 ลบ. (93.67 %)
  - ☐ เบิกจ่าย 5,293.12 ลบ. (45.24 %)
  - ☐ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) 5,666.38 ลบ. (48.43 %)
- คงเหลือ 741.21 ลบ. (6.33 %)

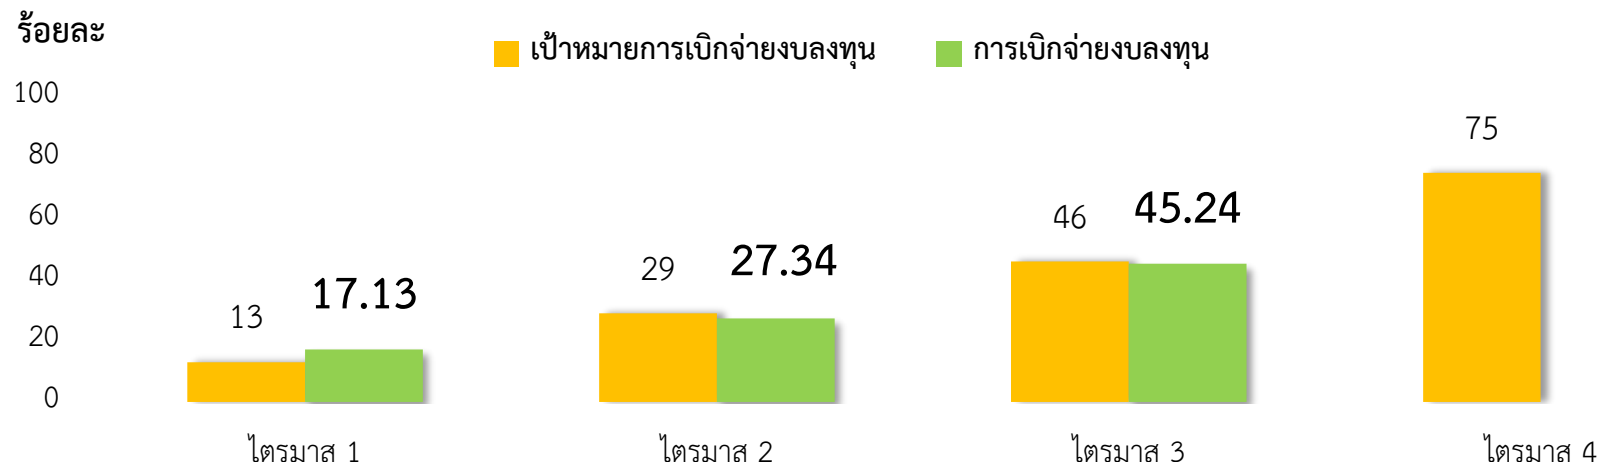



# ผลการบริหารงบประมาณ ปี 2565

กองบริหารการสาธารณสุข (กบรส.)

ข้อมูลจากกองบริหารการคลัง

วันที่ 22 มิถุนายน 2565

ไม่รวมส่วนกลาง และสบพช.

## ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2565 ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค สป.สธ. จำแนกรายเขต


เขต	งบลงทุนสุทธิ	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)	ร้อยละ	เบิกจ่ายสะสม	ร้อยละ	PO+เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบคงเหลือ	ร้อยละ
รวม	11,700.71	5,666.38	48.43	5,293.12	45.24	10,959.50	93.67	<u>741.21</u>	6.33
1	727.32	375.19	51.59	292.23	40.18	667.42	91.76	59.90	8.24
2	851.01	311.51	36.60	517.80	<u>60.85</u>	829.31	97.45	21.70	2.55
3	905.11	464.85	51.36	433.13	47.85	897.99	99.21	7.12	0.79
4	714.81	477.91	66.86	210.70	29.48	688.61	96.34	26.19	3.66
5	1,349.50	397.22	29.43	798.58	<u>59.18</u>	1,195.80	88.61	153.70	11.39
6	1,140.21	631.67	55.40	491.58	43.11	1,123.25	98.51	16.96	1.49
7	684.34	286.17	41.82	398.17	58.18	684.34	100.00	0.00	0.00
8	1,077.97	693.47	64.33	331.71	30.77	1,025.19	95.10	52.78	4.90
9	1,237.24	519.68	42.00	634.49	51.28	1,154.16	93.29	83.08	6.71
10	713.41	270.54	37.92	442.21	<u>61.99</u>	712.75	99.91	0.65	0.09
11	1,000.44	462.74	46.25	407.69	40.75	870.43	87.01	130.01	12.99
12	1,299.35	775.41	59.68	334.83	25.77	1,110.24	85.45	189.11	14.55



# นโยบายการบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565

## ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค สป.สร.

กองบริหารการสาธารณสุข (กบรส.)

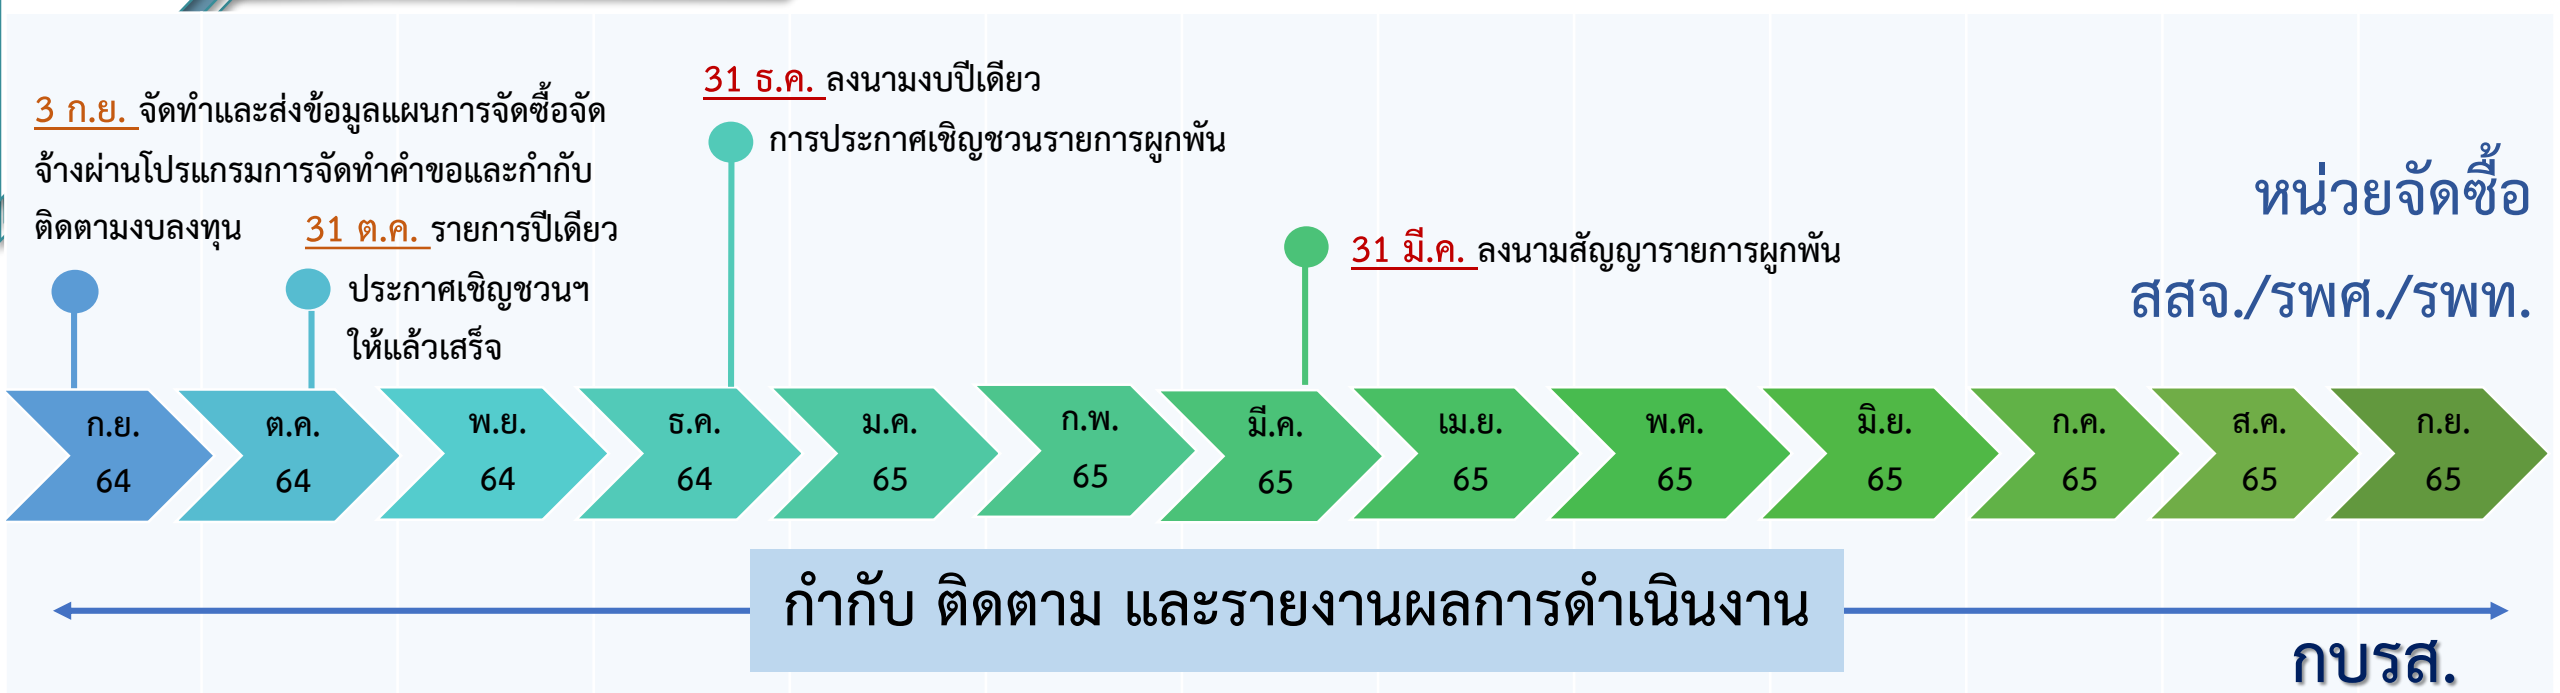

**พ.ย.** ทบทวนรายการที่ยังไม่ประกาศฯ และพิจารณาคืบงบหนังสือ กบรส. 0207.05.3/24799 ลว. 4พ.ย.64 เรื่อง ขอให้ชี้แจงเหตุผล ฯ

**ม.ค.** ติดตามการลงนามรายการปีเดียว และพิจารณาคืบงบ

**เม.ย.** ติดตามการลงนามและบริหารสัญญา

**มี.ค.** รวบรวมคำขอของบเหลือจ่าย รอบที่ 1 และโอนเปลี่ยนแปลง

**มี.ย.** รวบรวมคำขอของบเหลือจ่าย รอบที่ 2 และสิ้นสุดการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบผูกพัน 30 มิ.ย.65



# ผลการดำเนินงานงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565

กองบริหารการสาธารณสุข (กบรส.)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2565

เขตสุขภาพ	รวม จัดสรร (หน่วย)	ผลการดำเนินงาน (หน่วย)										
		จำนวน ที่ดำเนินการ	ก่อนประกาศ		ประกาศ		รอลงนาม		ลงนาม		คืบงบประมาณ	
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
รวม	4,578	4,559	3	0.07	3	0.07	7	0.15	4,547	99.74	19	0.42
ครุภัณฑ์	4,257	4,246	-	-	-	-	-	-	4,246	100.00	11	0.26
ก่อสร้างปีเดียว	298	290	1	0.34	-	-	1	0.34	288	99.31	8	2.68
ก่อสร้างผูกพันใหม่	23	23	2	8.70	2	8.70	6	26.09	13	56.52	-	-



# ผลการดำเนินงานงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565

กองบริหารการสาธารณสุข (กบรส.)

## จำแนกรายเขต

ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2565

เขตสุขภาพ	จำนวน (หน่วย)	ผลการจัดซื้อจัดจ้าง							
		ประกาศ				ลงนาม			
เขตสุขภาพ	จำนวน (หน่วย)	16 มิ.ย. 65		23 มิ.ย. 65		16 มิ.ย. 65		23 มิ.ย. 65	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
รวม	4,559	11	0.24	9	0.20	4,545	99.69	4,547	99.74
1	54	-	-	-	-	53	96.36	53	96.36
2	380	1	0.26	1	0.26	379	99.74	379	99.74
3	422	-	-	-	-	422	100.00	422	100.00
4	236	2	0.85	2	0.85	234	99.15	234	99.15
5	149	1	0.67	1	0.67	148	99.33	148	99.33
6	266	-	-	-	-	266	100.00	266	100.00
7	912	-	-	-	-	912	100.00	912	100.00
8	279	1	0.36	1	0.36	278	99.64	278	99.64
9	864	2	0.23	1	0.12	862	99.77	863	99.88
10	644	-	-	-	-	644	100.00	644	100.00
11	157	1	0.64	1	0.64	156	99.36	156	99.36

รายการที่คืนงบประมาณได้นำออกแล้ว



# รายการปีเดียวที่ลงนามสัญญาแล้ว ยังไม่คืนเงินเหลือจ่าย

กองบริหารการสาธารณสุข (กบรส.)

ข้อมูลจากกองบริหารการคลัง  
วันที่ 15 มิถุนายน 2565

ไม่รวมส่วนกลาง และสบพช.

เขต	จำนวน (รายการ)	เงินคงเหลือ (บาท)
ผลรวมทั้งหมด	190	15,108,259.94
1	10	89,400.00
2	24	1,101,891.65
3	27	1,769,879.00
4	26	1,131,758.00
5	16	52,420.00
6	11	86,480.29
7	-	-
8	37	6,889,231.00
9	-	-
10	11	249,000.00
11	19	826,200.00
12	9	2,912,000.00



# ผลการดำเนินงานงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 (ก่อสร้างปีเดียว)

กองบริหารการสาธารณสุข (กบรส.)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2565

## ก่อสร้างปีเดียว 2 หน่วย

เขต	รายการ	วงเงิน (บาท)	สถานที่	เหตุผลที่ล่าช้าจากแผน
1	อาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้น	37,771,100	รพ.ลอง จ.แพร่	ดำเนินการใหม่ครั้งที่ 2 เนื่องจากครั้งที่ 1 มีการคิ่งบประมาณและสงป. ให้ดำเนินการจนสิ้นสุดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ปัจจุบันได้ราคากลางแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติประกาศประกวดราคา
11	ระบบบำบัดน้ำเสีย 300 ลูกบาศก์เมตร/วัน	24,842,200	รพ.ท่าโรงช้าง จ.สุราษฎร์ธานี	เกิดความคลาดเคลื่อนในการกำหนดขอบเขตของงานจ้าง (TOR) จึงยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 1 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 2 ด้วยวิธี E-bidding 16 มิ.ย. 65 ประกาศผลผู้ชนะในระบบ e-GP ปัจจุบันอยู่ระหว่างเว้นระยะอุทธรณ์ถึงวันที่ 27 มิ.ย. 65



# ผลการดำเนินงานงบประมาณ 2565

กองบริหารการสาธารณสุข (กบรส.)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2565

## ก่อสร้างผูกพัน 10 หน่วย

เขต	รายการ	วงเงิน (บาท)	สถานที่	การดำเนินงาน
1	อาคารผู้ป่วยนอก พร้อมอาคาร ห้องเครื่องระบบไปป์ไลน์	60,619,000	รพ.แม่ลาว จ.เชียงราย	1. เปลี่ยนจากวิธี e-bidding เป็นวิธีคัดเลือก ผวจ.ให้ดำเนินการตาม ว 845 2. ว78 ให้ยกเลิก ว 845 ผวจ. จึงให้ยุติการเปลี่ยนวิธี และให้กลับมาใช้ วิธี e-bidding เพื่อเสนอขอความเห็นชอบราคากลางไปยัง สงป. 9 พ.ค. 65 ผวจ.ลงนาม ยกเลิกการประกวดราคา <b>ปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอ ผวจ.อนุมัติราคากลาง</b>
2	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 3 ชั้น	82,903,400	รพ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์	12 เม.ย.65 สงป. ให้ตรวจสอบและยืนยันการดำเนินการหากได้รับการอนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อรายการ และ วงเงิน ว่าสามารถดำเนินการต่อไปได้ตามระเบียบพัสดุฯ (ขอตัดถ้อยคำ “โครงสร้างด้านแผ่นไหว” ออก) แจ้ง จังหวัดชี้แจงตรวจสอบและยืนยันการดำเนินการ ตามระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
4	อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อ่างทอง	46,855,700	สสจ.อ่างทอง	ได้ผู้รับจ้างแล้ว บริษัท ซูไลท์ เอนจิเนียริง จำกัด วงเงิน 45,840,000 บาท <b>ปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอรมว.อนุมัติ เพื่อขอขยายระยะเวลาก่อนผูกพัน จากปี 65-66 เป็น 65-67</b>
4	อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 3 ชั้น	70,400,900	รพ. วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง	ได้ผู้รับจ้างแล้ว บริษัท ซูไลท์ เอนจิเนียริง จำกัด วงเงิน 59,800,000 บาท <b>ปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอรมว.อนุมัติ เพื่อขอขยายระยะเวลาก่อนผูกพัน จากปี 65-66 เป็น 65-67</b>



# ผลการดำเนินงานงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565

กองบริหารการสาธารณสุข (กบรส.)

ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2565

เขต	รายการ	วงเงิน (บาท)	สถานที่	หมายเหตุ
5	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น	69,527,500	รพ.ราชบุรี	27 เม.ย. 65 รมต.ขยายระยะเวลาก่อสร้าง ปัจจุบัน อยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างมาลงนามสัญญา <b>คาดว่าจะลงนามได้ 30 มิ.ย. 65</b>
8	อาคารพักคนไข้ 10 ชั้น	150,141,800	รพ.สกลนคร	5 พ.ค. 65 สงป.เห็นชอบความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างแล้ว 1 มิ.ย. 65 รมว. อนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้าง จาก ปี 2565-2567 เป็น 2565 - 2568 แล้ว <b>ปัจจุบันเรียก ผรจ.มาลงนามสัญญา คาดว่าจะลงนามสัญญาได้ภายใน มิ.ย. 65</b>
9	อาคารผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใน 300 เตียง 8 ชั้น	406,120,300	รพ.สุรินทร์	22 เม.ย. 65 สงป.คืนเรื่องและให้ตรวจสอบและทบทวนเอกสารประกอบการพิจารณา พื้นที่ใช้สอยไม่ตรง ตาม พรบ.จาก 12,840 ตรม. เป็น 13,087 ตรม. ปัจจุบัน จังหวัด ประชุม.คกก.แล้วกำลังดำเนินการยกเลิกการจัดจ้างครั้งที่ 1 และจะดำเนินการจัดจ้างใหม่เพื่อให้ถูกต้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560



# ผลการดำเนินงานงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565

กองบริหารการสาธารณสุข (กบรส.)

ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2565

เขต	รายการ	วงเงิน (บาท)	สถานที่	หมายเหตุ
12	อาคารผ่าตัด ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 7 ชั้น	153,846,400	รพ.ปัตตานี	เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ (แบบเดิมไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน) <b>แก้ไขแบบเสร็จแล้ว</b> อยู่ระหว่างกองแบบแผนจัดส่งแบบแปลน BOQ ให้กองบริหารการสาธารณสุข (วงเงินที่เพิ่มขึ้น 207,017,500 บาท รวมทั้งสิ้น <b>360,863,900</b> บาท) ได้ราคากลางจังหวัดและพวจ.ลงนามแล้ว <b>ปัจจุบันอยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ ไปยังสงป.</b>
12	อาคารบำบัดรักษา 6 ชั้น	268,147,000	รพ.สตูล	20 พ.ค. 65 รมต.อนุมัติขยายระยะเวลา จาก 2565-2567 เป็น 2565-2568 เว้นระยะอุทธรณ์ <b>ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำเอกสารและเรียกผู้รับจ้างมาลงนามสัญญา คาดว่าจะลงนามสัญญาภายใน มิ.ย. 65</b>
12	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 9 ชั้น	499,088,600	รพ.สงขลา	7 ก.พ. 65 ขอความเห็นชอบราคากลางไป สงป. และได้ผู้รับจ้างแล้ว 21 มี.ค. 65 เสนอราคา วงเงิน 426,900,000 บาท (กิจการร่วมค้า เอ เค ซี) 17 พ.ค. 65 รายงานผลการจัดจ้างไปยัง สงป. สงป.เห็นชอบวงเงินค่าก่อสร้าง 426,900,000 บาท และขยายระยะเวลาก่อสร้าง <b>ปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอรมว.อนุมัติ เพื่อขอขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพัน จากปี 65-67 เป็น 65-68</b>



# การโอนเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้างผูกพันเดิม (งานช้า-งานเร็ว) รายละเอียด

กองบริหารการสาธารณสุข (กบรส.)

ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2565

เขต	รายการที่ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ทั้งสิ้น)		รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ									
			รายการที่ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ. 2565		งบประมาณ ปี 2565 ที่คาดว่าจะเบิกทัน ก.ย.65		งบประมาณ ปี 2565 ที่คาดว่าจะเบิกไม่ทัน ก.ย.65		งบประมาณ ปี 2565 ที่คาดการณ์ว่าให้ยืมได้		งบประมาณ ปี 2565 ที่ขอยืม	
	จำนวน (หน่วย)	วงเงิน (บาท)	จำนวน (หน่วย)	วงเงิน (บาท)	จำนวน (หน่วย)	วงเงิน (บาท)	จำนวน (หน่วย)	วงเงิน (บาท)	จำนวน (หน่วย)	วงเงิน (บาท)	จำนวน (หน่วย)	วงเงิน (บาท)
รวม	144	8,200,001,800	121	6,987,159,850.00	88	3,692,800,345.06	33	3,294,359,504.94	48	1,866,447,580.59	2	62,584,450.00
1	12	539,948,200	12	539,948,200.00	12	328,961,701.02	-	210,986,498.98	2	55,250,392.58		
2	7	521,650,000	5	283,818,450.00	3	119,085,130.00	2	164,733,320.00	4	143,333,970.00		
3	9	605,362,300	8	621,673,100.00	5	279,812,930.00	3	341,860,170.00	5	125,199,690.00		
4	11	531,557,100	10	505,624,100.00	2	157,084,440.74	8	348,539,659.26	5	175,528,800.00		
5	16	1,148,496,400	13	1,120,072,900.00	10	776,224,528.15	3	343,848,371.85	4	228,826,462.00	1	50,292,000.00
6	18	741,850,900	16	609,731,500.00	11	304,975,238.00	5	304,756,262.00	8	262,438,847.00	1	12,292,450.00
7	10	408,573,400	9	374,576,900.00	7	225,495,760.00	2	149,081,140.00	5	105,084,620.00		
8	8	772,742,900	6	688,500,900.00	5	321,531,360.77	1	366,969,539.23	4	305,414,446.96		
9	13	715,816,400	9	423,798,600.00	6	248,776,635.90	3	175,021,964.10	6	160,194,728.10		
10	9	473,336,100	8	295,479,200.00	6	161,705,400.00	2	133,773,800.00				
11	20	803,158,000	15	607,514,700.00	11	280,211,690.39	4	327,303,009.61	3	137,155,423.95		
12	11	937,510,100	10	916,421,300.00	10	488,935,530.09	-	427,485,769.91	2	168,020,200.00		



# ผลการดำเนินงานงบเงินกู้ COVID-19 (รอบที่ 1 และ 2)

กองบริหารการสาธารณสุข (กบรส.)

## โครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการฯ หน่วยงานส่วนภูมิภาค สป.สธ. (A001)

คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เห็นชอบให้ **ขยายระยะเวลาและการเบิกจ่าย** ให้แล้วเสร็จภายใน **เดือนมิถุนายน 2565** และเร่งรัดการดำเนินการโครงการดังกล่าวให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาโดยเร็ว (หนังสือ สลค. ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 212 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2565)

รายละเอียดอนุมัติงบประมาณ	ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่าย ณ 24 มิ.ย. 65
โครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการสุขภาพ ครั้งที่ 1 จำนวน 2,512 หน่วย วงเงิน 2,034.9372 ลบ. ครั้งที่ 2 จำนวน 44,144 หน่วย วงเงิน 5,816.3631 ลบ. <u>จำนวนรวมทั้งสิ้น 46,656 หน่วย</u> <u>วงเงินรวมทั้งสิ้น 7,851.3003 ลบ.</u>	<b>ผลการดำเนินงาน</b> - ลงนามสัญญาแล้ว จำนวน 45,571 หน่วย - ค้างบเงินกู้ จำนวน 1,085 หน่วย  <b>ผลการเบิกจ่าย = 7,086.8958 ลบ. (90.26 %)</b> <b>คงเหลือ = 764.4045 ลบ. (9.74 %)</b> - วาง PO = 51.5409 ลบ. - ค้างบ มายัง กบรส. = 485.5608 ลบ. - ค้างเหลือจ่าย มายัง กบรส. = 110.6248 ลบ. - คงเหลือ (ยังไม่แจ้งคืน) = 116.6780 ลบ.



# ผลการดำเนินงานงบประมาณ COVID-19 (รอบที่ 3)

กองบริหารการสาธารณสุข (กบรส.)

โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
เพื่อขยายการรองรับการดูแลผู้ป่วย COVID-19 ที่มีอาการจนถึงระยะวิกฤติ (2-A007)

หน่วยจัดซื้อ สสจ./รพศ./รพท.

ก.พ.65

ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้จนถึงขั้นตอน  
รองลงนามสัญญา ดังนี้

- เตรียมและร่างกำหนด spec
- จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)
- จำทำแผนเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ขั้นตอนการดำเนินงานงบประมาณ COVID-19 ตามพ.ร.ก. เงินกู้ พ.ศ. 2564

29 เม.ย. 65 ลงนามสัญญา

เบิกจ่ายภายในวันที่ 30 ธ.ค. 65

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ  
งบประมาณเพิ่มเติม พ.ศ. 2564

ก.พ.  
65

มี.ค. 65

เม.ย.  
65

พ.ค. 65

มิ.ย. 65

ก.ค.  
65

ส.ค.  
65

ก.ย.  
65

ต.ค.  
65

พ.ย.  
65

ธ.ค.  
65

กำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน

กบรส.

23 ก.พ. 65 แจ้งรายการเบื้องต้น ผ่านเว็บไซต์ กบรส. <https://www.phdb.moph.go.th/main/>

24 ก.พ. 65 แจ้งจัดสรรงบเงินกู้ ไปยังหน่วยงานส่วนภูมิภาค สป.สร.



# ผลการดำเนินงานงบประมาณ COVID-19 (รอบที่ 3)

กองบริหารการสาธารณสุข (กบรส.)

## โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขยายการรองรับการดูแลผู้ป่วย COVID-19 ที่มีอาการจนถึงระยะวิกฤติ (2-A007)

รายละเอียดอนุมัติงบประมาณ	ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่าย ณ 24 มิ.ย. 65
โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการสุขภาพ จำนวนรวมทั้งสิ้น 8,100 หน่วย วงเงินรวมทั้งสิ้น 5,363.0915 ลบ.	<b>ผลการดำเนินงาน</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- ลงนามสัญญาแล้ว จำนวน 6,960 หน่วย</li><li>- รอลงนามสัญญา จำนวน 922 หน่วย</li><li>- ประกาศ จำนวน 106 หน่วย</li><li>- ก่อนประกาศ จำนวน 112 หน่วย</li></ul>
	<b>ผลการเบิกจ่าย = 775.7583 ลบ. (14.46 %)</b> <b>คงเหลือ = 4,587.3332 ลบ. (85.54 %)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- วาง PO = 3,082.1540 ลบ.</li><li>- คืนเหลือจ่าย มายัง กบรส. = 2.2238 ลบ.</li><li>- คงเหลือ (ยังไม่แจ้งคิน) = 1,502.9554 ลบ.</li></ul>



# ผลการดำเนินงานงบประมาณเงินกู้ COVID-19 (รอบที่ 3)

กองบริหารการสาธารณสุข (กบรส.)

ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2565

## ผลการดำเนินงานการอนุมัติงบประมาณเงินกู้ COVID-19 ตามพ.ร.ก. เงินกู้ พ.ศ. 2564 รายเขต

เขต	รวมจัดสรร (หน่วย)	ผลการดำเนินงาน (หน่วย)							
		ก่อนประกาศ		ประกาศ		รอลงนามสัญญา		ลงนามสัญญา	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
รวม	8,100	112	1.38	106	1.31	922	11.38	6,960	85.93
1	567	38	6.70		0.00	30	5.29	499	88.01
2	607		0.00		0.00	43	7.08	564	92.92
3	444		0.00		0.00	60	13.51	384	86.49
4	679	28	4.12	8	1.18	4	0.59	639	94.11
5	663		0.00	20	3.02	71	10.71	572	86.27
6	574	6	1.05	19	3.31	68	11.85	481	83.80
7	903	3	0.33		0.00	52	5.76	848	93.91
8	756	3	0.40	27	3.57	166	21.96	560	74.07
9	1,082	10	0.92		0.00	62	5.73	1010	93.35
10	652	17	2.61	6	0.92	237	36.35	392	60.12
11	558	6	1.08	6	1.08	92	16.49	454	81.36
12	615	1	0.16	20	3.25	37	6.02	557	90.57

11

12

10



# บัญชีรายการครุภัณฑ์การแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฉบับพฤษภาคม 2565

กองบริหารการสาธารณสุข (กบรส.)



## บัญชีรายการครุภัณฑ์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ฉบับพฤษภาคม 2565



### บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กองบริหารการสาธารณสุข โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๗๕๒

ที่ สบ ๐๒๐๗.๐๓.๖/ ๑๐๗๐๗ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งประกาศใช้บัญชีรายการครุภัณฑ์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑ - ๑๒

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเห็นถึงความสำคัญของบัญชีรายการครุภัณฑ์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อวิเคราะห์ ทบทวน รายการและราคาครุภัณฑ์ให้ครอบคลุม ทันสมัย เหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งคณะทำงานมีการประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนบัญชีรายการครุภัณฑ์ดังกล่าว และได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญ service plan ในการให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะที่เป็นปัจจุบัน เหมาะสมทั้งด้านรายละเอียดรายการและราคา บัดนี้ กองบริหารการสาธารณสุขได้ดำเนินการปรับปรุงบัญชีรายการครุภัณฑ์ดังกล่าว ตลอดจนจัดทำรายละเอียดสำคัญเสร็จเรียบร้อยแล้ว

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาแล้ว เพื่อให้หน่วยงานในส่วนภูมิภาคสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีบัญชีรายการครุภัณฑ์ใช้ในการอ้างอิงการจัดทำค่าของประมาณงบลงทุนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรประกาศใช้บัญชีรายการครุภัณฑ์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จากเว็บไซต์กองบริหารการสาธารณสุข www.phdb.moph.go.th ในหัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์หรือ QR code ที่แนบท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

(นายธงชัย กิริสดีคณาพร)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข



shorturl.at/๑JNX6



ที่ สบ ๐๒๐๗.๐๓.๖/ ๑๐๗๐๖

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ถนนวิภาวดีรังสิต จักรวรรดิเหนือ ๑๑๐๐๐

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งประกาศใช้บัญชีรายการครุภัณฑ์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป/ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพ ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีรายการครุภัณฑ์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเห็นถึงความสำคัญของบัญชีรายการครุภัณฑ์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อวิเคราะห์ ทบทวน รายการและราคาครุภัณฑ์ให้ครอบคลุม ทันสมัย เหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งคณะทำงานมีการประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนบัญชีรายการครุภัณฑ์ดังกล่าว และได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญ service plan ในการให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะที่เป็นปัจจุบัน เหมาะสมทั้งด้านรายละเอียดรายการและราคา บัดนี้ กองบริหารการสาธารณสุขได้ดำเนินการปรับปรุงบัญชีรายการครุภัณฑ์ดังกล่าว ตลอดจนจัดทำรายละเอียดสำคัญเสร็จเรียบร้อยแล้ว

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาแล้ว เพื่อให้หน่วยงานในส่วนภูมิภาคสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีบัญชีรายการครุภัณฑ์ใช้ในการอ้างอิงการจัดทำค่าของประมาณงบลงทุนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรประกาศใช้บัญชีรายการครุภัณฑ์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จากเว็บไซต์กองบริหารการสาธารณสุข www.phdb.moph.go.th ในหัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์หรือ QR code ที่แนบท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายธงชัย กิริสดีคณาพร)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข



shorturl.at/๑JNX6

กองบริหารการสาธารณสุข

โทร./โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๑๗๕๒



# Timeline การบริหารจัดการงบลงทุนภูมิภาค ปี 2566 - 2567

## กองบริหารการสาธารณสุข (กบรส.)

ส.ค. : - ปรับปรุงรายละเอียดตามผลการพิจารณาชั้นอนุกรมการฯ  
 - แจ้งรายการเบื้องต้นไปยังหน่วยงาน เพื่อเตรียมจัดซื้อจัดจ้างฯ  
 - แจ้งรายการเบื้องต้นไปยังกองแบบแผน เพื่อจัดทำเอกสาร  
 - ประชุมชี้แจงนโยบายการบริหารงบและแนวทางการจัดทำ  
 ค่าของบปีถัดไป

31 พ.ค. ,1-2 มิ.ย. :  
 ร่วมชี้แจงการพิจารณา  
 ร่าง พรบ. วาระที่ 1

มิ.ย.- ก.ค. : จัดทำเอกสาร  
 ชี้แจง คณะอนุกรมการฯ  
 และเสนอรายการแปรญัตติ

ก.ย. : - แจ้งจัดสรรไปยังหน่วยงานภูมิภาค  
 - แจ้งหน่วยงาน เข้ารับ BOQ ,แบบแปลน  
 - แจ้งกองบริหารการคลัง โอนงบ

5 - 15 ต.ค. : กบรส. รวบรวมและตรวจสอบค่าของบปีถัดไป  
 ภายใน 16 ต.ค. : - รายการก่อสร้าง ให้กองแบบแผน เพื่อจัดทำ BOQ  
 - รายการน้ำเสีย ให้ พส. กบรส. เพื่อพิจารณาความเหมาะสม  
 - รายการ COM ให้ ศูนย์เทค สป. เพื่อพิจารณา

พ.ย. : - แต่งตั้งและประชุม คกก.ระดับ สป.  
 - แจ้ง ผตร. ดำเนินการตามมติ คกก.และยืนยันคำขอ  
 - ประชุมร่วมกับกองแบบแผน เพื่อตรวจสอบรายการ

15 ธ.ค. - 14 ม.ค. : บันทึก templet และ e-budgeting  
 และจัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาไป สงป.  
 14 ม.ค. : ยืนยันรายการและวงเงิน ค่าของบลงทุน ในระบบ  
 e-Budgeting ไปยัง กยผ.

มี.ค. - เม.ย. : ปรับปรุงข้อมูลให้  
 เป็นไปตามผลการพิจารณาของ สงป.

พ.ค.- มิ.ย. : จัดทำ  
 รายละเอียด ร่วมกับ  
 กยผ. เพื่อชี้แจงวาระที่ 1

3 มิ.ย.- 16 ส.ค. :  
 ร่วมชี้แจงอนุกรมการฯ

6 ก.ย. : สลค.นำร่าง พรบ.66 ขึ้น  
 ทูลเกล้าฯ เพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมาย

17-18 ส.ค. :  
 ร่วมชี้แจงพิจารณา  
 ร่าง พรบ.วาระที่ 2-3

15 - 30 ก.ย. : กบรส.บันทึก  
 แผนการปฏิบัติงานและแผนการ  
 ใช้จ่ายในระบบ BB evMIS

พ.ค. : แจ้งร่าง พรบ. 66  
 (ตามที่เผยแพร่หน้าเว็บ สงป.)

กำกับ ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน

กบรส.

พ.ค. 65 มิ.ย. 65 ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 ต.ค. 65 พ.ย. 65 ธ.ค. 65 ม.ค. 66 ก.พ. 66 มี.ค. 66 เม.ย. 66 พ.ค. 66 มิ.ย. 66 ก.ค. 66 ส.ค. 66 ก.ย. 66

ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการดำเนินงาน

หน่วยจัดซื้อ

สสจ./รพศ./รพท.

หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พ.ค. : - หน่วยงานเริ่มเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง  
 รายการตามร่าง พรบ. 66 (ตามที่เผยแพร่หน้า  
 เว็บ สงป.) โดยเฉพาะรายการก่อสร้างสูงกว่า  
 10 ลบ. และรายการครุภัณฑ์ราคาสูงกว่า 1 ลบ.  
 - กองแบบแผน จัดทำแบบแปลน  
 BOQ สำหรับจัดสรรงบลงทุน

ส.ค. : หน่วยงาน เริ่มจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  
 และรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านระบบ กบรส.

1-5 ต.ค. หน่วยงานส่วนภูมิภาค บันทึกค่าของบลงทุน 67  
 ผ่านโปรแกรมพร้อมส่งเอกสารประกอบการพิจารณา

มี.ค. : สงป. พิจารณารายการคำขอและแจ้งรายการเบื้องต้น

15 ก.ย. : กองแบบแผน จัดส่ง BOQ ให้ กบรส.  
 หน่วยงาน เข้ารับแบบแปลนและ BOQ

30 พ.ย. : กองแบบแผน ควบคุมจัดส่ง BOQ ให้ กบรส.

ส.ค. กองแบบแผน จัดส่งข้อมูลบัญชีรายการก่อสร้างเตรียมคำขอปี 67



กองบริหารการสาธารณสุข (กบรส.)

# ข้อพิจารณา

จึงเรียนมา  
เพื่อโปรดทราบ

- 1 แผนการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณผูกพัน ปี 2565
- 2 บัญชีรายการครุภัณฑ์การแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ พฤษภาคม 2565
- 3 Timeline การดำเนินการบริหารงบลงทุน ปี 2566 - 2567



กองบริหารการสาธารณสุข (กบรส.)

# ข้อพิจารณา

จึงเรียนมา  
เพื่อโปรดเร่งรัด

- 1 เบิกจ่าย งบลงทุน ก้นเงินเหลือมปี 2564
- 2 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ปี 2565
- 3 การคืนเงินเหลือจ่าย งบลงทุน ปี 2565
- 4 งบเงินกู้ COVID-19 โครงการ A001 (โครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการฯ)
- 5 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างงบเงินกู้ COVID-19 ตามพ.ร.ก. เงินกู้ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 (โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขยายการรองรับการดูแลผู้ป่วย COVID-19 ที่มีอาการจนถึงระยะวิกฤติ)
- 6 รายงานผลการดำเนินงานผ่านโปรแกรมติดตามงบลงทุน ของ กบรส.



---

# Health Administration Division

กองบริหารการสาธารณสุข

THANK YOU
