



เขตสุขภาพที่ 8


# ร่าง พรบ. งบลงทุน ปังบประมาณ พ.ศ. 2568 และความก้าวหน้าการบริหารงบลงทุนและงบค่าเสื่อม

โดย ประธาน CIO เขตสุขภาพที่ 8

นายแพทย์ปรีดา วรรณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม


# ร่าง พรบ. งบลงทุน ปังบประมาณ พ.ศ. 2568 **เขตสุขภาพที่ 8** วงเงินจัดสรร (รวมผูกพัน) ทั้งสิ้น 1,235,735,400 บาท (ไม่รวมผูกพัน) ทั้งสิ้น 730,327,000 บาท

ครุภัณฑ์ 506,063,300 บาท



- Ceiling เขต (310,468,500 บาท)
- Ceiling SP (179,220,000 บาท)
- Ceiling 30บาทพลัส, กลุ่มจังหวัด (16,374,800 บาท)

สิ่งก่อสร้าง 729,672,100 บาท



- ก่อสร้างปีเดียว+ผูกพันใหม่ (224,263,700 บาท)
- ก่อสร้างผูกพันเดิม (505,408,400 บาท)

# ร่าง พรบ. งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

## รายการก่อสร้างผูกพันใหม่ เขตสุขภาพที่ 8

| ลำดับ | รายการสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                  | ราคาต่อหน่วย<br>(บาท) | วงเงิน ร่างพรบ. 68<br>(บาท) | วงเงิน ร่างพรบ. 69<br>(บาท) | วงเงิน ร่างพรบ. 70<br>(บาท) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1     | <b>อาคารผู้ป่วยนอก</b> เป็นอาคาร คสล.9 ชั้น และ 1 ชั้นใต้ดิน<br>พื้นที่ใช้สอยประมาณ 31,420 ตารางเมตร<br><b>โรงพยาบาลอุดรธานี</b> ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี<br><b>จังหวัดอุดรธานี</b> 1 หลัง                   | 537,170,000.00        | 107,434,000.00              | 214,868,000.00              | 214,868,000.00              |
| 2     | <b>หอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (จำนวน 114 เตียง)</b> เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น<br>พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,797 ตารางเมตร<br><b>โรงพยาบาลพังโคน</b> ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน<br><b>จังหวัดสกลนคร</b> 1 หลัง                             | 108,861,600.00        | 21,772,400.00               | 87,089,200.00               | -                           |
| 3     | <b>อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง</b> เป็นอาคาร คสล.7 ชั้น<br>พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,908 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)<br><b>โรงพยาบาลโพนพิสัย</b> ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย<br><b>จังหวัดหนองคาย</b> 1 หลัง | 75,239,200.00         | 15,047,900.00               | 60,191,300.00               | -                           |
| 4     | <b>อาคารทันตกรรม 8 ยูนิต</b> เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น<br>พื้นที่ใช้สอยประมาณ 766 ตารางเมตร<br><b>โรงพยาบาลสุวรรณคูหา</b> ตำบลสุวรรณคูหา อำเภอสุวรรณคูหา<br><b>จังหวัดหนองบัวลำภู</b> 1 หลัง                             | 25,147,900.00         | 5,029,600.00                | 20,118,300.00               | -                           |
| 5     | <b>อาคารห้องชุดครอบครัว 12 ยูนิต (24 ห้อง)</b> เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น<br>พื้นที่ใช้สอยประมาณ 819 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)<br><b>โรงพยาบาลเซกา</b> ตำบลเซกา อำเภอเซกา <b>จังหวัดบึงกาฬ</b> 1 หลัง           | 15,375,400.00         | 3,075,100.00                | 12,300,300.00               | -                           |

# การบริหารงบประมาณปี 2566 ที่กันเงินเหลื่อมปีไว้ใช้จ่ายในปี 2567

## เขตสุขภาพที่ 8

| ลำดับ | รายการ                                                                               | ประเภท              | เงินกันเหลื่อมปี<br>สุทธิ<br>ณ 2 ต.ค. 66 | เบิกจ่าย      | วงเงินกันเหลื่อม<br>ปี คงเหลือ | งวด<br>งาน | สถานะการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                      | ความเสี่ยง                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1     | ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย<br>และระบบบำบัดน้ำเสีย<br><b>สว.เซกา จ.บึงกาฬ</b>               | ก่อสร้าง<br>ปีเดียว | 8,673,000.00                             | 3,717,000.00  | 4,956,000.00                   | 6/6        | อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่ายงวดที่ 5-6 คาดว่าจะ<br>เบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค. 67                                                                                                                                                                     | เสี่ยงสูง                   |
| 2     | บ้านพักข้าราชการ<br>อำนวยการระดับสูง<br><b>สว.กุมภวาปี จ.อุดรธานี</b>                | ก่อสร้าง<br>ปีเดียว | 2,214,000.00                             | 1,118,025.00  | 1,095,975.00                   | 3/6        | เบิกจ่ายงวดงานที่ 2 แล้ว<br>คาดว่าจะส่งมอบงวดที่ 3 ภายในเดือน ก.ค. 67<br>สาเหตุความล่าช้า ผู้รับจ้างจ้างสภาพคล่องทางการเงิน<br>บอกเลิกสัญญาผู้รับจ้างรายเดิม<br>ได้ผู้รับจ้างรายใหม่เมื่อวันที่ 28 ก.พ 67                                              | เสี่ยงสูง                   |
| 3     | อาคารห้องชุดครอบครัว<br>12 ยูนิต (24 ห้อง)<br><b>สสจ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ</b>             | ก่อสร้าง<br>ปีเดียว | 14,740,500.00                            | 3,242,800.00  | 11,497,700.00                  | 3/8        | เบิกจ่ายงวดงานที่ 2 แล้ว<br>ขณะนี้ผู้รับจ้างดำเนินการงวด 3-4                                                                                                                                                                                           | เสี่ยงสูงและ<br>คาดว่าจะพับ |
| 4     | อาคารพักคนไข้ 10 ชั้น<br><b>สว.สกลนคร จ.สกลนคร</b>                                   | ก่อสร้าง<br>ผูกพัน  | 33,247,160.00                            | 24,660,020.00 | 8,587,140.00                   | 14/21      | คณะกรรมการฯ นัดตรวจรับมอบงานงวดที่ 12 - 14<br>วันที่ 19 ก.ค. 67 คาดว่าเบิกจ่ายได้ก่อน<br>สิ้นเดือน ก.ค. 67 และงบเงินกัน 66 จะเบิกหมด                                                                                                                   | เสี่ยงสูงและ<br>คาดว่าจะพับ |
| 5     | อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก<br>และอุบัติเหตุฉุกเฉิน 7 ชั้น<br><b>สว.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ</b> | ก่อสร้าง<br>ผูกพัน  | 186,325,800.00                           | -             | 186,325,800.00                 | 0/23       | คาดการณ์เบิกจ่ายงวดแรก เดือน ส.ค.-ก.ย. 67<br>เนื่องจากงวดแรกดำเนินการแล้ว 0.5%<br>ประเด็นปัญหา บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างรายเดิม<br>เนื่องจากผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องทางการเงิน ปัจจุบัน<br>ได้ผู้รับจ้างรายใหม่แล้วลงนามสัญญาใหม่แล้ว เมื่อ 22<br>มี.ค. 67 | เสี่ยงสูงและ<br>คาดว่าจะพับ |

# การบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ 2567

## การจัดซื้อจัดจ้าง เขตสุขภาพที่ 8



# ลงนามแล้ว ร้อยละ 90.37

ข้อมูลจากโปรแกรมกบรส. ณ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น.

| เขต 8              | ครุภัณฑ์               |                          |          |              | สิ่งก่อสร้าง           |                          |                              |          |           |              |
|--------------------|------------------------|--------------------------|----------|--------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|----------|-----------|--------------|
|                    | จำนวนรายการ<br>(หน่วย) | ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง |          |              | จำนวนรายการ<br>(หน่วย) | ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง |                              |          |           |              |
|                    |                        | ประกาศ                   | รอลงนาม  | ลงนามในสัญญา |                        | จัดทำแผน<br>(ก่อนประกาศ) | ร่างประกาศ/<br>เผยแพร่ประกาศ | ประกาศ   | รอลงนาม   | ลงนามในสัญญา |
| <b>อุดรธานี</b>    | <b>130</b>             |                          |          | 130          | <b>10</b>              | <b>1</b>                 |                              |          | <b>5</b>  | <b>4</b>     |
| - สสจ.อุดรธานี     | 104                    |                          |          | 104          | 10                     | 1                        |                              |          | 5         | 4            |
| - รพ.อุดรธานี      | 13                     |                          |          | 13           |                        |                          |                              |          |           |              |
| - รพ.กุมภวาปี      | 13                     |                          |          | 13           |                        |                          |                              |          |           |              |
| <b>สกลนคร</b>      | <b>52</b>              | <b>6</b>                 | <b>6</b> | 40           | <b>8</b>               | <b>3</b>                 | <b>1</b>                     |          | <b>2</b>  | <b>2</b>     |
| - สสจ.สกลนคร       | 33                     |                          |          | 33           | 8                      | 3                        | 1                            |          | 2         | 2            |
| - รพ.สกลนคร        | 3                      |                          |          | 3            |                        |                          |                              |          |           |              |
| - รพ.สว่างแดนดิน   | 7                      | 3                        |          | 4            |                        |                          |                              |          |           |              |
| - รพ.วานรนิวาส     | 9                      | 3                        | 6        |              |                        |                          |                              |          |           |              |
| <b>นครพนม</b>      | <b>121</b>             |                          |          | 121          | <b>2</b>               |                          |                              | <b>2</b> |           |              |
| - สสจ.นครพนม       | 108                    |                          |          | 108          | 2                      |                          |                              | 2        |           |              |
| - รพ.นครพนม        | 13                     |                          |          | 13           |                        |                          |                              |          |           |              |
| <b>เลย</b>         | <b>58</b>              |                          | <b>1</b> | 57           | <b>11</b>              | <b>1</b>                 |                              |          | <b>1</b>  | <b>9</b>     |
| - สสจ.เลย          | 49                     |                          | 1        | 48           | 11                     | 1                        |                              |          | 1         | 9            |
| - รพ.เลย           | 9                      |                          |          | 9            |                        |                          |                              |          |           |              |
| <b>หนองคาย</b>     | <b>68</b>              |                          |          | 68           | <b>9</b>               |                          |                              | <b>1</b> | <b>7</b>  | <b>1</b>     |
| - สสจ.หนองคาย      | 16                     |                          |          | 16           | 8                      |                          |                              | 1        | 6         | 1            |
| - รพ.หนองคาย       | 8                      |                          |          | 8            | 1                      |                          |                              |          | 1         |              |
| - รพ.ท่าบ่อ        | 44                     |                          |          | 44           |                        |                          |                              |          |           |              |
| <b>หนองบัวลำภู</b> | <b>28</b>              | <b>2</b>                 |          | 26           | <b>3</b>               |                          | <b>1</b>                     | <b>2</b> |           |              |
| - สสจ.หนองบัวลำภู  | 24                     | 2                        |          | 22           | 2                      |                          | 1                            | 1        |           |              |
| - รพ.หนองบัวลำภู   | 4                      |                          |          | 4            | 1                      |                          |                              | 1        |           |              |
| <b>บึงกาฬ</b>      | <b>29</b>              |                          |          | 29           | <b>11</b>              |                          |                              | <b>1</b> | <b>9</b>  | <b>1</b>     |
| - สสจ.บึงกาฬ       | 28                     |                          |          | 28           | 10                     |                          |                              |          | 9         | 1            |
| - รพ.บึงกาฬ        | 1                      |                          |          | 1            | 1                      |                          |                              | 1        |           |              |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b> | <b>486</b>             | <b>8</b>                 | <b>7</b> | 471          | <b>54</b>              | <b>5</b>                 | <b>2</b>                     | <b>6</b> | <b>24</b> | <b>17</b>    |

# การบริหารงบลงทุน ปีงบประมาณ 2567


## การใช้จ่ายงบลงทุน (PO+เบิกจ่าย) เขตสุขภาพที่ 8

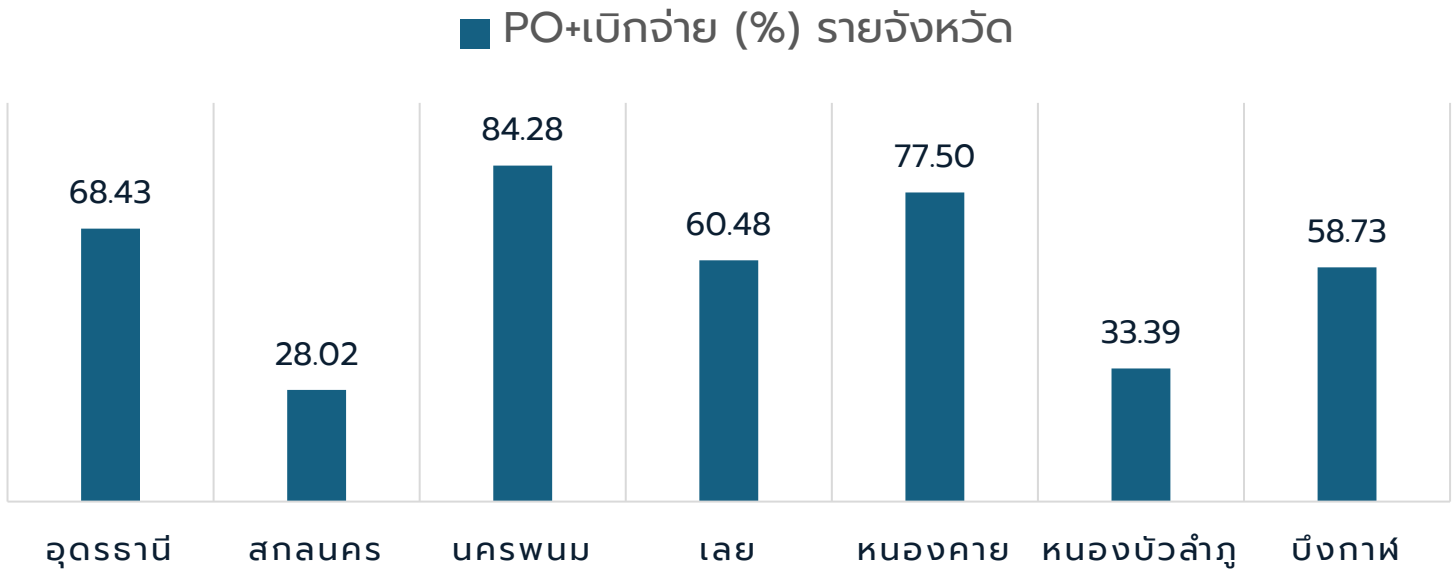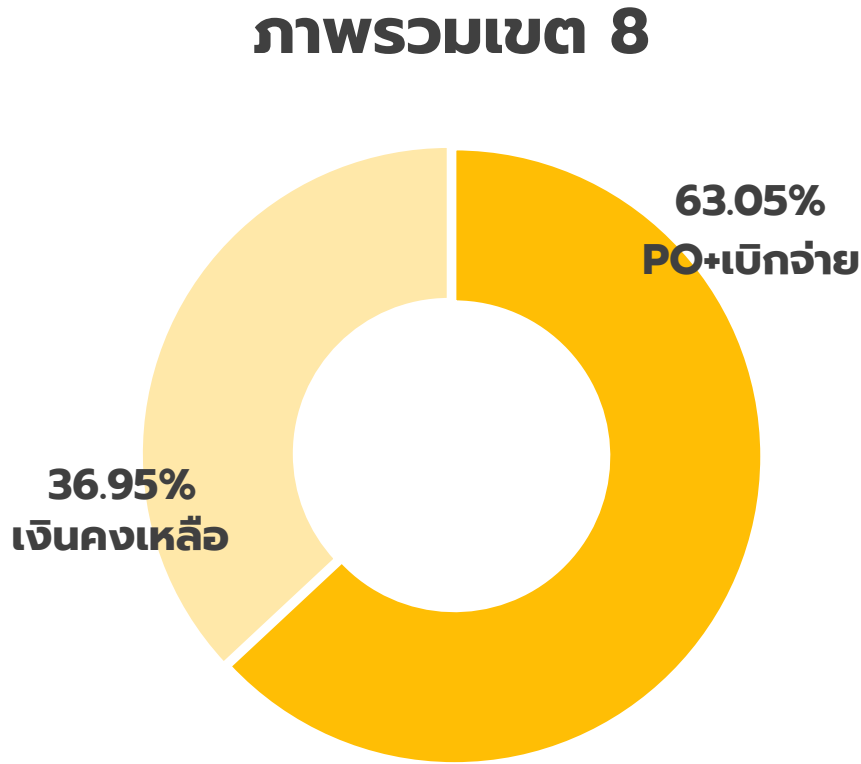




# Timeline การบริหารงบลงทุน ปีงบประมาณ 2567

กบรส.

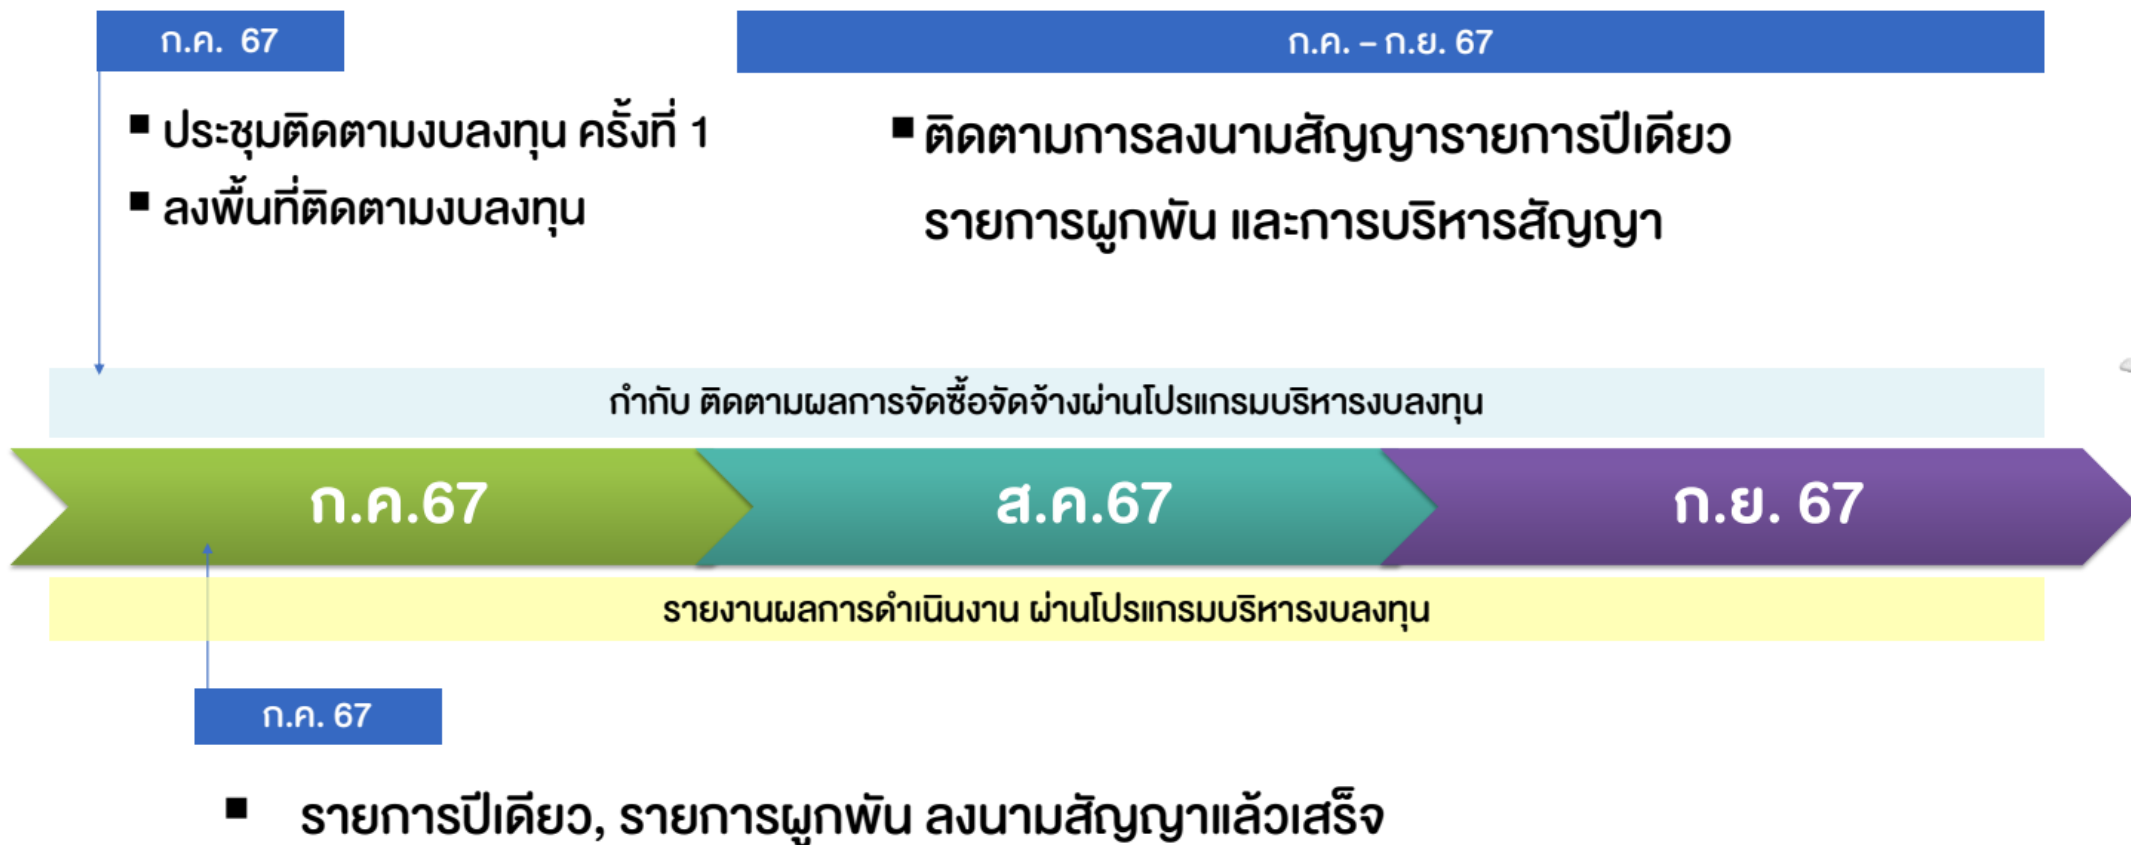


# การบริหารจัดการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2567 เขตสุขภาพที่ 8

ผลการเบิกจ่ายงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
เขตสุขภาพที่ 8

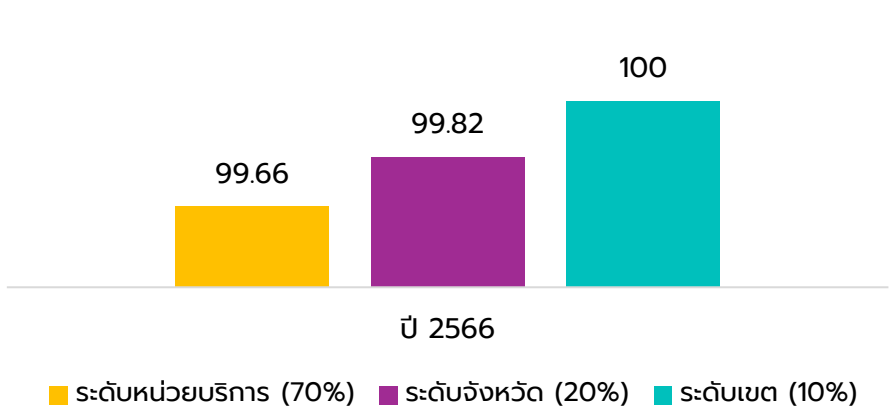

วงเงินและร้อยละการเบิกจ่าย (งบค่าเสื่อม) ในสังกัด สป.สร. ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

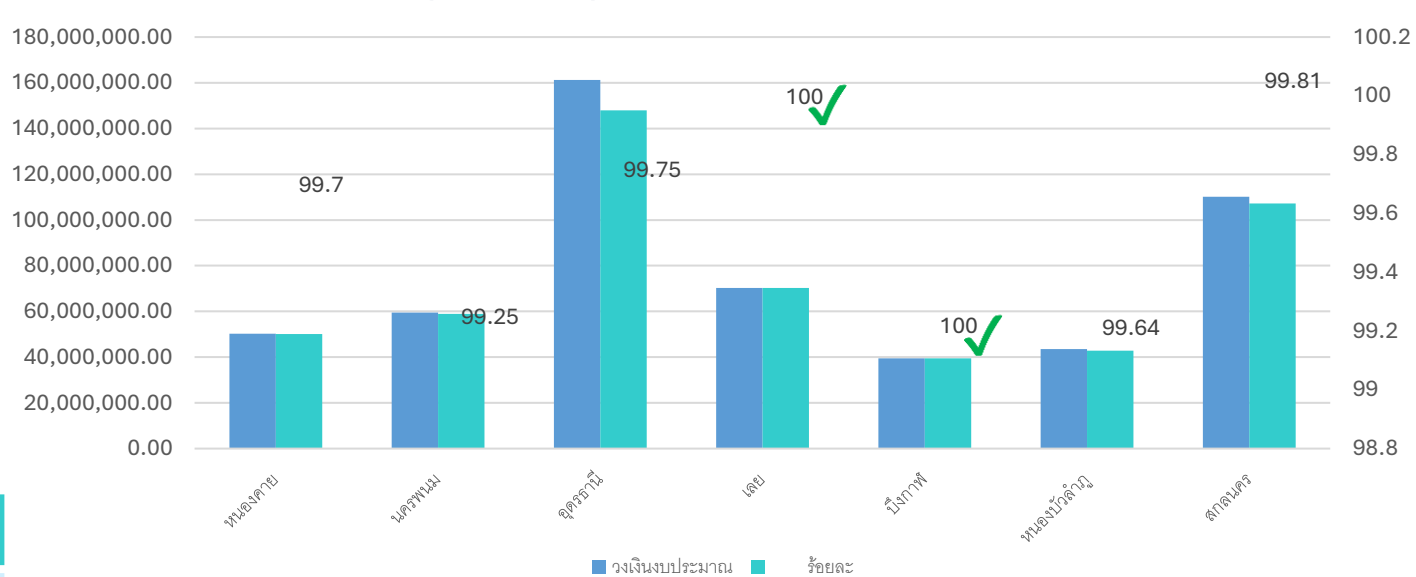

ภาพรวมการจัดสรร ปี 2566 วงเงินทั้งสิ้น 534,528,080.24 บาท

| รายการ   | 70%                                                                                    | 20%                                     | 10%                           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| จัดสรร   | 374,169,656.19<br>(2,082 รายการ)                                                       | 106,905,616.08<br>(560 รายการ)          | 53,452,807.97<br>(220 รายการ) |
| เบิกจ่าย | 357,252,597.30<br>(2,075 รายการ)                                                       | 106,155,616.08<br>(559 รายการ)          | 53,452,807.97<br>(220 รายการ) |
| คงเหลือ  | 16,917,058.89<br>(7 รายการ)<br>หนองคาย = 1<br>นครพนม = 3<br>อุดรธานี = 2<br>สกลนคร = 1 | 750,000.00<br>(1 รายการ)<br>หนองบัวลำภู | 0                             |



ภาพรวมการจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วงเงินทั้งสิ้น 521,816,797.42 บาท

| จัดสรร                           | 70%                              | 20%                            | 10%                           |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 521,816,797.42<br>(3,522 รายการ) | 365,271,758.19<br>(2,847 รายการ) | 104,363,359.49<br>(540 รายการ) | 52,181,679.74<br>(135 รายการ) |

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี แจ้งอนุมัติแผนรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครบ 100% (โอนเสร็จสิ้น ณ 11 มิถุนายน 2567)  
\*\* ขอเร่งรัดการลงนามจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายใน กรกฎาคม 2567



# การบริหารจัดการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เขตสุขภาพที่ 8

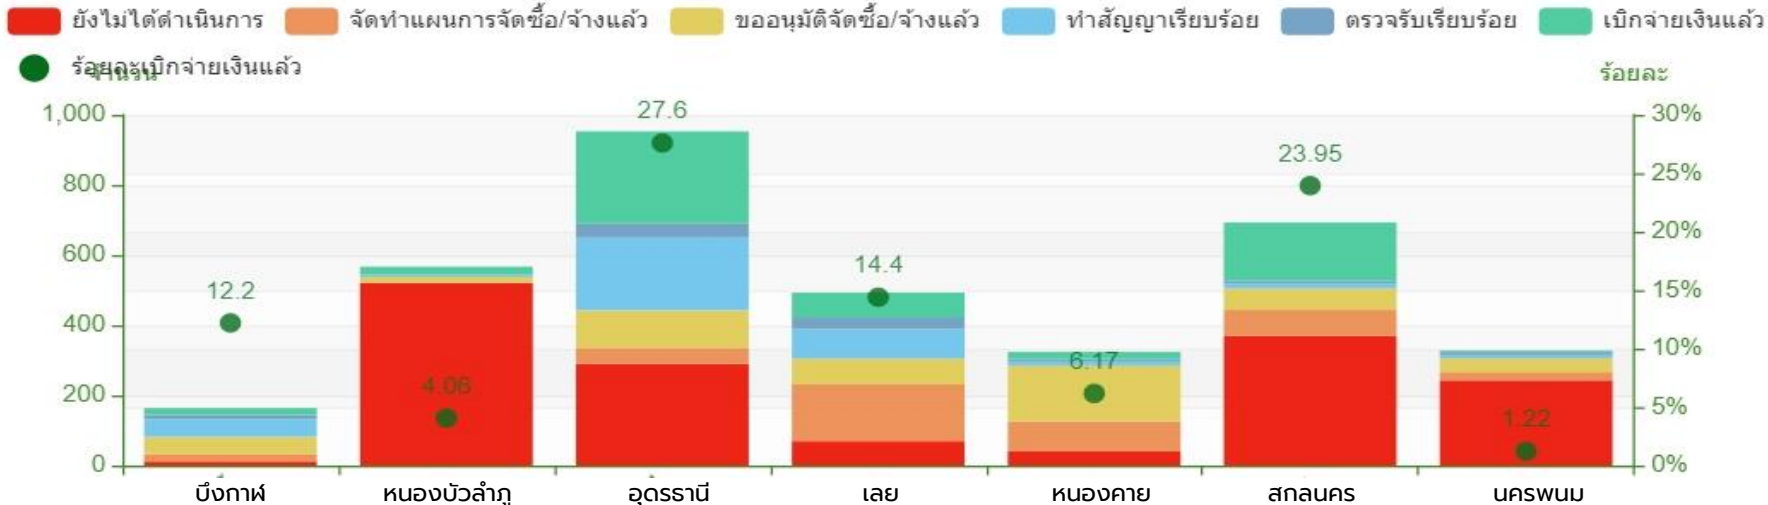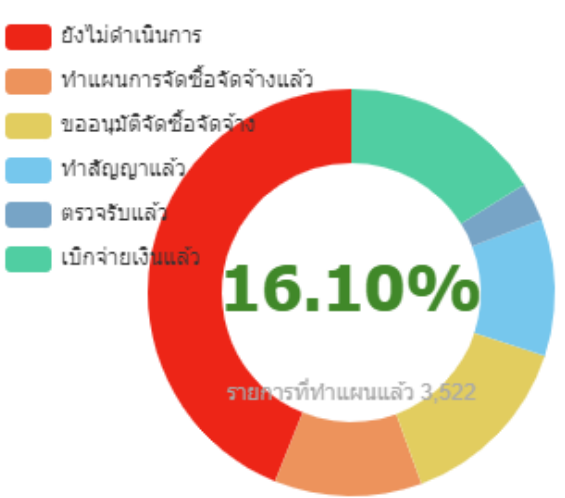

สรุปสถานการณ์ดำเนินงาน (ตามจำนวนรายการ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประเภทงบ ในสังกัด สป.สร. เขตสุขภาพที่ 8

| ลำดับ | จังหวัด     | วงเงินงบประมาณ | งบประมาณตามแผนทั้งหมด | รายการ | ยังไม่ดำเนินการ |        | จัดทำแผนการจัดซื้อ/จ้างแล้ว |        | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้างแล้ว |        | ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว |        | ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว |        | เบิกจ่ายเงินแล้ว |        |
|-------|-------------|----------------|-----------------------|--------|-----------------|--------|-----------------------------|--------|---------------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|------------------|--------|
|       |             |                |                       |        | จำนวน           | ร้อยละ | รายการ                      | ร้อยละ | รายการ                    | ร้อยละ | รายการ               | ร้อยละ | รายการ               | ร้อยละ | รายการ           | ร้อยละ |
| 1     | หนองคาย     | 52,570,194.50  | 52,570,194.50         | 324    | 40              | 12.35  | 86                          | 26.54  | 159                       | 49.07  | 13                   | 4.01   | 6                    | 1.85   | 20               | 6.17   |
| 2     | นครพนม      | 56,553,341.14  | 56,553,341.14         | 328    | 243             | 74.09  | 23                          | 7.01   | 40                        | 12.2   | 10                   | 3.05   | 8                    | 2.44   | 4                | 1.22   |
| 3     | อุดรธานี    | 152,357,970.55 | 152,357,970.55        | 953    | 290             | 30.43  | 46                          | 4.83   | 107                       | 11.23  | 207                  | 21.72  | 40                   | 4.2    | 263              | 27.6   |
| 4     | เลย         | 64,203,282.05  | 64,203,282.05         | 493    | 70              | 14.2   | 161                         | 32.66  | 74                        | 15.01  | 84                   | 17.04  | 33                   | 6.69   | 71               | 14.4   |
| 5     | บึงกาฬ      | 37,928,558.17  | 37,928,558.17         | 164    | 12              | 7.32   | 21                          | 12.8   | 49                        | 29.88  | 50                   | 30.49  | 12                   | 7.32   | 20               | 12.2   |
| 6     | หนองบัวลำภู | 44,586,238.65  | 44,586,238.65         | 567    | 520             | 91.71  | 3                           | 0.53   | 15                        | 2.65   | 5                    | 0.88   | 1                    | 0.18   | 23               | 4.06   |
| 7     | สกลนคร      | 113,617,212.36 | 113,617,212.36        | 693    | 370             | 53.39  | 74                          | 10.68  | 61                        | 8.8    | 14                   | 2.02   | 8                    | 1.15   | 166              | 23.95  |
| รวม   |             |                |                       |        | 1,545           | 43.87  | 414                         | 11.75  | 505                       | 14.34  | 383                  | 10.87  | 108                  | 3.07   | 567              | 16.1   |

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี แจ้งอนุมัติแผนรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 **ครบ 100%** (โอนเสร็จสิ้น ณ 11 มิถุนายน 2567)

**ขอเร่งรัดการลงนามจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2567**

# การบริหารจัดการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เขตสุขภาพที่ 8

## หน่วยงานที่เบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ

| จังหวัด     | หน่วยบริการแม่ข่าย | หน่วยบริการลูกข่าย               | ประเภท       | รายการ                                                                   | จำนวน | รวมเงิน       | งบค่าเสื่อมUC<br>เบิกจ่ายแล้ว | หมายเหตุ การดำเนินการ                                                            | งบ (ระดับ)      |
|-------------|--------------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| อุดรธานี    | sw.อุดรธานี        | sw.อุดรธานี                      | สิ่งก่อสร้าง | ซ่อมแซมระบบปรับอากาศ<br>งานพื้นและประตูสำหรับห้อง<br>ผ่าตัด จำนวน 4 ห้อง | 1     | 12,461,862.00 | 0                             | ทำหนังสือแจ้งลงนามในสัญญา ภายในวันที่ 12<br>ก.ค. 2567 ทำขอขยายเวลาถึง มี.ค. 2568 | หน่วยบริการ 70% |
| อุดรธานี    | sw.อุดรธานี        | sw.อุดรธานี                      | สิ่งก่อสร้าง | ซ่อมแซมพื้นกระเบื้องยาง<br>โซนทางเดินห้องผ่าตัด<br>ตึกเชี่ยวชาญ ชั้น 5   | 1     | 764,710.00    | 0                             | อยู่ระหว่างตรวจรับ-ส่งเบิกเงิน คาดว่าจะเบิกจ่าย<br>ได้ภายใน ก.ค. 2567            | หน่วยบริการ 70% |
| สกลนคร      | sw.สกลนคร          | sw.สกลนคร                        | ครุภัณฑ์     | เครื่องกำเนิดไอน้ำ ขนาดไม่<br>น้อยกว่า 150 แรงม้า                        | 1     | 3,000,000.00  | 0                             | อยู่ระหว่างลงนามเบิกจ่าย คาดว่าจะแล้วเสร็จ<br>ภายในวันที่ 19 ก.ค. 2567           | หน่วยบริการ 70% |
| นครพนม      | sw.นครพนม          | sw.สต.หนองญาติ<br>(ถ่ายโอน)      | สิ่งก่อสร้าง | ซ่อมแซมถนนคอนกรีตพื้นที่<br>130 ตรม.                                     | 1     | 112,500.00    | 0                             | ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว                                                             | หน่วยบริการ 70% |
| นครพนม      | sw.นาหว้า          | sw.สต.บ้านนาคุณใหญ่<br>(ถ่ายโอน) | สิ่งก่อสร้าง | ซ่อมแซมรั้วคอนกรีตบล็อก                                                  | 1     | 103,040.00    | 0                             | จัดทำแผนการจัดซื้อ/จ้างแล้ว                                                      | หน่วยบริการ 70% |
| นครพนม      | sw.วังยาง          | sw.สต.หนองโพธิ์<br>(ถ่ายโอน)     | สิ่งก่อสร้าง | ซ่อมแซมอาคาร sw.สต.หนอง<br>โพธิ์                                         | 1     | 375,000.00    | 0                             | จัดทำแผนการจัดซื้อ/จ้างแล้ว                                                      | หน่วยบริการ 70% |
| หนองคาย     | sw.ศรีเชียงใหม่    | sw.ศรีเชียงใหม่                  | สิ่งก่อสร้าง | ซ่อมแซมผนังและหน้าต่าง<br>ห้องชันสูตร                                    | 1     | 175,741.31    | 0                             | อยู่ระหว่างลงนามเบิกจ่าย คาดว่าจะแล้วเสร็จ<br>ภายในวันที่ 12 ก.ค. 2567           | หน่วยบริการ 70% |
| หนองบัวลำภู | swก.นาหว้า         | swก.นาหว้า                       | ครุภัณฑ์     | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่<br>รวมค่าติดตั้ง) ขนาด 100<br>กิโลวัตต์      | 1     | 750,000.00    | 0                             | อยู่ระหว่างยื่นประกาศรอบ 2 คาดว่าจะดำเนินการให้<br>แล้วเสร็จภายใน 31 ส.ค. 2567   | จังหวัด 20%     |



เขตสุขภาพที่ 8

# THANK YOU

---
