

# รายงานการติดตามงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

โดย นายแพทย์สุรียันต์ ปัญหาราช  
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลหนองบัวลำภู

การประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 8 และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 4/2567  
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2567



ข้อมูลจำแนกตามเขตสุขภาพ (ครุภัณฑ์ปีเดียว+ก่อสร้างปีเดียว)

เขตสุขภาพ	จัดสรรทั้งสิ้น	จัดสรรสุทธิ	ก่อนประกาศ		ประกาศ		รอลงนาม		ลงนาม		คืบจนงบประมาณ	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ผลรวมทั้งหมด	15,482	15,481	14,844	95.89	281	1.82	280	1.81	76	0.49	1	0.01
1	213	213	159	74.65	32	15.02	12	5.63	10	4.69		-
2	241	241	76	31.54	96	39.83	51	21.16	18	7.47		-
3	291	291	178	61.17	27	9.28	62	21.31	24	8.25		-
4	1231	1231	1217	98.86	6	0.49	8	0.65		-		-
5	6278	6277	6253	99.62	7	0.11	16	0.25	1	0.02	1	0.02
6	273	273	202	73.99	21	7.69	43	15.75	7	2.56		-
7	240	240	207	86.25	8	3.33	15	6.25	10	4.17		-
8	1307	1307	1267	96.94	27	2.07	13	0.99		-		-
9	372	372	327	87.90	8	2.15	33	8.87	4	1.08		-
10	281	281	254	90.39	2	0.71	25	8.90		-		-
11	2155	2155	2141	99.35	12	0.56	1	0.05	1	0.05		-
12	1169	1169	1145	97.95	24	2.05		-		-		-
ส่วนกลาง	164	164	1267	772.56		-		-		-		-
สบพช.	1267	1267	151	11.92	11	0.87	1	0.08	1	0.08		-



ข้อมูลจำแนกตามเขตสุขภาพ (ครุภัณฑ์ผูกพัน+ก่อสร้างผูกพัน)

เขตสุขภาพ	จัดสรรทั้งสิ้น	จัดสรรสุทธิ	ก่อนประกาศ		ประกาศ		รอลงนาม		ลงนาม		ค่างบประมาณ	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ผลรวมทั้งหมด	71	71	69	97.18	2	2.82	-	-	-	-	-	-
1	5	5	5	100.00		-		-		-		-
2	5	5	5	100.00		-		-		-		-
3	5	5	5	100.00		-		-		-		-
4	5	5	5	100.00		-		-		-		-
5	8	8	7	87.50	1	12.50		-		-		-
6	5	5	5	100.00		-		-		-		-
7	5	5	5	100.00		-		-		-		-
8	6	6	6	100.00		-		-		-		-
9	7	7	6	85.71	1	14.29		-		-		-
10	6	6	6	100.00		-		-		-		-
11	5	5	5	100.00		-		-		-		-
12	5	5	5	100.00		-		-		-		-
ส่วนกลาง	3	3	1	33.33		-		-		-		-
สบพช.	1	1	3	300.00		-		-		-		-



### ข้อมูลจำแนกตามเขตสุขภาพ (รวม)

เขตสุขภาพ	จัดสรรทั้งสิ้น	จัดสรรสุทธิ	ก่อนประกาศ		ประกาศ		รอลงนาม		ลงนาม		คืบหน้าประมาณ	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ผลรวมทั้งหมด	15,553	15,552	14,913	95.89	283	1.82	280	1.80	76	0.49	1	0.01
1	218	218	164	75.23	32	14.68	12	5.50	10	4.59	0	-
2	246	246	81	32.93	96	39.02	51	20.73	18	7.32	0	-
3	296	296	183	61.82	27	9.12	62	20.95	24	8.11	0	-
4	1236	1236	1222	98.87	6	0.49	8	0.65	0	-	0	-
5	6286	6285	6260	99.60	8	0.13	16	0.25	1	0.02	1	0.02
6	278	278	207	74.46	21	7.55	43	15.47	7	2.52	0	-
7	245	245	212	86.53	8	3.27	15	6.12	10	4.08	0	-
8	1313	1313	1273	96.95	27	2.06	13	0.99	0	-	0	-
9	379	379	333	87.86	9	2.37	33	8.71	4	1.06	0	-
10	287	287	260	90.59	2	0.70	25	8.71	0	-	0	-
11	2160	2160	2146	99.35	12	0.56	1	0.05	1	0.05	0	-
12	1174	1174	1150	97.96	24	2.04	0	-	0	-	0	-
ส่วนกลาง	167	167	1268	759.28	0	-	0	-	0	-	0	-
สบพช.	1268	1268	154	12.15	11	0.87	1	0.08	1	0.08	0	-



หน่วยงาน	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์					ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างสิ่งก่อสร้าง					หมายเหตุ
	จำนวนรายการ (หน่วย)	รอส่งมอบ	ตรวจรับ	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	จำนวนรายการ (หน่วย)	ร่างประกาศ/ เผยแพร่ประกาศ	ประกาศ ผู้ชนะ	รอลงนาม	ลงนาม ในสัญญา	
<b>เขต 8</b>	<b>486</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>477</b>	<b>98.15</b>	<b>53</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>38</b>	
<b>อุดรธานี</b>	<b>130</b>			<b>130</b>	<b>100</b>	<b>10</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	
- สสจ.อุดรธานี	104			104		10			5	5	
- รพ.อุดรธานี	13			13							
- รพ.กุมภวาปี	13			13							
<b>สกลนคร</b>	<b>52</b>	<b>3</b>		<b>49</b>	<b>94.23</b>	<b>8</b>	<b>2</b>		<b>1</b>	<b>5</b>	
- สสจ.สกลนคร	33			33		8	2		1	5	<b>สิ่งก่อสร้าง-ร่างประกาศ/เผยแพร่ประกาศ</b> - อาคารผู้ป่วยนอก รพ.พังโคน ลำช้าเนื่องจากขอแก้ไขชื่อรายการ จาก 5 ชั้น เป็น 4 ชั้น ถึงขั้นตอน คกก.พิจารณายกเลิกการประกวดราคาเนื่องจากมีผู้เสนอราคา 1 ราย และไม่ถูกต้องตามประกาศจังหวัดสกลนคร - อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น รพ.พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ลำช้าเนื่องจากเปลี่ยนชื่อรพ. (เดิม รพ.บ้านม่วง) ถึงขั้นตอน อยู่ระหว่างคกก.พิจารณาผลของหนังสือเสนอราคาต่ำสุด ซึ่งแจ้งการทำงานเนื่องจาก เสนอราคาต่ำกว่าราคากลาง 15.88%
- รพ.สกลนคร	3			3							
- รพ.สว่างแดนดิน	7			7							
- รพ.วานรนิวาส	9	3		6							
<b>นครพนม</b>	<b>121</b>	<b>2</b>		<b>119</b>	<b>98.35</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				
- สสจ.นครพนม	108	2		106		2	2				<b>สิ่งก่อสร้าง-ร่างประกาศ/เผยแพร่ประกาศ</b> - อาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง รพ.ศรีสงคราม ประกาศครั้งที่ 2 ทำเรื่องถึง สป.เพื่อให้ความเห็นชอบราคาที่ผู้เสนอราคาอื่นสูงกว่าราคากลางประมาณ ราคากลางประมาณ 45,798,800 ราคาที่ผู้เสนอราคาอื่น 47,936,000 - อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น รพ.นาหว้า อยู่ระหว่างรอจะประกาศครั้งที่ 2 โดยขอความเห็นชอบประกาศราคาตาม พรบ. หรือให้ประกาศตามผู้รับจ้างเสนอ เนื่องจากหมดระยะเวลาการยื่นราคาผู้รับจ้างไม่ยื่นราคาต่อ ทำให้ต้องยกเลิก เพื่อจะประกาศใหม่ ราคาตาม พรบ. 70,059,100 ราคาที่ผู้รับจ้างยื่นเสนอ 66,494,900
- รพ.นครพนม	13			13							
<b>เลย</b>	<b>58</b>	<b>2</b>		<b>56</b>	<b>96.55</b>	<b>11</b>		<b>1</b>		<b>10</b>	
- สสจ.เลย	49	1		48		11		1		10	<b>ครุภัณฑ์-รอส่งมอบ : คาดว่าจะลงนาม 10 ธ.ค. 2567</b>
- รพ.เลย	9	1		8							
<b>หนองคาย</b>	<b>68</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>66</b>	<b>97.06</b>	<b>9</b>				<b>9</b>	
- สสจ.หนองคาย	16	1	1	14		8				8	<b>ครุภัณฑ์-รอส่งมอบ : กำหนดส่งมอบ 7 พ.ย. 2567</b> <b>ครุภัณฑ์-ตรวจรับ : ตรวจรับแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย</b>
- รพ.หนองคาย	8			8		1				1	
- รพ.ท่าบ่อ	44			44							
<b>หนองบัวลำภู</b>	<b>28</b>			<b>28</b>	<b>100</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>1</b>		
- สสจ.หนองบัวลำภู	24			24		1			1		
- รพ.หนองบัวลำภู	4			4		1	1				<b>สิ่งก่อสร้าง-ร่างประกาศ/เผยแพร่ประกาศ</b> อาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง รพ.หนองบัวลำภู ลำช้าเนื่องจากมีการอุทธรณ์ ถึงขั้นตอน 10.คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อความเห็นชอบ
<b>บึงกาฬ</b>	<b>29</b>			<b>29</b>	<b>100</b>	<b>11</b>			<b>2</b>	<b>9</b>	
- สสจ.บึงกาฬ	28			28		10			2	8	
- รพ.บึงกาฬ	1			1		1				1	



# การติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนปี 2567 ที่เกินเหลือมอบไว้ใช้จ่ายในปี 2568 เขตสุขภาพที่ 8

หน่วยงาน	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์					ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างสิ่งก่อสร้าง					หมายเหตุ
	จำนวนรายการ (หน่วย)	รอส่งมอบ	ตรวจรับ	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	จำนวนรายการ (หน่วย)	ร่างประกาศ/ เผยแพร่ประกาศ	ประกาศ ผู้ชนะ	รอลงนาม	ลงนาม ในสัญญา	
<b>เขต 8</b>	<b>486</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>477</b>	<b>98.15</b>	<b>53</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>38</b>	
<b>อุดรธานี</b>	<b>130</b>			<b>130</b>	<b>100</b>	<b>10</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	
- สสจ.อุดรธานี	104			104		10			5	5	
- รพ.อุดรธานี	13			13							
- รพ.กุมภวาปี	13			13							
<b>สกลนคร</b>	<b>52</b>	<b>3</b>		<b>49</b>	<b>94.23</b>	<b>8</b>	<b>2</b>		<b>1</b>	<b>5</b>	
- สสจ.สกลนคร	33			33		8	2		1	5	<b>สิ่งก่อสร้าง-ร่างประกาศ/เผยแพร่ประกาศ</b> - อาคารผู้ป่วยนอก รพ.พังโคน ลำช้าเนื่องจากขอแก้ไขชื่อรายการ จาก 5 ชั้น เป็น 4 ชั้น ถึงขั้นตอน กกก.พิจารณายกเลิกการประกวดราคาเนื่องจากมีผู้เสนอราคา 1 ราย และไม่ถูกต้องตามประกาศจังหวัดสกลนคร - อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น รพ.พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ลำช้าเนื่องจากเปลี่ยนชื่อรพ. (เดิม รพ.บ้านม่วง) ถึงขั้นตอน อยู่ระหว่างกกก.พิจารณาผลของหนังสือเสนอราคาต่ำสุด ซึ่งแจ้งการทำงานเนื่องจาก เสนอราคาต่ำกว่าราคากลาง 15.88%
- รพ.สกลนคร	3			3							
- รพ.สว่างแดนดิน	7			7							
- รพ.วานรนิวาส	9	3		6							
<b>นครพนม</b>	<b>121</b>	<b>2</b>		<b>119</b>	<b>98.35</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				
- สสจ.นครพนม	108	2		106		2	2				<b>สิ่งก่อสร้าง-ร่างประกาศ/เผยแพร่ประกาศ</b> - อาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง รพ.ศรีสงคราม ประกาศครั้งที่ 2 ทำเรื่องถึง สป.เพื่อให้ความเห็นชอบราคาที่ผู้เสนอราคาอื่นสูงกว่าราคางบประมาณ ราคางบประมาณ 45,798,800 ราคาที่ผู้เสนอราคาอื่น 47,936,000 - อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น รพ.นาหว้า อยู่ระหว่างรอจะประกาศครั้งที่ 2 โดยขอความเห็นชอบประกาศราคาตาม พรบ. หรือให้ประกาศตามผู้รับจ้างเสนอ เนื่องจากหมดระยะเวลาการยื่นราคาผู้รับจ้างไม่ยื่นราคาต่อ ทำให้ต้องยกเลิก เพื่อจะประกาศใหม่ ราคาตาม พรบ. 70,059,100 ราคาที่ผู้รับจ้างยื่นเสนอ 66,494,900
- รพ.นครพนม	13			13							
<b>เลย</b>	<b>58</b>	<b>2</b>		<b>56</b>	<b>96.55</b>	<b>11</b>		<b>1</b>		<b>10</b>	
- สสจ.เลย	49	1		48		11		1		10	<b>ครุภัณฑ์-รอส่งมอบ</b> : คาดว่าจะลงนาม 10 ธ.ค. 2567
- รพ.เลย	9	1		8							
<b>หนองคาย</b>	<b>68</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>66</b>	<b>97.06</b>	<b>9</b>				<b>9</b>	
- สสจ.หนองคาย	16	1	1	14		8				8	<b>ครุภัณฑ์-รอส่งมอบ</b> : กำหนดส่งมอบ 7 พ.ย. 2567 <b>ครุภัณฑ์-ตรวจรับ</b> : ตรวจรับแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
- รพ.หนองคาย	8			8		1				1	
- รพ.ท่าบ่อ	44			44							
<b>หนองบัวลำภู</b>	<b>28</b>			<b>28</b>	<b>100</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>1</b>		
- สสจ.หนองบัวลำภู	24			24		1			1		
- รพ.หนองบัวลำภู	4			4		1	1				<b>สิ่งก่อสร้าง-ร่างประกาศ/เผยแพร่ประกาศ</b> อาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง รพ.หนองบัวลำภู ลำช้าเนื่องจากมีการอุทธรณ์ ถึงขั้นตอน 10.คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อความเห็นชอบ
<b>บึงกาฬ</b>	<b>29</b>			<b>29</b>	<b>100</b>	<b>11</b>			<b>2</b>	<b>9</b>	
- สสจ.บึงกาฬ	28			28		10			2	8	
- รพ.บึงกาฬ	1			1		1				1	



หน่วยงาน	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์					หมายเหตุ
	จำนวนรายการที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น (หน่วย)	ร่างประกาศ/เผยแพร่ประกาศ	ประกาศผู้ชนะ	รองลงนาม	ลงนามในสัญญา	
<b>เขต 8</b>	<b>198</b>	<b>46</b>	<b>20</b>	<b>86</b>	<b>46</b>	
<b>อุดรธานี</b>	<b>21</b>		<b>0</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	
- สสจ.อุดรธานี	16			13	3	
- รพ.อุดรธานี	4				4	
- รพ.กุมภวาปี	1		<b>0</b>		1	
<b>สกลนคร</b>	<b>47</b>	<b>0</b>		<b>25</b>	<b>22</b>	
- สสจ.สกลนคร	9				9	
- รพ.สกลนคร	25			25		
- รพ.วานรนิวาส	13				13	
<b>นครพนม</b>	<b>11</b>			<b>11</b>		
- สสจ.นครพนม	11			11		
<b>เลย</b>	<b>66</b>	<b>33</b>		<b>33</b>		
- สสจ.เลย	33			33		
- รพ.เลย	33	33				
<b>หนองคาย</b>	<b>25</b>	<b>13</b>			<b>12</b>	
- สสจ.หนองคาย	4	2			2	
- รพ.หนองคาย	21	11			10	
<b>หนองบัวลำภู</b>	<b>5</b>			<b>4</b>	<b>1</b>	
- สสจ.หนองบัวลำภู	1				1	
- รพ.หนองบัวลำภู	4			4		
<b>บึงกาฬ</b>	<b>23</b>		<b>20</b>		<b>3</b>	
- สสจ.บึงกาฬ	20		20			
- รพ.บึงกาฬ	3				3	

# การบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ 2568

จากการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 67

แจ้ง (ร่าง) มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ให้ เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 และ การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนภาพรวม ร้อยละ 100  
 จำแนกรายไตรมาส ดังนี้

	การเบิกจ่ายงบลงทุน	การใช้จ่ายงบลงทุน
ไตรมาสที่ 1	17	39
ไตรมาสที่ 2	35	66
ไตรมาสที่ 3	54	77
ไตรมาสที่ 4	80	100

\*\* ทั้งนี้ หากคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 แล้ว  
 กบรส. จะแจ้งมาตรการฯ ให้หน่วยรับงบประมาณทราบและถือปฏิบัติต่อไป



หน่วยงาน	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์							ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างสิ่งก่อสร้าง						
	จำนวนรายการ (หน่วย)	ยังไม่ดำเนินการ	จัดทำแผน (ก่อนประกาศ)	ร่างประกาศ/เผยแพร่ ประกาศ	ประกาศผู้ชนะ	รอลงนาม	ลงนามในสัญญา	จำนวนรายการ (หน่วย)	ยังไม่ดำเนินการ	จัดทำแผน (ก่อนประกาศ)	ร่างประกาศ/เผยแพร่ ประกาศ	ประกาศผู้ชนะ	รอลงนาม	ลงนามในสัญญา
เขต 8	1,275	886	257	125	0	0	7	37	24	12				1
อุดรธานี	495	394		94			7	14	13	0				
- สสจ.อุดรธานี	312	312						11	11					
- รพ.อุดรธานี	82	82						2	2					
- รพ.กุมภวาปี	101	0		94			7	1						1
สกลนคร	35	4	19	12				4		4				
- สสจ.สกลนคร	9		1	8				4		4				
- รพ.สกลนคร	18	0	18					-						
- รพร.สว่างแดนดิน	4			4				-						
- รพ.วานรนิวาส	4	4						-						
นครพนม	28	0	9	19				0						
- สสจ.นครพนม	28		9	19				-						
- รพ.นครพนม	0							-						
เลย	73	0	73					3		3				
- สสจ.เลย	68		68					3		3				
- รพ.เลย	5	0	5					-						
หนองคาย	127	0	127					4	4					
- สสจ.หนองคาย	56	0	56					4	4					
- รพ.หนองคาย	52		52					-						
- รพร.ท่าบ่อ	19	0	19					-						
หนองบัวลำภู	502	486	16					7	7					
- สสจ.หนองบัวลำภู	486	486						7	7					
- รพ.หนองบัวลำภู	16		16					-						
บึงกาฬ	15	2	13					5		5				
- สสจ.บึงกาฬ	13		13					5		5				
- รพ.บึงกาฬ	2	2						-						

# การบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ 2568



ดำเนินการตาม  
ระเบียบฯ  
มาตรการ  
ที่เกี่ยวข้องกับ  
การบริหาร  
งบประมาณฯ

ให้ใช้แบบรูป  
รายการ  
สิ่งก่อสร้าง และ  
สถานที่ก่อสร้าง  
ตามที่ได้รับอนุมัติ

เร่งรัดดำเนินการ  
จัดซื้อจัดจ้าง  
ทุกขั้นตอน และ  
เร่งรัดการเบิกจ่าย  
งบประมาณ

- รายการปีเดียว  
ลงนามสัญญา  
ภายใน ธ.ค. 67  
- รายการผูกพัน  
ลงนามสัญญา  
ภายใน มี.ค. 68


รายงานผลการ  
ดำเนินงานผ่าน  
“โปรแกรมบริหาร  
งบประมาณ” ทันที  
หลังจากเสร็จสิ้น  
แต่ละขั้นตอนฯ

กบรส. แจ้งจัดสรรงบประมาณ 2568 เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 2567


และกองบริหารการคลังดำเนินการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว สามารถดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนลงนามสัญญา

# Timeline การบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ 2568

กบรส.

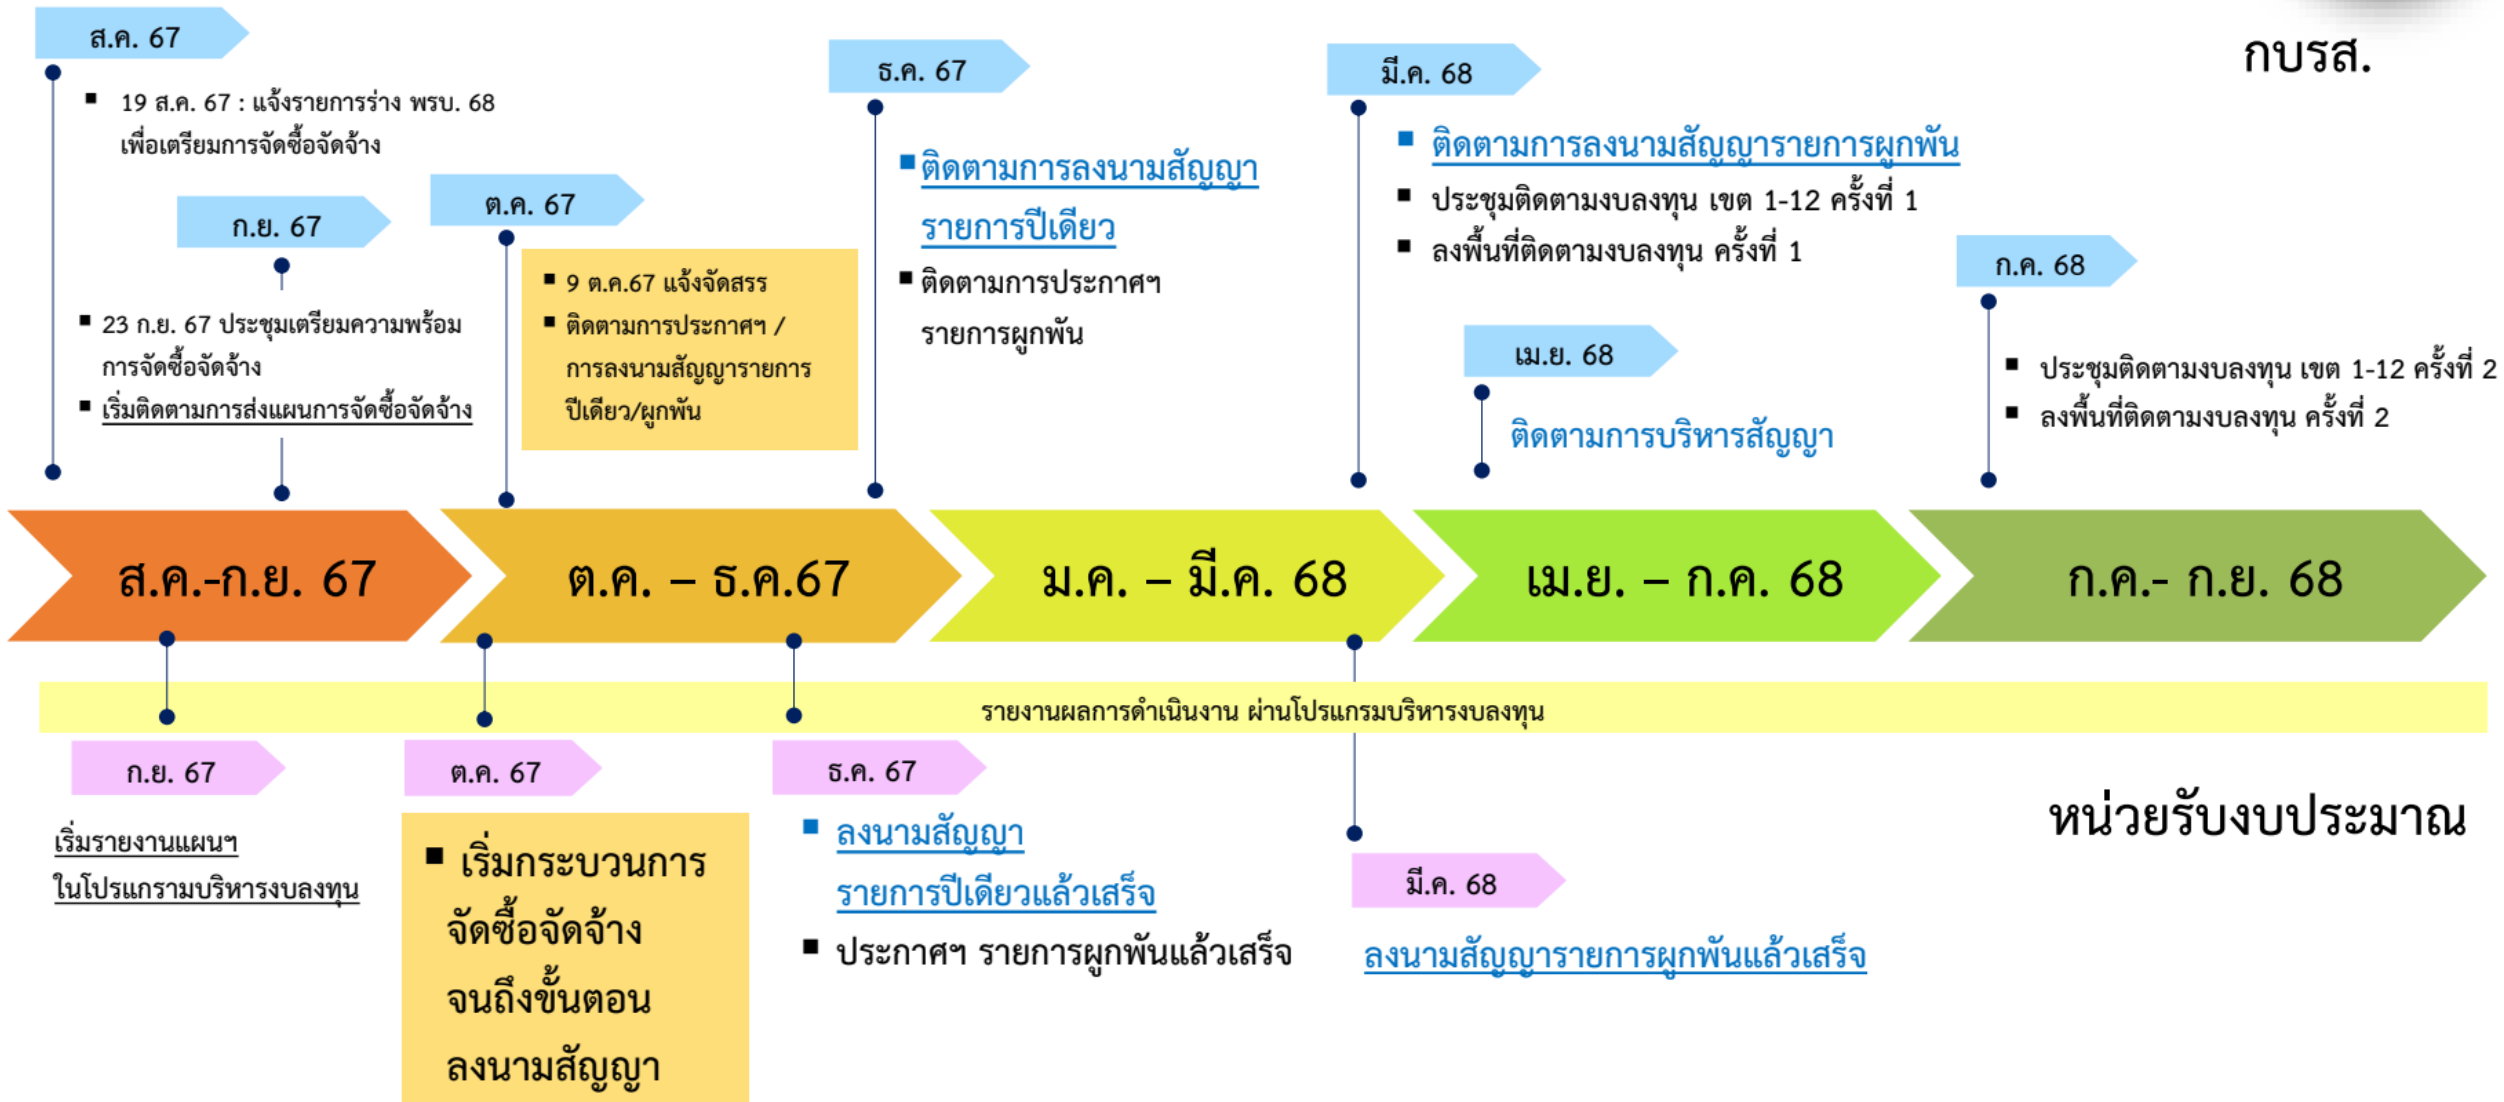

# Timeline การจัดทำคำของบลงทุน ปีงบประมาณ 2569

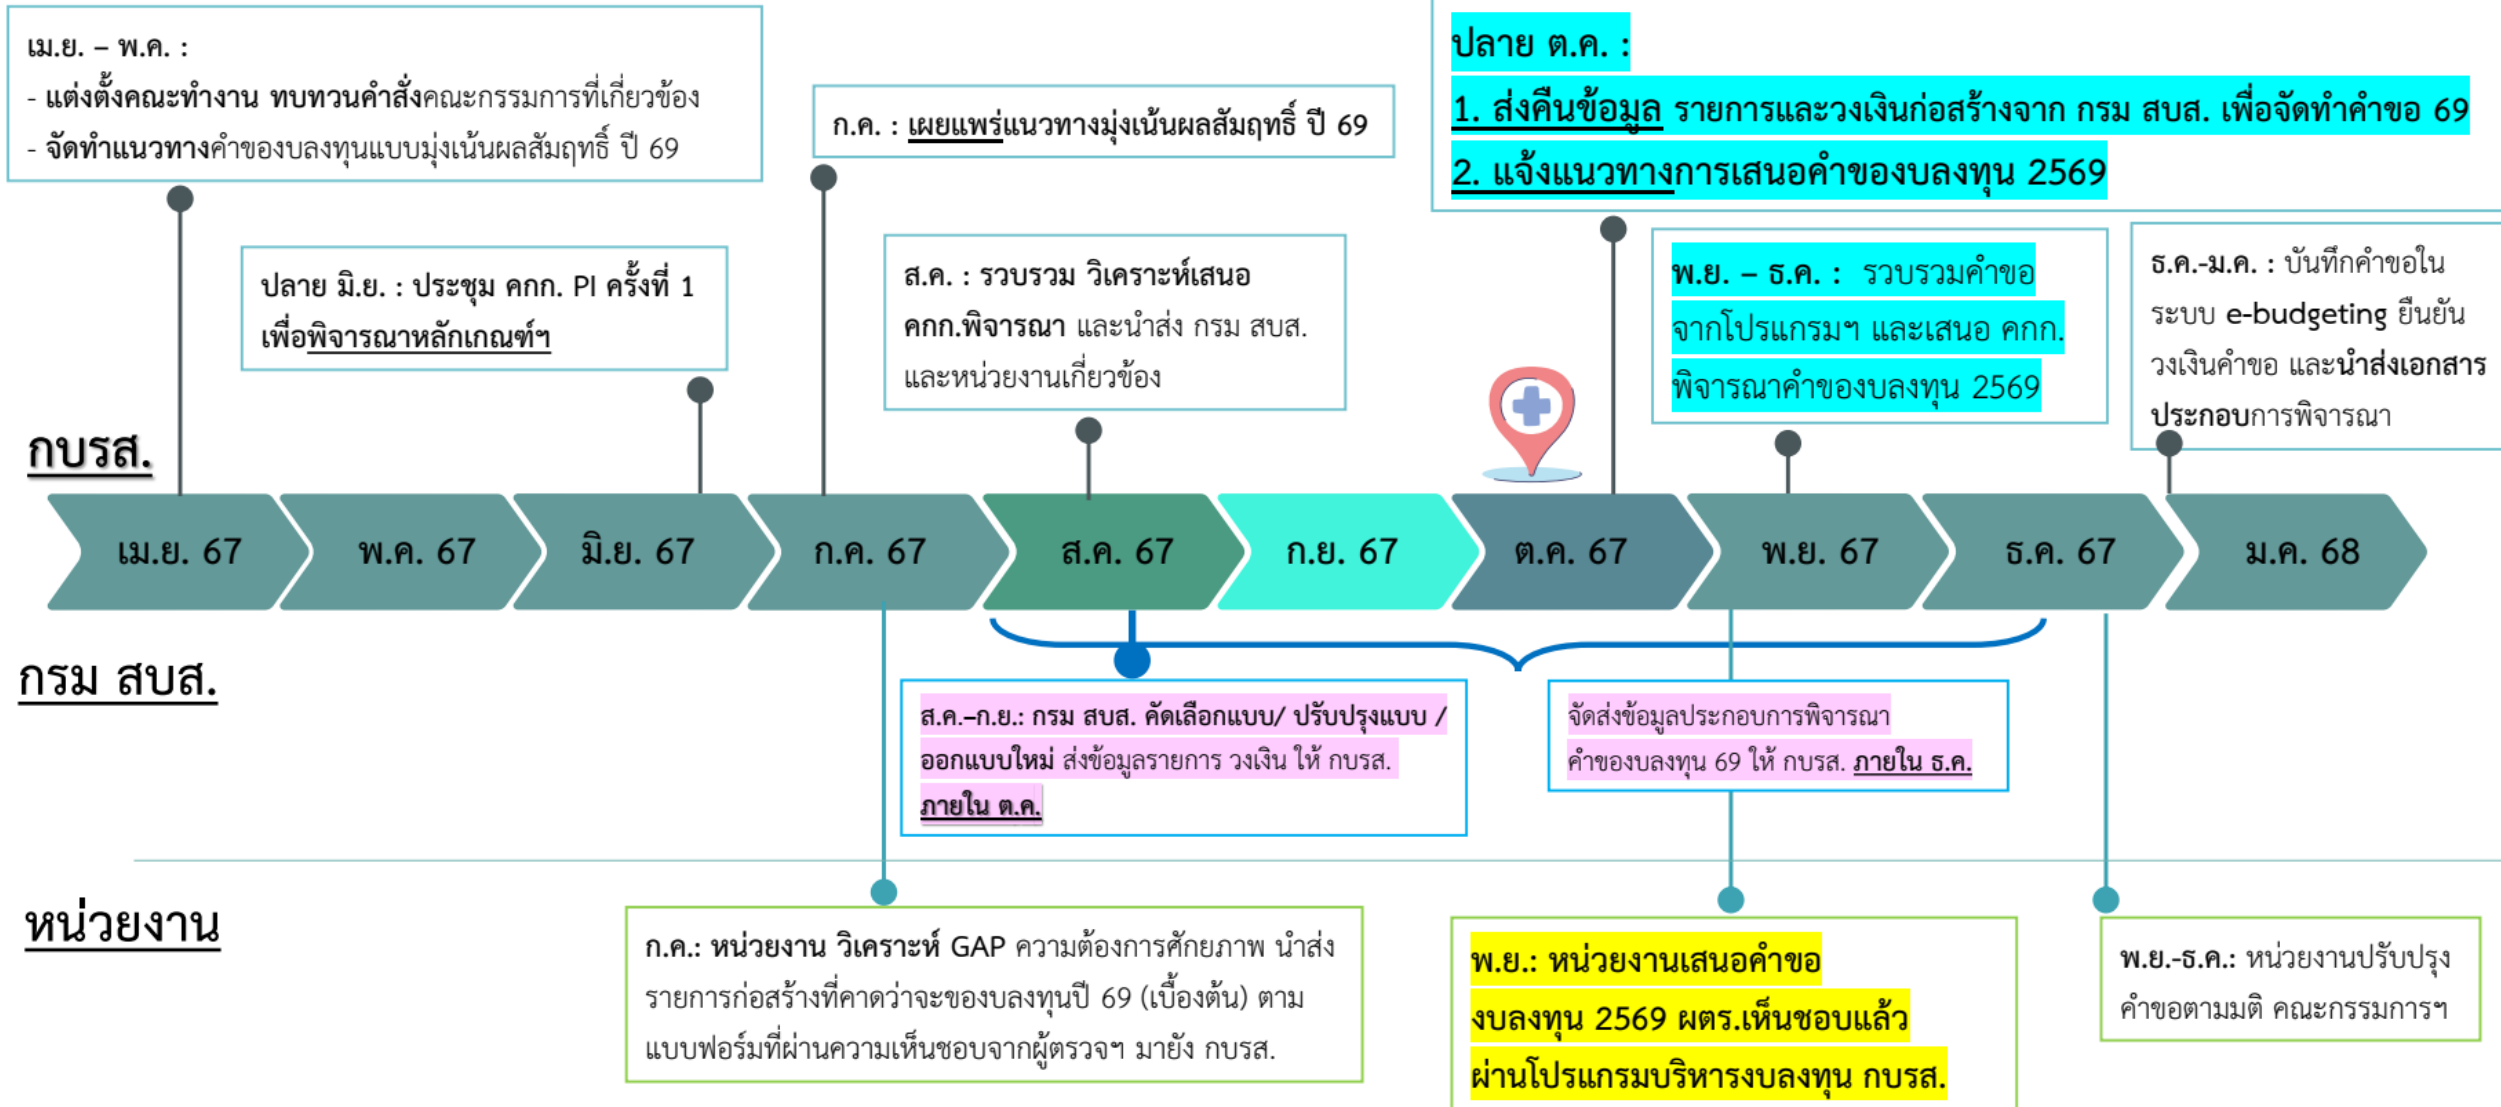

# ข้อพิจารณา

จึงเรียนมา  
เพื่อโปรด

เร่งรัดเบิกจ่ายรายการที่กันเงินเหลือมปี 2567 ไว้ใช้จ่าย ปี 2568

เร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบกลางฯ  
ปีงบประมาณ 2567

เร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ  
ปีงบประมาณ 2568

เตรียมความพร้อมเพื่อเสนอคำขอของบลงทุน ปีงบประมาณ 2569

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 จะจัดประชุมเรียงลำดับงบลงทุนระดับเขต 11 พ.ย.2567



ขอบคุณครับ
