



รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง

รายการงบประมาณ เขตสุขภาพที่ 8



● Present By CPO R8WAY

25 ธันวาคม 2567



<https://r8way.moph.go.th>



ภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบลงทุน เขตสุขภาพที่ 8



ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ปี 2567 ที่กันเงินเหลือมปีใช้จ่ายปี 2568 แยกรายจังหวัด

ลำดับ	จังหวัด	ก่อสร้างปีเดียว				ก่อสร้างผูกพัน				ครุภัณฑ์				ผลรวม			
		กันเงินสุทธิ	เบิกจ่าย	%การเบิกจ่าย	งบคงเหลือ	กันเงินสุทธิ	เบิกจ่าย	%การเบิกจ่าย	งบคงเหลือ	กันเงินสุทธิ	เบิกจ่าย	%การเบิกจ่าย	งบคงเหลือ	กันเงินสุทธิ	เบิกจ่าย	%การเบิกจ่าย	งบคงเหลือ
1	อุดรธานี	3,313,575.00	2,433,870.00	73.45%	879,705.00	36,647,100.00	0.00	0.00%	36,647,100.00				0.00	39,960,675.00	2,433,870.00	6.09%	37,526,805.00
2	สกลนคร	4,362,500.00	3,672,500.00	84.18%	690,000.00	65,396,200.00	0.00	0.00%	65,396,200.00	2,936,004.00	2,936,004.00	100.00%	-	72,694,704.00	6,608,504.00	9.09%	66,086,200.00
3	นครพนม				0.00	10,508,900.00	0.00	0.00%	10,508,900.00	1,899,000.00	1,898,000.00	99.95%	1,000.00	12,407,900.00	1,898,000.00	15.30%	10,509,900.00
4	เลย	37,520,128.00	0.00	0.00%	37,520,128.00	27,834,800.00	0.00	0.00%	27,834,800.00	23,493,000.00	2,498,000.00	10.63%	20,995,000.00	88,847,928.00	2,498,000.00	2.81%	86,349,928.00
5	หนองคาย	13,225,969.69	1,224,769.69	9.26%	12,001,200.00	116,685,618.00	0.00	0.00%	116,685,618.00	12,053,800.00	12,053,800.00	100.00%	-	141,965,387.69	13,278,569.69	9.35%	128,686,818.00
6	หนองบัวลำภู				0.00	8,308,600.00	0.00	0.00%	8,308,600.00				0.00	8,308,600.00	0.00	0.00%	8,308,600.00
7	บึงกาฬ	15,662,300.00	1,723,423.00	11.00%	13,938,877.00	39,668,207.95	0.00	0.00%	39,668,207.95				0.00	55,330,507.95	1,723,423.00	3.11%	53,607,084.95
ผลรวม		74,084,472.69	9,054,562.69	12.22%	65,029,910.00	305,049,425.95	0.00	0.00%	305,049,425.95	40,381,804.00	19,385,804.00	48.01%	20,996,000.00	419,515,702.64	28,440,366.69	6.78%	391,075,335.95

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน (งบกลาง) ปี 2567 และงบลงทุน ปี 2568 แยกรายจังหวัด

ลำดับ	จังหวัด	งบลงทุนปี 67 (งบกลาง)				งบลงทุนปี 68 (ครุภัณฑ์)				งบลงทุนปี 68 (สิ่งก่อสร้าง)				ผลรวม			
		วงเงินรวม(บาท)	เบิกจ่าย	%การเบิกจ่าย	งบคงเหลือ	วงเงินรวม(บาท)	เบิกจ่าย	%การเบิกจ่าย	งบคงเหลือ	กันเงินสุทธิ	เบิกจ่าย	%การเบิกจ่าย	งบคงเหลือ	กันเงินสุทธิ	เบิกจ่าย	%การเบิกจ่าย	งบคงเหลือ
1	อุดรธานี	13,000,000.00	245,700.00	1.89%	12,754,300.00	45,792,400.00	688,558.50	1.50%	45,103,841.50	559,523,300.00	0.00	0.00%	559,523,295.00	618,315,700.00	934,258.50	0.15%	617,381,441.50
2	สกลนคร	11,800,000.00	3,500,000.00	29.66%	8,300,000.00	194,340,000.00	0.00	0.00%	194,340,000.00	113,665,200.00	0.00	0.00%	113,665,200.00	319,805,200.00	3,500,000.00	1.09%	316,305,200.00
3	นครพนม	550,000.00	0.00	0.00%	550,000.00	33,100,000.00	2,457,500.00	7.42%	30,642,500.00					33,650,000.00	2,457,500.00	7.30%	31,192,500.00
4	เลย	16,850,000.00	350,000.00	2.08%	16,500,000.00	51,393,000.00	0.00	0.00%	51,393,000.00	12,377,100.00	0.00	0.00%	12,377,100.00	80,620,100.00	350,000.00	0.43%	80,270,100.00
5	หนองคาย	7,600,000.00	392,000.00	5.16%	7,208,000.00	137,720,500.00	817,500.00	0.59%	136,903,000.00	92,429,900.00	0.00	0.00%	92,429,900.00	237,750,400.00	1,209,500.00	0.51%	236,540,900.00
6	หนองบัวลำภู	3,350,000.00	0.00	0.00%	3,350,000.00	24,385,400.00	0.00	0.00%	23,910,000.00	34,894,300.00	0.00	0.00%	34,894,300.00	62,629,700.00	0.00	0.00%	62,629,700.00
7	บึงกาฬ	1,150,000.00	0.00	0.00%	1,150,000.00	17,625,000.00	0.00	0.00%	17,625,000.00	20,809,000.00	0.00	0.00%	20,809,000.00	39,584,000.00	0.00	0.00%	39,584,000.00
ผลรวม		54,300,000.00	4,487,700.00	8.26%	49,812,300.00	504,356,300.00	3,963,558.50	0.79%	499,917,341.50	833,698,800.00	0.00	0.00%	833,698,795.00	1,392,355,100.00	8,451,258.50	0.61%	1,383,903,841.50



ผลการดำเนินงานงบลงทุนปี 2567 ที่กันเงินเหลื่อมปี



สถานะดำเนินการงบลงทุนปี 2567 ที่กันเงินเหลื่อมปีใช้จ่ายปี 2568 (ก่อสร้างปีเดียว) แยกรายจังหวัด

ลำดับ	จังหวัด	จำนวน ทั้งหมด (รายการ)	ทำถึงขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง					จำนวนงวดงานที่ล่าช้า					สถานะความเสี่ยง		
			เริ่มงาน ก่อสร้างตาม แผน	ผู้ควบคุมงาน รายงานสรุป	ผู้รับจ้าง เตรียมส่ง มอบ	กรรมการ ตรวจรับ งานจ้าง	เบิกจ่ายเงิน ตามงวดงาน	ไม่มีล่าช้า	ช้า 1 งวด	ช้า 2 งวด	มากกว่า 2 งวด จำนวน ร้อยละ	ไม่มีข้อมูล	เสี่ยงต่ำ	เสี่ยงกลาง	เสี่ยงสูง
1	อุดรธานี	3	0	0	0	1	2	0	2	1	0 0.00%	0	2	0	1
2	สกลนคร	4	0	0	0	0	4	3	1	0	0 0.00%	0	0	4	0
3	นครพนม														
4	เลย	8	0	8	0	0	0	1	3	1	3 37.50%	0	0	0	8
5	หนองคาย	7	6	0	1	0	0	0	0	4	2 28.57%	1	0	7	0
6	หนองบัวลำภู														
7	บึงกาฬ	10	0	0	0	0	10	0	0	1	1 10.00%	8	1	7	2
ผลรวม		32	6	8	1	1	16	4	6	7	6 18.75%	9	3	18	11



ผลการดำเนินงานงบลงทุนปี 2567 ที่กันเงินเหลื่อมปี



รายการงบลงทุนปี 2567 เหลื่อมปี 2568 (ก่อสร้างปีเดียว) ที่เสี่ยงสูง

ลำดับ	ชื่อรายการตาม พรบ.	ชื่อสถานที่	จังหวัด	ทำถึงขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง	งวดงานทั้งสิ้น	ปัจจุบันดำเนินการถึงงวดงานที่	จำนวนงวดงานที่ล่าช้า	สาเหตุความล่าช้า	เดือนที่คาดว่าจะเบิกจ่ายเหลื่อมปีแล้วเสร็จ	สถานะความเสี่ยง
6	บ้านพักข้าราชการระดับปฏิบัติงาน (บ้านแฝด) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 130 ตารางเมตร โรงพยาบาลทุ่งฝน ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง	โรงพยาบาลทุ่งฝน	อุดรธานี	22.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตรวจรับงานจ้าง	5	2	2	การก่อสร้างล่าช้าเนื่องจากโรงพยาบาลทุ่งฝนส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างไม่ได้ เพราะทำการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิมยังไม่แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างผู้รับจ้างทำการขยายระยะเวลาก่อสร้าง	ม.ค.-68	เสี่ยงสูง
12	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 480 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลหนองหิน ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย 1 หลัง	โรงพยาบาลหนองหิน	เลย	18.ผู้ควบคุมงานรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน	7	3	1	ตรวจรับและเบิกจ่ายงวดงานที่1 วันที่ 20ธค67	เม.ย.-68	เสี่ยงสูง
13	บ้านพักข้าราชการระดับปฏิบัติงาน (บ้านแฝด) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 130 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลนาแห้ว ตำบลนาแห้ว อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 1 หลัง	โรงพยาบาลนาแห้ว	เลย	18.ผู้ควบคุมงานรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน	5	2	3	ผู้รับจ้างเป็นคู่สัญญาหลายสัญญากับส่วนราชการทำให้เกิดปัญหาด้านหมุนเวียนแรงงาน อยู่ระหว่างรอส่งมอบงานงวดที่1และ2	ก.ค.-68	เสี่ยงสูง
14	บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ ปฏิบัติการ/ อาวุโส/ ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลพาวัว ตำบลโนนปอแดง อำเภอพาวัว จังหวัดเลย 1 หลัง	โรงพยาบาลพาวัว	เลย	18.ผู้ควบคุมงานรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน	5	3	2	ผู้รับจ้างเป็นคู่สัญญาหลายสัญญากับส่วนราชการทำให้เกิดปัญหาด้านหมุนเวียนแรงงาน อยู่ระหว่างรอส่งมอบงานงวดงานที่1และ2	ก.ค.-68	เสี่ยงสูง
15	บ้านพักข้าราชการระดับปฏิบัติงาน (บ้านแฝด) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 130 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลภูกระดึง ตำบลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 1 หลัง	โรงพยาบาลภูกระดึง	เลย	18.ผู้ควบคุมงานรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน	5	2	3	ผู้รับจ้างรับงานจากส่วนราชการอื่นหลายโครงการและไม่ใช้คนในพื้นที่จังหวัดเลย จึงมีปัญหาด้านการจัดหาแรงงาน อยู่ระหว่างการส่งมอบงานงวดที่2	ก.ค.-68	เสี่ยงสูง
16	บ้านพักข้าราชการระดับอำนวยการต้น/ ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลท่งลี่ ตำบลท่งลี่ อำเภอท่งลี่ จังหวัดเลย 1 หลัง	โรงพยาบาลท่งลี่	เลย	18.ผู้ควบคุมงานรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน	5	3	1	ตรวจรับและเบิกจ่ายงานงวดที่ 3 เมื่อวันที่ 19 ธค 67	ก.ค.-68	เสี่ยงสูง





ผลการดำเนินงานงบลงทุนปี 2567 ที่กันเงินเหลื่อมปี



รายการงบลงทุนปี 2567 เหลื่อมปี 2568 (ก่อสร้างปีเดียว) ที่เสี่ยงสูง

ลำดับ	ชื่อรายการตาม พรบ.	ชื่อสถานที่	จังหวัด	ทำถึงขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง	งวด งาน ทั้งสิ้น	ปัจจุบัน ดำเนินการ ถึงงวด งานที่	จำนวน งวด งานที่ ล่าช้า	สาเหตุความล่าช้า	เดือนที่คาดว่าจะ เบิกจ่ายเหลื่อมปี แล้วเสร็จ	สถานะความเสี่ยง
17	บ้านพักข้าราชการระดับปฏิบัติงาน (บ้านแฝด) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 130 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลนาด้วง ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย 1 หลัง	โรงพยาบาลนาด้วง	เลย	18.ผู้ควบคุมงานรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน	5	1	3	ผู้รับจ้างเป็นคู่สัญญาหลายสัญญากับส่วนราชการทำให้เกิดปัญหาด้านหมุนเวียนแรงงาน อยู่ระหว่างการส่งมอบงานงวดที่2	ก.ค.-68	เสี่ยงสูง
18	อาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 576 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลปากชม ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย 1 หลัง	โรงพยาบาลปากชม	เลย	18.ผู้ควบคุมงานรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน	5	3	0ไม่มี ล่าช้า	แก้ไขสัญญาเปลี่ยนแปลงฐานรากการก่อสร้าง เมื่อวันที่2ธค67อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 1-3 เป็นไปตามงวดงาน	พ.ค.-68	เสี่ยงสูง
21	อาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพ เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 514 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลเอราวัณ ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย	โรงพยาบาลเอราวัณ	เลย	18.ผู้ควบคุมงานรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน	6	2	1	อยู่ระหว่างการแก้ไขสัญญาเนื่องจากมีการขัดแย้งของแบบแปลนกับรายการประกอบแบบ และ BOQ	พ.ค.-68	เสี่ยงสูง
49	บ้านพักข้าราชการระดับอำนวยการต้น/ ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุ่ม ตำบลหนองกุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 1 หลัง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุ่ม	บึงกาฬ	25.เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างตาม งวดงาน	5	1		ดำเนินงานเป็นไปตามสัญญา	พ.ค.-68	เสี่ยงสูง
51	บ้านพักข้าราชการระดับอำนวยการต้น/ ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากกแดง ตำบลท่ากกแดง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 1 หลัง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากกแดง	บึงกาฬ	25.เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างตาม งวดงาน	5	2		ดำเนินงานเป็นไปตามสัญญา	พ.ค.-68	เสี่ยงสูง





ผลการดำเนินงานงบประมาณปี 2567 ที่กันเงินเหลื่อมปี



รายการงบประมาณปี 2567 เหลื่อมปี 2568 (ก่อสร้างปีเดียว) ที่เสี่ยงปานกลาง และส่งมอบงานล่าช้าตั้งแต่ 3 งวดงานขึ้นไป

ลำดับ	ชื่อรายการตาม พรบ.	ชื่อสถานที่	จังหวัด	ทำถึงขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง	งวด งาน ทั้งสิ้น	ปัจจุบัน ดำเนินการ ถึงงวด งานที่	จำนวน งวด งานที่ ล่าช้า	สาเหตุความล่าช้า	เดือนที่คาดว่าจะ เบิกจ่ายเหลื่อมปี แล้วเสร็จ	สถานะความเสี่ยง
25	บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ ปฏิบัติการ/ อาวุโส/ ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่านศรีสุข ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย 1 หลัง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่านศรีสุข	หนองคาย	17.ผู้รับจ้างก่อนเริ่มงานก่อสร้างตามแผนแผนบริหารสัญญาและแผนควบคุมงาน	5	1	3	ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างล่าช้า ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างในงวดที่ 1 ตามสัญญาควรอยู่ในงวดงานที่ 3	มี.ค.-68	เสี่ยงปานกลาง
26	บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ ปฏิบัติการ/ อาวุโส/ ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเทพประทับ ตำบลนาจั่ว อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 1 หลัง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเทพประทับ	หนองคาย	17.ผู้รับจ้างก่อนเริ่มงานก่อสร้างตามแผนแผนบริหารสัญญาและแผนควบคุมงาน	5	1	3	ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างล่าช้า ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างในงวดที่ 1 ตามสัญญาควรอยู่ในงวดที่ 3	เม.ย.-68	เสี่ยงปานกลาง
48	บ้านพักข้าราชการระดับอำนวยการต้น/ ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนหญ้านาง ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 1 หลัง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนหญ้านาง	บึงกาฬ	25.เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างตามงวดงาน	5	2	4	ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างล่าช้า ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างในงวดที่ 2 ตามสัญญาควรอยู่ในงวดงานที่ 4	ธ.ค.-67	เสี่ยงปานกลาง





ผลการดำเนินงานงบลงทุนปี 2567 ที่กันเงินเหลื่อมปี



สถานะดำเนินการงบลงทุน ปี 2567 ที่กันเงินเหลื่อมปีใช้จ่ายปี 2568 (ก่อสร้างผูกพัน) แยกรายจังหวัด

ลำดับ	จังหวัด	จำนวน ทั้งหมด (รายการ)	ทำถึงขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง						จำนวนงวดงานที่ล่าช้า					สถานะความเสี่ยง				
			จัดทำแผน/ TOR/BOQ	รอลงนาม สัญญา	ลงนาม สัญญา	เริ่มงาน ก่อสร้าง ตามแผน	ผู้ควบคุม งานรายงาน สรุป	เบิก จ่ายเงิน ตามงวด	มากกว่า 2 งวด					เสี่ยงต่ำ เสี่ยงกลาง เสี่ยงสูง เสี่ยงพบ				
					ไม่มีล่าช้า	ช้า 1 งวด	ช้า 2 งวด	จำนวน		ร้อยละ	ไม่มีข้อมูล							
1	อุดรธานี	5	0	0	0	5	0	0	4	0	0	0.00%	1	0	4	1	0	
2	สกลนคร	4	1	1	0	0	0	2	0	0	4	100.00%	0	0	1	2	1	
3	นครพนม	2	1	1	0	0	0	0	0	0	2	100.00%	0	0	0	2	0	
4	เลย	3	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0.00%	1	0	2	1	0	
5	หนองคาย	3	0	0	0	2	0	1	0	0	1	33.33%	2	0	3	0	0	
6	หนองบัวลำภู	2	1	0	1	0	0	0	0	1	1	50.00%	0	0	0	2	0	
7	บึงกาฬ	2	0	0	0	1	1	0	0	0	1	50.00%	1	0	1	1	0	
ผลรวม		21	3	2	1	8	4	3	0	6	1	9	42.86%	5	0	11	9	1



ผลการดำเนินงานงบประมาณปี 2567 ที่กันเงินเหลื่อมปี



รายการงบประมาณปี 2567 เหลื่อมปี 2568 (ก่อสร้างผูกพัน)ที่เสี่ยงสูง และเสี่ยงพัว

ลำดับ	ชื่อรายการตาม พรบ.	ชื่อสถานที่	จังหวัด	ทำถึงขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง	งวด งาน ทั้งสิ้น	ปัจจุบัน ดำเนินการ ถึงงวด งานที่	จำนวน งวด งานที่ ล่าช้า	สาเหตุความล่าช้า	เดือนที่คาดว่าจะ เบิกจ่ายเหลื่อมปี แล้วเสร็จ	สถานะความเสี่ยง
1	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,724 ตารางเมตร โรงพยาบาลสุพรรณคูหา ตำบลสุพรรณคูหา อำเภอสุพรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 1 หลัง	โรงพยาบาลสุพรรณคูหา	หนองบัวลำภู	15.ส่งสำเนาสัญญา/ข้อตกลง ให้ สตง. และกรมสรรพากร	10	1	2	สัญญาลงนามเมื่อ29ตุลาคม2567	ธ.ค.-68	เสี่ยงสูง
2	อาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 936 ตารางเมตร โรงพยาบาลหนองบัวลำภู ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 1 หลัง	โรงพยาบาลหนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	3.กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ/ขอบเขตของงาน (TOR) /BOQ	8	0	8	ยกเลิกประกาศประกวดราคา เมื่อวันที่ 1 ต.ค.67 และขอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางประกวดราคาbidding ใหม่	ก.ย.-68	เสี่ยงสูง
7	อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,796 ตารางเมตร โรงพยาบาลหนองหาน ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง	โรงพยาบาลหนองหาน	อุดรธานี	16. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้าง ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้างก่อนเริ่มงานก่อสร้างเพื่อวางแผนบริหารสัญญาและแผนควบคุมงาน	12			นัดตรวจผังก่อสร้างและชี้จุดทดสอบดิน ประมาณวันที่ 25 ธันวาคม 2567	ส.ค.-68	เสี่ยงสูง
19	หอผู้ป่วยใน 7 ชั้น (จำนวน 156 เตียง) เป็นอาคาร คสล.7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,184 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลวังสะพุง ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 1 หลัง	โรงพยาบาลวังสะพุง	เลย	18.ผู้ควบคุมงานรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน	20			อยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามในสัญญา	ก.ย.-68	เสี่ยงสูง
40	อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุฉุกเฉิน บำบัดรักษาและสำนักงาน เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 11,600 ตารางเมตร โรงพยาบาลพังโคน ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 1 หลัง	โรงพยาบาลพังโคน	สกลนคร	11.จัดทำบันทึกรายงานผลการพิจารณา	19	0	19	อยู่ระหว่างเสนอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างให้ พวจ.ลงนามหนังสือ แจ้งปลัดกระทรวง อนุมัติสั่งจ้างต่อไป	ก.ย.-68	เสี่ยงพัว



ผลการดำเนินงานงบลงทุนปี 2567 ที่กันเงินเหลื่อมปี



รายการงบลงทุนปี 2567 เหลื่อมปี 2568 (ก่อสร้างผูกพัน)ที่เสี่ยงสูง และเสี่ยงพับ

ลำดับ	ชื่อรายการตาม พรบ.	ชื่อสถานที่	จังหวัด	ทำถึงขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง	งวด งาน ทั้งสิ้น	ปัจจุบัน ดำเนินการ ถึงงวด งานที่	จำนวน งวด งานที่ ล่าช้า	สาเหตุความล่าช้า	เดือนที่คาดว่าจะ เบิกจ่ายเหลื่อมปี แล้วเสร็จ	สถานะความเสี่ยง
41	อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,919 ตารางเมตร โรงพยาบาลบ้านม่วง ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 1 หลัง	โรงพยาบาลพระ อาจารย์มั่น ภูริทัตโต	สกลนคร	1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	10	0	10	เสนอราคากลางจังหวัด ให้ รองพวจ.ลงนาม ภายในอาทิตย์หน้า	ก.ย.-68	เสี่ยงสูง
42	ห้องชุดครอบครัว 24 ครอบครัว เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 819 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่องดาว ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 1 หลัง	โรงพยาบาลพระ อาจารย์วัน อุตต	สกลนคร	25.เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างตาม งวดงาน	8	1	7	อยู่ระหว่างก่อสร้าง งวดที่ 1	พ.ค.-68	เสี่ยงสูง
45	อาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง (มาตรฐาน) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,508 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลศรีสงคราม ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 1 หลัง	โรงพยาบาลศรีสงคราม	นครพนม	11.จัดทำบันทึกรายงานผลการ พิจารณา	8	0	8	ทำหนังสือถึง สป.เพื่อให้ความเห็นชอบราคาที่ผู้ เสนอราคาขึ้นสูงกว่าราคาดบประมาณ (ราคา งบประมาณ 45,798,800 บาท) (ราคาที่ขึ้น 47,936,000 บาท รอหนังสือตอบกลับจาก สป. เนื่องจากผู้เสนอราคาขึ้นราคาสูงเกินกว่าราคา งบประมาณ (ราคาดบประมาณ 45,798,800 ราคาที่ขึ้น 47,936,000	มิ.ย.-68	เสี่ยงสูง
46	อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,919 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลนาหว้า ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 1 หลัง	โรงพยาบาลนาหว้า	นครพนม	3.กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ/ ขอบเขตของงาน (TOR) /BOQ	10	0	10	ยกเลิกประกาศ เพื่อประกาศครั้งที่ 2	มิ.ย.-68	เสี่ยงสูง
57	อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 23,765 ตารางเมตรโรงพยาบาลบึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 หลัง	โรงพยาบาลบึงกาฬ	บึงกาฬ	17.ผู้รับจ้างก่อนเริ่มงานก่อสร้าง ตามแผนแผนบริหารสัญญาและ แผนควบคุมงาน		1	6	เนื่องจาก สัญญาจ้างก่อสร้าง ลงนามในวันที่ 11 มีนาคม 2567 เริ่มเข้าดำเนินการก่อสร้างใน เดือนเมษายน 2567 ** การดำเนินงานก่อสร้าง ในงวดงานที่ 1 การก่อสร้างฐานราก อยู่ในช่วง ฤดูฝน ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2567- เดือน สิงหาคม 2567 มีน้ำท่วมขังฐานราก และบริเวณ โครงการก่อสร้างเป็นบ่อน้ำเดิม (ตาน้ำ) ทำให้มี น้ำซึม ส่งผลให้ไม่สามารถเข้าดำเนินการ	ม.ค.-68	เสี่ยงสูง





ผลการดำเนินงานงบลงทุนปี 2567 ที่กันเงินเหลื่อมปี



รายการงบลงทุนปี 2567 เหลื่อมปี 2568 (ก่อสร้างผูกพัน)ที่เสี่ยงปานกลาง และส่งมอบงานล่าช้าตั้งแต่ 3 งวดงานขึ้นไป

ลำดับ	ชื่อรายการตาม พรบ.	ชื่อสถานที่	จังหวัด	ทำถึงขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง	งวดงาน ทั้งสิ้น	ปัจจุบัน ดำเนินการ ถึงงวด งานที่	จำนวน งวด งานที่ ล่าช้า	สาเหตุความล่าช้า	เดือนที่คาดว่าจะ เบิกจ่ายเหลื่อมปี แล้วเสร็จ	สถานะความเสี่ยง
39	อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,410 ตารางเมตร โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้นอาจาโร ตำบลพรรณานิคม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 1 หลัง	โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้นอาจาโร	สกลนคร	25.เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างตามงวดงาน	7	1	6	อยู่ระหว่างก่อสร้าง งวดที่ 1	มี.ค.-68	เสี่ยงปานกลาง
61	อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ห้องคลอด ห้องผ่าตัดและ ICU ขนาด 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 28,176 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ตำบลท่าบ่อ อำเภوتاบ่อ จังหวัดหนองคาย 1 หลัง	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ	หนองคาย	25.เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างตามงวดงาน	19	17	3	1.ขอยายเวลาเนื่องจากส่งพื้นที่ก่อสร้างล่าช้า 2.ขอยายเวลาเนื่องจากเปลี่ยนแปลงความยาวเสาเข็ม 3.ติดสถานการณ์ COVID-19	มี.ค.-68	เสี่ยงปานกลาง



ผลการดำเนินงานงบลงทุนปี 2567(งบกลาง)



สถานะดำเนินการงบลงทุน (งบกลาง) ปี 2567 (ครุภัณฑ์) แยกรายจังหวัด

ลำดับ	จังหวัด	จำนวนทั้งหมด (รายการ)					เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	
			ประกาศเชิญชวน	รอลงนาม	ลงนามสัญญา	กรรมการตรวจรับ	รายการ	ร้อยละ
1	อุดรธานี	21	0	0	13	1	7	33.33%
2	สกลนคร	47	0	16	31	0	0	0.00%
3	นครพนม	11	0	0	11	0	0	0.00%
4	เลย	66	22	10	31	0	3	4.55%
5	หนองคาย	25	0	16	7	2	0	0.00%
6	หนองบัวลำภู	5	0	4	0	1	0	0.00%
7	บึงกาฬ	23	0	23	0	0	0	0.00%
ผลรวม		198	22	69	93	4	10	5.05%



ผลการดำเนินงานงบลงทุนปี 2568 (ครุภัณฑ์)



สถานะดำเนินการงบลงทุน ปี 2568 (ครุภัณฑ์) แยกรายจังหวัด

ลำดับ	จังหวัด	จำนวนทั้งหมด (รายการ)	จัดทำแผน/กำหนด spec		ประกาศเชิญชวน		รอลงนามสัญญา		ลงนามสัญญา		รอส่งมอบ/ตรวจรับ		เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	
			20/12/67	25/12/67	20/12/67	25/12/67	20/12/67	25/12/67	20/12/67	25/12/67	20/12/67	25/12/67	20/12/67	25/12/67
1	อุดรธานี	495	1	1	163	163	235	235	83	65	13	19	0	12
2	สกลนคร	36	1	1	1	1	24	24	10	10	0	0	0	0
3	นครพนม	28	0	0	0	0	0	0	26	26	0	0	2	2
4	เลย	73	0	0	2	2	18	18	50	48	1	3	2	2
5	หนองคาย	127	19	19	16	16	90	90	2	2	0	0	0	0
6	หนองบัวลำภู	502	223	223	20	20	226	226	33	33	0	0	0	0
7	บึงกาฬ	15	3	3	3	3	5	5	4	4	0	0	0	0
ผลรวม		1,276	247	247	205	205	598	598	208	188	14	22	4	16



ผลการดำเนินงานงบลงทุนปี 2568 (สิ่งก่อสร้าง)



สถานะดำเนินการงบลงทุน ปี 2568 (สิ่งก่อสร้าง) แยกรายจังหวัด

ลำดับ	จังหวัด	จำนวน ทั้งหมด (รายการ)	ทำถึงขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง					สถานะดำเนินการ						สถานะความเสี่ยง			
			จัดทำแผน/ TOR/BOQ	ประกาศเชิญ ชวน	รอลงนาม สัญญา	ลงนามสัญญา	เริ่มก่อสร้าง/ จัดหาตามแผน	ยังไม่ได้ผู้ รับจ้าง	รอแบบ/ BOQ จาก กสบส.	รอลงนาม	ลงนาม สัญญา	เริ่ม ก่อสร้าง/ จัดหา	บริหาร สัญญา	เสี่ยงต่ำ (รายการ)	เสี่ยงกลาง (รายการ)	เสี่ยงสูง (รายการ)	ร้อยละ
1	อุดรธานี	14	7	4	1	2	0	9	1	1	2	0	1	0	3	11	78.57%
2	สกลนคร	4	1	0	3	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	4	100.00%
3	นครพนม																
4	เลย	3	2	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	0	3	100.00%
5	หนองคาย	4	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4	100.00%
6	หนองบัวลำภู	7	7	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	4	2	1	14.29%
7	บึงกาฬ	5	0	0	1	4	0	1	0	0	0	4	0	1	0	4	80.00%
ผลรวม		37	21	4	5	6	1	22	3	4	3	4	1	5	5	27	72.97%



ผลการดำเนินงานงบลงทุนปี 2568 (สิ่งก่อสร้าง)



สถานะดำเนินการงบลงทุน ปี 2568 (สิ่งก่อสร้าง) ที่มีความเสี่ยงสูง

ลำดับ	รายการ	ชื่อสถานที่	จังหวัด	ทำถึงขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง	สถานะการดำเนินการ	วันครบกำหนดส่งมอบ	งวดงานทั้งสิ้น	จำนวนงวดงานปี 2568 (ระบุงวดงาน)	ปัจจุบันดำเนินการถึงงวดงานที่	จำนวนงวดงานที่ล่าช้า	สาเหตุความล่าช้า	เดือนที่คาดว่าจะเบิกจ่ายเหลือจบปีแล้วเสร็จ	สถานะความเสี่ยง
1	อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.9 ชั้น และ 1 ชั้นใต้ดิน พื้นที่ใช้สอยประมาณ 31,420 ตารางเมตร	โรงพยาบาลอุดรธานี	อุดรธานี	2.แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่าง TOR/Spec/ราคากลาง	2.รออนุมัติ/BOQ จาก กทมส.								เสี่ยงสูง
2	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง เป็นอาคาร คสล.7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,908 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	โรงพยาบาลโพธิ์ชัย	หนองคาย	3.กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ/ขอบเขตของงาน (TOR) /BOQ	1.ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง								เสี่ยงสูง
4	บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ ปฏิบัติการ/ อาวุโส/ ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	โรงพยาบาลนุ่กคล้า	บึงกาฬ	10.ส่งสำเนาสัญญา/ข้อตกลงให้ สตง.	5.เริ่มก่อสร้าง/ จัดหาตามแผน	11-มิ.ย.-68	5	5	1				เสี่ยงสูง
5	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	โรงพยาบาลปากคาด	บึงกาฬ	10.ส่งสำเนาสัญญา/ข้อตกลงให้ สตง.	5.เริ่มก่อสร้าง/ จัดหาตามแผน	11-มิ.ย.-68	5	5	1				เสี่ยงสูง
6	บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ ปฏิบัติการ/ อาวุโส/ ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	โรงพยาบาลศรีวิไล	บึงกาฬ	10.ส่งสำเนาสัญญา/ข้อตกลงให้ สตง.	5.เริ่มก่อสร้าง/ จัดหาตามแผน	11-มิ.ย.-68	5	5	1				เสี่ยงสูง
7	บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ ปฏิบัติการ/ อาวุโส/ ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	โรงพยาบาลพรเจริญ	บึงกาฬ	10.ส่งสำเนาสัญญา/ข้อตกลงให้ สตง.	5.เริ่มก่อสร้าง/ จัดหาตามแผน	11-มิ.ย.-68	5	5	1				เสี่ยงสูง
9	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	โรงพยาบาลปากชม	เลย	3.กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ/ขอบเขตของงาน (TOR) /BOQ	2.รออนุมัติ/BOQ จาก กทมส.		5	5			รออนุมัติและBOQจากกองแบบแผน เนื่องจากได้รับแจ้งจากผู้ประสานงานของ กทมส. ว่าBOQมีการเปลี่ยนแปลง		เสี่ยงสูง
12	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร	โรงพยาบาลน้ำโสม	อุดรธานี	7.เผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง	1.ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง								เสี่ยงสูง



ผลการดำเนินงานงบลงทุนปี 2568 (สิ่งก่อสร้าง)



สถานะดำเนินการงบลงทุน ปี 2568 (สิ่งก่อสร้าง) ที่มีความเสี่ยงสูง

ลำดับ	รายการ	ชื่อสถานที่	จังหวัด	ทำถึงขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง	สถานะการดำเนินการ	วันครบกำหนดส่งมอบ	งวดงานทั้งสิ้น	จำนวนงวดงานปี 2568 (ระบุงวดงาน)	ปัจจุบันดำเนินการถึงงวดงานที่	จำนวนงวดงานที่ล่าช้า	สาเหตุความล่าช้า	เดือนที่คาดว่าจะเบิกจ่ายเหลือในปีแล้วเสร็จ	สถานะความเสี่ยง
13	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	โรงพยาบาลเฝ้าไร่	หนองคาย	3.กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ/ขอบเขตของงาน (TOR) /BOQ	1.ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง								เสี่ยงสูง
14	อาคารจ่ายกลาง เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 336 ตารางเมตร	โรงพยาบาลศรีธาตุ	อุดรธานี	3.กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ/ขอบเขตของงาน (TOR) /BOQ	1.ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง								เสี่ยงสูง
15	ระบบบำบัดน้ำเสียแบบคูวนเวียน (Oxidation Ditch : OD) ขนาด 60 เตียยง	โรงพยาบาลไชยวาน	อุดรธานี	5.ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา	1.ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง								เสี่ยงสูง
16	บ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 130 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	โรงพยาบาลรัตนวาปี	หนองคาย	3.กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ/ขอบเขตของงาน (TOR) /BOQ	1.ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง								เสี่ยงสูง
17	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 480 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	โรงพยาบาลนาด้วง	เลย	3.กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ/ขอบเขตของงาน (TOR) /BOQ	2.รอแบบ/BOQ จาก กบรส.		8	8			รอแบบแปลนและBOQจากกองแบบแผน เนื่องจากได้รับแจ้งจากผู้ประสานงานของ กบรส. ว่าBOQมีการเปลี่ยนแปลง		เสี่ยงสูง
18	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร	โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้นอาจาโร	สกลนคร	13.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา	3.รอลงนาม						อยู่ระหว่างสรุปผลการประกวดราคา	มิ.ย.-68	เสี่ยงสูง
19	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร	โรงพยาบาลส่องดาว	สกลนคร	13.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา	3.รอลงนาม						อยู่ระหว่างสรุปผลการประกวดราคา	มิ.ย.-68	เสี่ยงสูง
20	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร	โรงพยาบาลกุสุมาลย์	สกลนคร	13.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา	3.รอลงนาม						อยู่ระหว่างสรุปผลการประกวดราคา	มิ.ย.-68	เสี่ยงสูง



ผลการดำเนินงานงบลงทุนปี 2568 (สิ่งก่อสร้าง)



สถานะดำเนินการงบลงทุน ปี 2568 (สิ่งก่อสร้าง) ที่มีความเสี่ยงสูง

ลำดับ	รายการ	ชื่อสถานที่	จังหวัด	กำลังขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง	สถานะการดำเนินการ	วันครบกำหนดส่งมอบ	งวดงานที่สิ้น	จำนวนงวดงานปี 2568 (ระบุงวดงาน)	ปัจจุบันดำเนินการถึงงวดงานที่	จำนวนงวดงานที่ล่าช้า	สาเหตุความล่าช้า	เดือนที่คาดว่าจะเบิกจ่ายเหลือเมื่อแล้วเสร็จ	สถานะความเสี่ยง
22	ปรับปรุงห้องทำงานเจ้าหน้าที่บริเวณด้านหลังอาคาร	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฝ้อ	อุดรธานี	1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง							ส่งคืนงบประมาณเนื่องจากเป็นรายการซ้ำซ้อนกับงบประมาณปี67		เสี่ยงสูง
26	ปรับปรุงอาคารสำนักงาน	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ	อุดรธานี	1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1.ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง						ส่งคืนงบประมาณเนื่องจากเป็นรายการซ้ำซ้อนกับงบประมาณปี67		เสี่ยงสูง
27	ปรับปรุงห้องประชุมสำนักงาน	สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8	อุดรธานี	1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1.ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง								เสี่ยงสูง
31	ปรับปรุงห้อง DATA/Monitoring	โรงพยาบาลนาหว้าเฉลิมพระเกียรติ 80	หนองบัวลำภู	2.แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่าง TOR/Spec/ราคากลาง	1.ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง						รอแบบแปลนและ ปร.4,5, BOQ จากพื้นที่		เสี่ยงสูง
33	อาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพ (ระดับปฐมภูมิ) เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 611 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	โรงพยาบาลรัตนวาปี	หนองคาย	3.กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ/ขอบเขตของงาน (TOR) /BOQ	1.ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง								เสี่ยงสูง
34	ปรับปรุงห้อง Datacenter	โรงพยาบาลอุดรธานี	อุดรธานี	1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1.ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง								เสี่ยงสูง
36	ปรับปรุงห้อง Datacenter	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง	อุดรธานี	9.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP/ ปิดประกาศ/ส่งให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	3.รอลงนาม						ล่าช้าเนื่องจากการปรับราคาบางรายการ และแบบรูปรายการบางส่วน จะจัดทำรายงานข้อข้อย่างภายในวันที่ 16 ร.ค. 67		เสี่ยงสูง
37	ปรับปรุงห้อง Datacenter	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี	อุดรธานี	6.เจรจาตกลงกับผู้ประกอบการโดยตรง	1.ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง						ล่าช้าเนื่องจากการปรับราคาบางรายการ และแบบรูปรายการบางส่วน จะจัดทำรายงานข้อข้อย่างภายในวันที่ 16 ร.ค. 67		เสี่ยงสูง



การดำเนินงานงบลงทุนปี 2568 (รายการผูกพันเดิม)



สถานะดำเนินการงบลงทุน ปี 2568 (รายการผูกพันเดิม)


รายละเอียดรายการ							ร่างพรบ. 68			รายละเอียดแผนงาน โครงการ กิจกรรม			
เขต	รายการ	วงเงินลงนาม สัญญา ปัจจุบัน (บาท)	จำนวน (หน่วย)	รวม 2554 - 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	2567 (บาท)	วงเงิน ร่างพรบ. 68 (บาท)	ตั้งงบปี 69 (บาท)	รวมทั้งสิ้น	ข้อมูลค่าเสาเข็ม (บาท)	สถานะ ผูกพันสัญญา= ลงนามแล้ว	หน่วยงาน	จังหวัด
8	อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ห้องคลอด ห้องผ่าตัดและ ICU ขนาด 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 28,176 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 1 หลัง	743,482,042.50	1.00	392,113,700.00	192,357,200	107,222,600.00	51,788,600.00	-	743,482,100.00	3,645,485.50	ผูกพันสัญญา	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ	หนองคาย
8	อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 23,765 ตารางเมตร โรงพยาบาลบึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 หลัง	377,607,773.00		16,503,100.00	186,325,800	45,313,000.00	-	145,805,200.00	393,947,100.00		ผูกพันสัญญา	โรงพยาบาลบึงกาฬ	บึงกาฬ
8	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,250 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 1 หลัง	141,207,400.00	1.00	49,709,900.00	31,236,400	-	60,261,000.00	-	141,207,300.00	- 3,681,500.00	ผูกพันสัญญา	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม	นครพนม
8	อาคารพักคนไข้ เป็นอาคาร คสล.10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,206 ตารางเมตร โรงพยาบาลสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 หลัง	147,400,000.00	1.00	30,028,400.00	33,671,600	-	83,700,000.00	-	147,400,000.00		ผูกพันสัญญา	โรงพยาบาลสกลนคร	สกลนคร
8	หอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (จำนวน 114 เตียง) เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,797 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลโพธิ์ชัย ตำบลจุมพล อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย 1 หลัง	93,000,000.00	1.00	-	21,450,600	8,495,400.00	63,054,000.00	-	93,000,000.00		ผูกพันสัญญา	โรงพยาบาลโพธิ์ชัย	หนองคาย



การบริหารจัดการงบค่าบริการทางการแพทย์ ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) เขตสุขภาพที่ 8



การบริหารจัดการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2567 เขตสุขภาพที่ 8

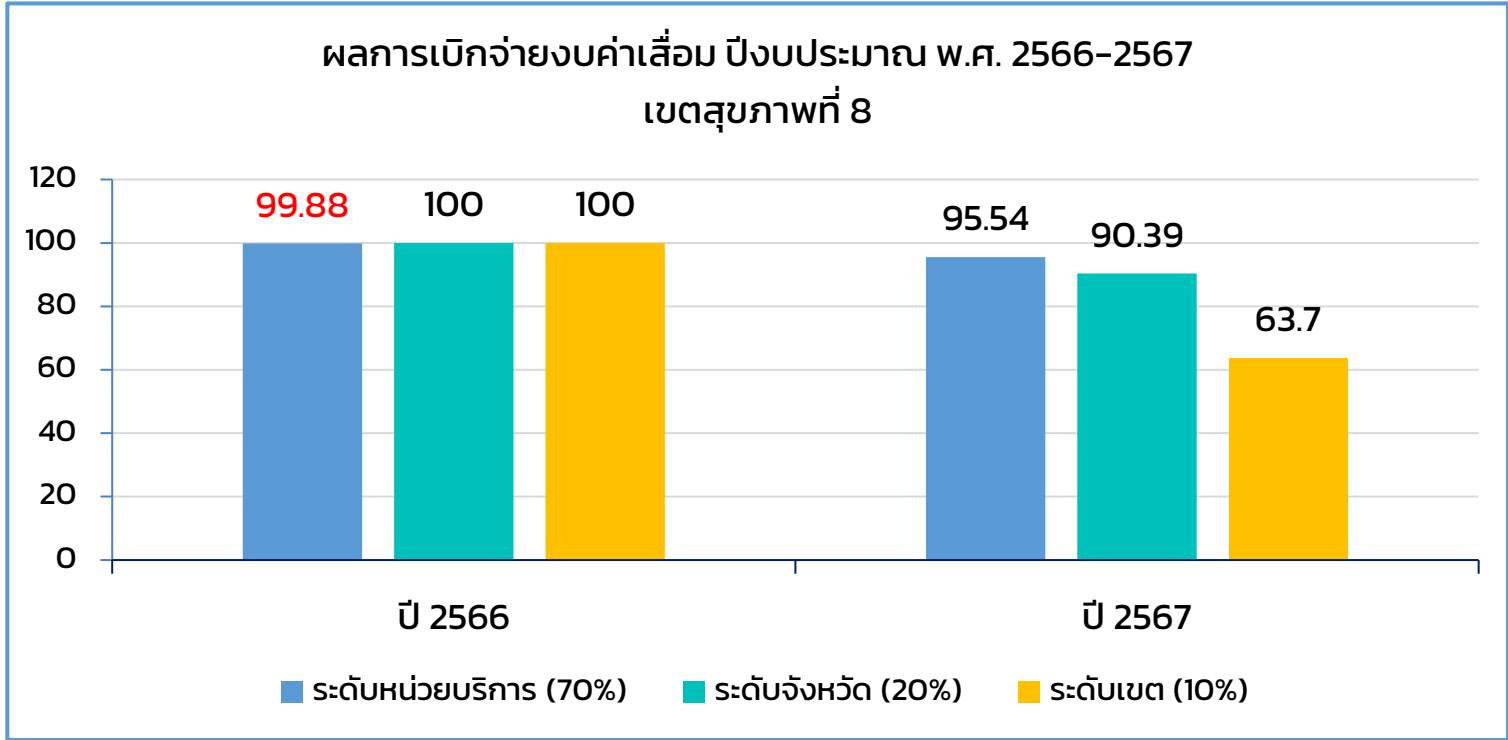

ภาพรวมการจัดสรร ปี 2567 วงเงินทั้งสิ้น 534,528,080.24 บาท			
รายการ	70%	20%	10%
จัดสรร	365,271,758.19 (2,847 รายการ)	104,363,359.49 (541 รายการ)	52,181,679.74 (135 รายการ)
เบิกจ่าย	178,095,082.40 (2,304 รายการ)	45,750,275.85 (403 รายการ)	20,839,679.74 (61 รายการ)
คงเหลือ	187,176,675.79 (543 รายการ)	58,613,083.64 (138 รายการ)	31,342,000 (74 รายการ)

*รายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ปี 2566

อุดรธานี : รพ.อุดรธานี


วงเงินระดับหน่วยบริการ (70%)

- รายการก่อสร้าง วงเงิน 12,461,862.00 บาท
- ซ่อมแซมระบบปรับอากาศ
- งานพื้นและประตูสำหรับห้องผ่าตัด
- จำนวน 4 ห้อง

ผลการดำเนินงาน :

- ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
- ทำขยายเวลาถึง มีนาคม 2568

วงเงินและร้อยละการเบิกจ่าย (งบค่าเสื่อม) ในสังกัด สป.สร. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

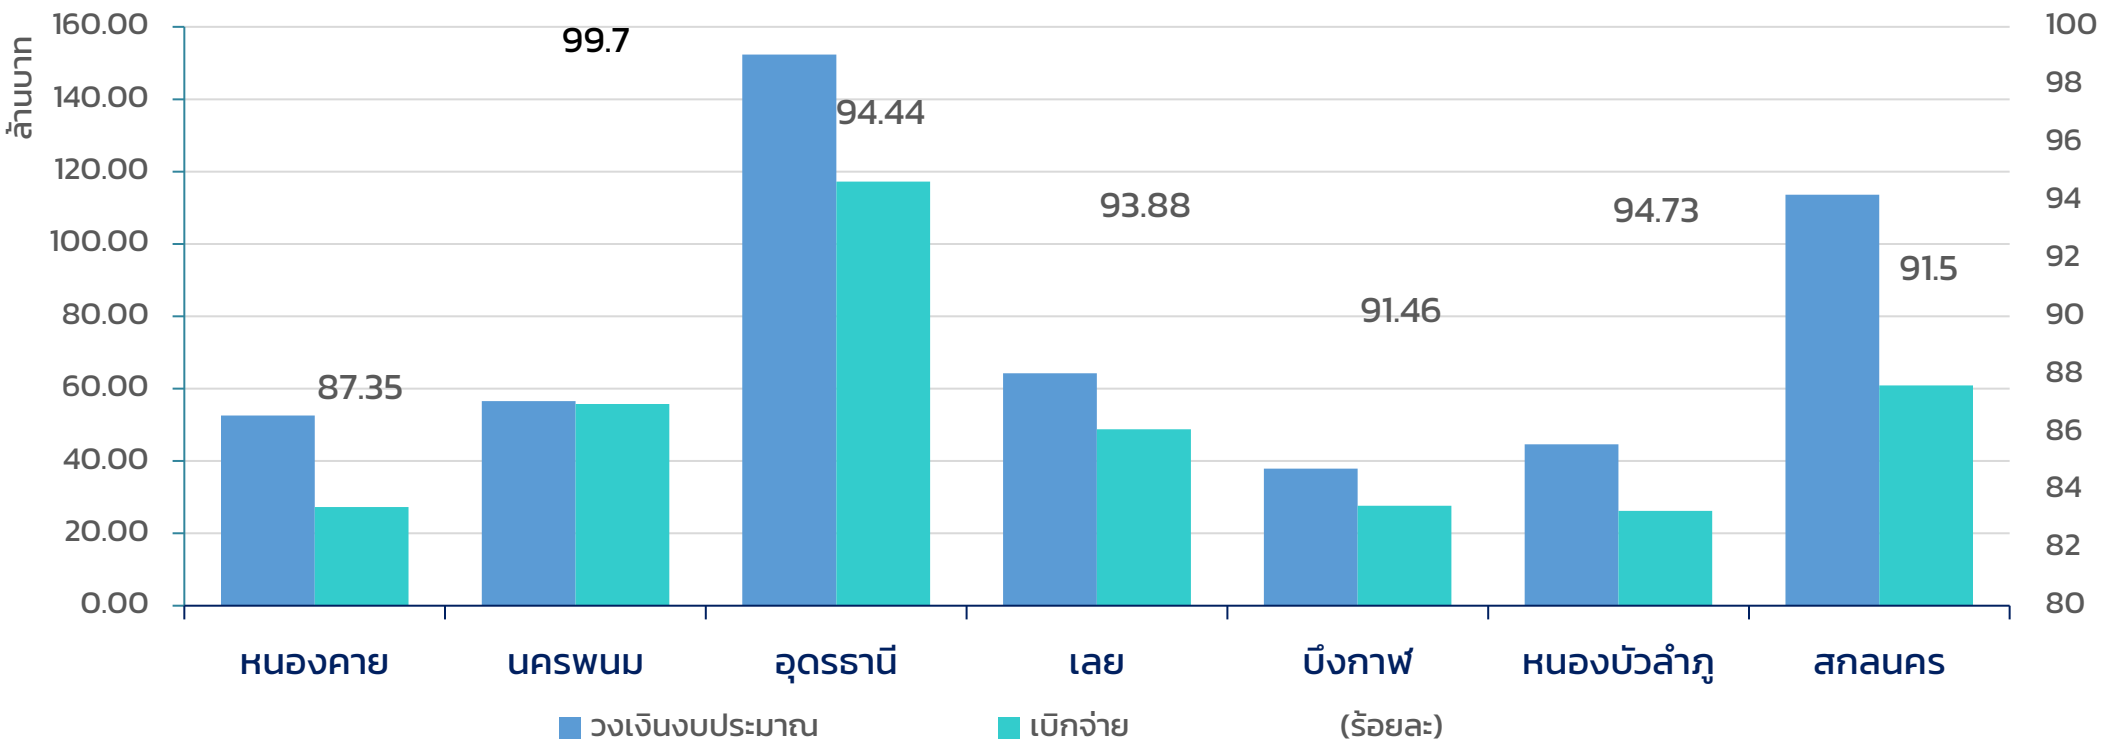



สรุปสถานการณ์ดำเนินงาน (ตามจำนวนรายการ) ปีงบประมาณ 2567 ประเภทบ ในสังกัด สป.สร. เขตสุขภาพที่ 8




ลำดับ	จังหวัด	วงเงินงบประมาณ	รายการ	จัดทำแผนการจัดซื้อ/จ้างแล้ว		ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้างแล้ว		ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว		ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว		เบิกจ่ายเงินแล้ว					
				รายการ	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	งบตามแผน	งบที่ใช้ไป	เงินเหลือจ่าย	%เงินเหลือจ่าย
1	หนองคาย	52,570,194.50	324	0	0	7	2.16	19	5.86	15	4.63	283	87.35	27,234,837.35	27,141,525.89	93,311.46	0.34
2	นครพนม	56,553,341.14	328	0	0	1	0.3	0	0	0	0	327	99.7	55,783,341.14	55,620,158.29	163,182.85	0.29
3	อุดรธานี	152,357,970.55	953	0	0	5	0.52	35	3.67	13	1.36	900	94.44	117,264,793.85	115,071,061.63	2,193,732.22	1.87
4	เลย	64,203,282.05	490	1	0.2	2	0.41	19	3.88	8	1.63	460	93.88	48,749,282.05	48,549,156.88	200,125.17	0.41
5	บึงกาฬ	37,928,558.17	164	0	0	7	4.27	6	3.66	1	0.61	150	91.46	27,663,000.26	27,299,668.27	363,331.99	1.31
6	หนองบัวลำภู	44,586,238.65	569	8	1.41	8	1.41	14	2.46	0	0	539	94.73	26,173,280.15	26,077,179.68	96,100.47	0.37
7	สกลนคร	113,617,212.36	694	0	0	17	2.45	40	5.76	2	0.29	635	91.5	60,912,621.73	60,434,146.91	478,474.82	0.79
รวม เขต 8		521,816,797.42	3,522	9	0.26	47	1.33	133	3.78	39	1.11	3,294	93.53	363,781,156.53	360,192,897.55	3,588,258.98	0.99



การบริหารจัดการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2567 เขตสุขภาพที่ 8 (ไม่รวม รพ.สต.ถ่ายโอน)



ผลการเบิกจ่ายงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2567
เขตสุขภาพที่ 8

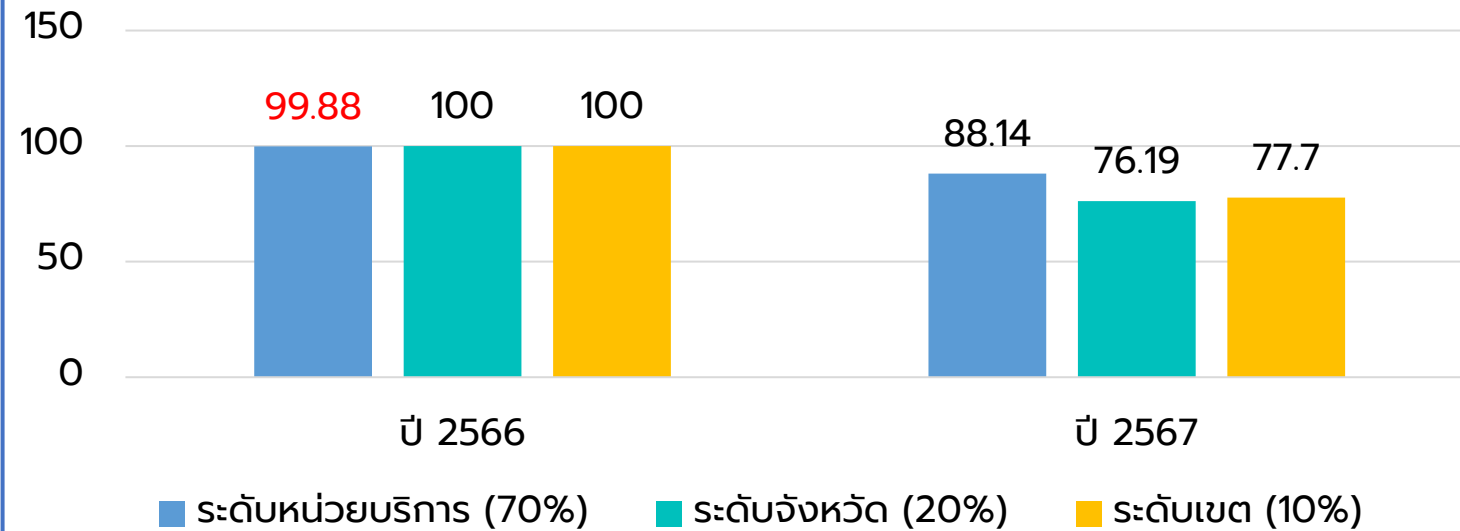

*รายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ปี 2566

อุดรธานี : รพ.อุดรธานี

วงเงินระดับหน่วยบริการ (70%)

- รายการก่อสร้าง วงเงิน 12,461,862.00 บาท
- ซ่อมแซมระบบปรับอากาศ
- งานพื้นและประตูสำหรับห้องผ่าตัด
- จำนวน 4 ห้อง


ผลการดำเนินงาน :

- ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
- ทำขยายเวลาถึง มีนาคม 2568

ภาพรวมการจัดสรร ปี 2567 วงเงินทั้งสิ้น 486,486,750.12 บาท

รายการ	70%	20%	10%
จัดสรร	333,217,010.89 (1,828 รายการ)	101,183,559.49 (475 รายการ)	52,086,179.74 (131 รายการ)
เบิกจ่าย	293,709,447.78 (1,783 รายการ)	77,091,137.85 (455 รายการ)	40,468,504.74 (115 รายการ)
คงเหลือ	39,507,563.11 (45 รายการ)	24,092,421.64 (20 รายการ)	11,617,675.00 (16 รายการ)

วงเงินและร้อยละการเบิกจ่าย (งบค่าเสื่อม) ในสังกัด สป.สร. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

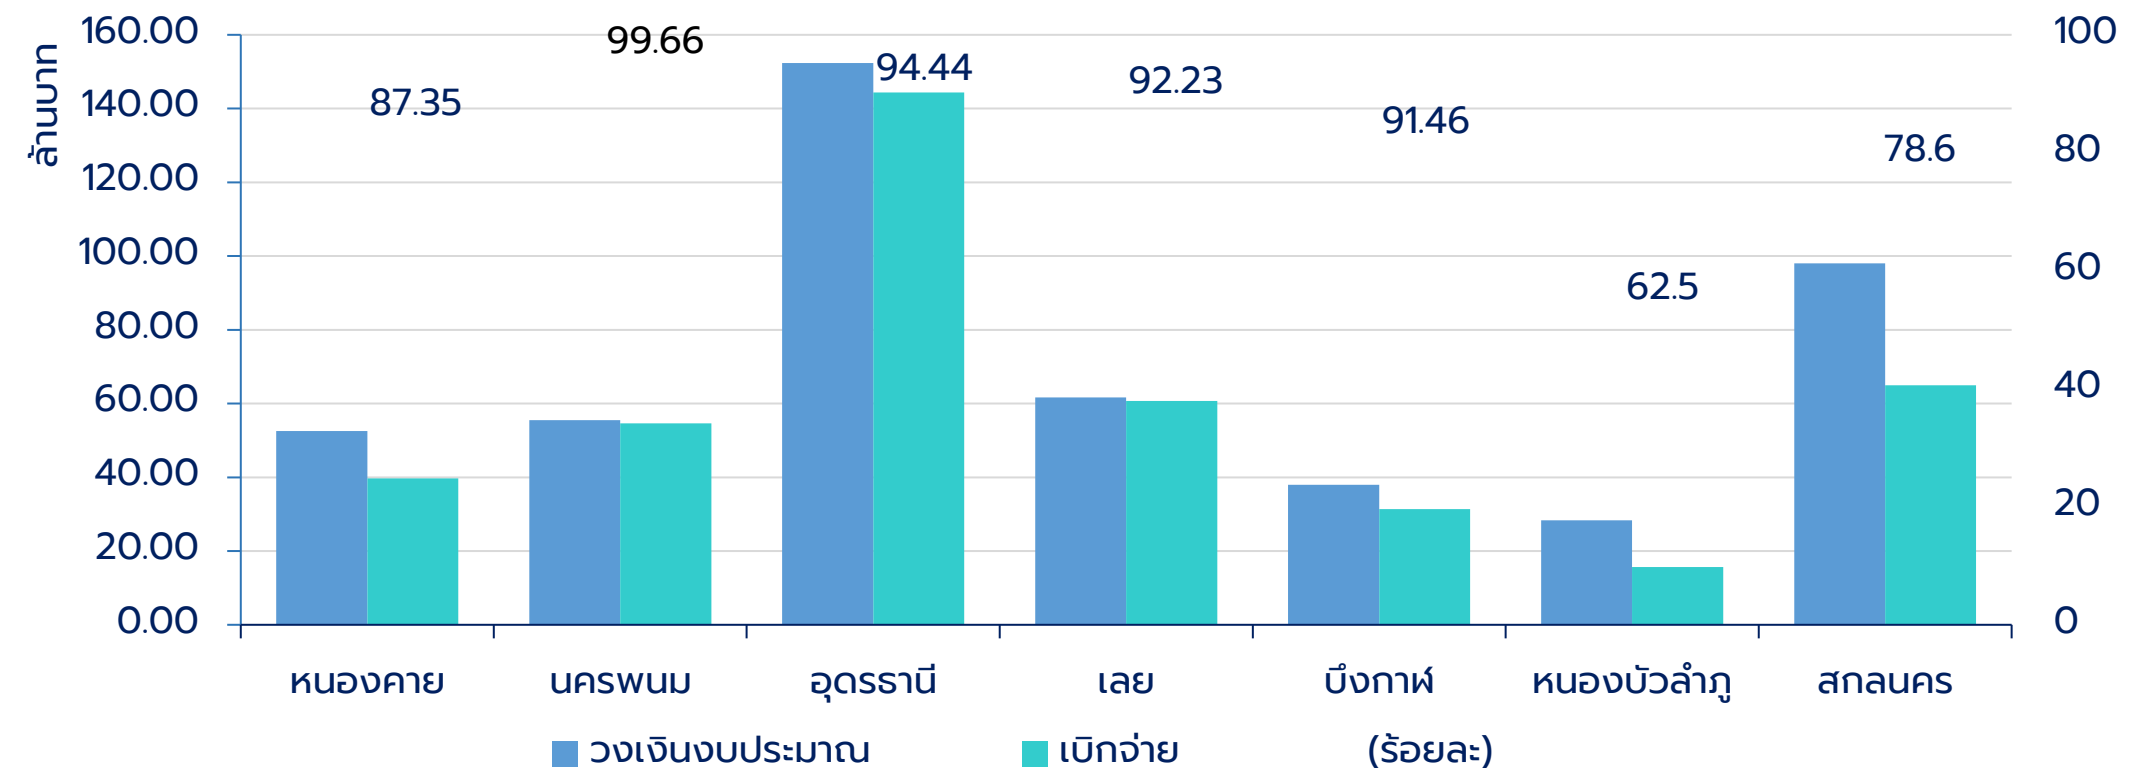



สรุปสถานการณ์ดำเนินงาน (ตามจำนวนรายการ) ปีงบประมาณ 2567 ประเภทบ ในสังกัด สป.สร. เขตสุขภาพที่ 8 (ไม่รวม รพ.สต.ถ่ายโอน)



ลำดับ	จังหวัด	วงเงินงบประมาณ	รายการ	จัดทำแผนการจัดซื้อ/จ้างแล้ว		ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้างแล้ว		ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว		ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว		เบิกจ่ายเงินแล้ว					
				รายการ	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	งบตามแผน	งบที่ใช้ไป	เงินเหลือจ่าย	%เงินเหลือจ่าย
1	หนองคาย	52,570,194.50	324	0	0.00	7	2.16	19	5.86	15	4.63	283	87.35	39,699,593.17	39,606,281.71	93,311.46	0.24
2	นครพนม	55,523,441.14	292	0	0.00	1	0.34	0	0.00	0	0.00	291	99.66	54,598,868.29	54,444,295.44	154,572.85	0.28
3	อุดรธานี	152,357,970.55	953	0	0.00	5	0.52	35	3.67	13	1.36	900	94.44	144,348,896.80	142,155,164.58	2,193,732.22	1.52
4	เลย	61,662,182.05	386	1	0.26	2	0.52	19	4.92	8	2.07	356	92.23	60,679,867.88	60,482,843.71	197,024.17	0.32
5	บึงกาฬ	37,928,558.17	164	0	0.00	7	4.27	6	3.66	1	0.61	150	91.46	31,331,835.91	30,968,503.92	363,331.99	1.16
6	หนองบัวลำภู	28,377,251.61	72	8	11.11	7	9.72	12	16.67	0	0.00	45	62.50	15,682,273.11	15,639,353.11	42,920.00	0.27
7	สกลนคร	98,067,152.10	243	0	0.00	16	6.58	34	13.99	2	0.82	191	78.60	64,927,755.21	64,525,576.39	402,178.82	0.62
รวม เขต 8		486,486,750.12	2,434	9	0.37	45	1.85	125	5.14	39	1.60	2,216	91.04	411,269,090.37	407,822,018.86	3,447,071.51	0.84





Thank You

For Your Attention!

