

รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่าย

งบลงทุน งบค่าเสื่อม

และงบเสียงប់

เขตสุขภาพที่ 8

วาระที่ 3.3

นายแพทย์นพดล พิษณุวงศ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลข
20 กุมภาพันธ์ 2568



ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เขตสุขภาพที่ 8

การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2567 ที่กันเงินเหลือมปีใช้จ่ายปี 2568 แยกรายจังหวัด

ลำดับ	จังหวัด	ก่อสร้างปีเดียว				ก่อสร้างผูกพัน				ครุภัณฑ์				ผลรวม			
		กันเงินสุทธิ	เบิกจ่าย	%การเบิกจ่าย	งบคงเหลือ	กันเงินสุทธิ	เบิกจ่าย	%การเบิกจ่าย	งบคงเหลือ	กันเงินสุทธิ	เบิกจ่าย	%การเบิกจ่าย	งบคงเหลือ	กันเงินสุทธิ	เบิกจ่าย	%การเบิกจ่าย	งบคงเหลือ
1	อุดรธานี	3,313,575.00	2,540,655.00	76.67%	772,920.00	36,647,100.00	5,020,566.00	13.70%	31,626,534.00				0.00	39,960,675.00	7,561,221.00	18.92%	32,399,454.00
2	สกลนคร	4,362,500.00	4,362,500.00	100.00%	-	65,396,200.00	4,151,300.00	6.35%	61,244,900.00	2,936,004.00	2,936,004.00	100.00%	-	72,694,704.00	11,449,804.00	15.75%	61,244,900.00
3	นครพนม				0.00	10,508,900.00	0.00	0.00%	10,508,900.00	1,899,000.00	1,898,000.00	99.95%	1,000.00	12,407,900.00	1,898,000.00	15.30%	10,509,900.00
4	เลย	37,520,128.00	0.00	0.00%	37,520,128.00	27,834,800.00	0.00	0.00%	27,834,800.00	23,493,000.00	23,493,000.00	100.00%	-	88,847,928.00	23,493,000.00	26.44%	65,354,928.00
5	หนองคาย	13,455,969.69	1,224,769.69	9.10%	12,231,200.00	116,685,618.00	0.00	0.00%	116,685,618.00	12,053,800.00	12,053,800.00	100.00%	-	142,195,387.69	13,278,569.69	9.34%	128,916,818.00
6	หนองบัวลำภู				0.00	8,308,600.00	0.00	0.00%	8,308,600.00				0.00	8,308,600.00	0.00	0.00%	8,308,600.00
7	บึงกาฬ	15,662,300.00	1,949,649.00	12.45%	13,712,651.00	39,668,207.95	18,487,955.31	46.61%	21,180,252.64				0.00	55,330,507.95	20,437,604.31	36.94%	34,892,903.64
ผลรวม		74,314,472.69	10,077,573.69	13.56%	64,236,899.00	305,049,425.95	27,659,821.31	9.07%	277,389,604.64	40,381,804.00	40,380,804.00	99.998%	1,000.00	419,745,702.64	78,118,199.00	18.61%	341,627,503.64

การเบิกจ่ายงบประมาณ (งบกลาง) ปี 2567 และงบลงทุน ปี 2568 แยกรายจังหวัด

ลำดับ	จังหวัด	งบลงทุนปี 67 (งบกลาง)				งบลงทุนปี 68 (ครุภัณฑ์)				งบลงทุนปี 68 (สิ่งก่อสร้าง)				ผลรวม			
		วงเงินรวม(บาท)	เบิกจ่าย	%การเบิกจ่าย	งบคงเหลือ	วงเงินรวม(บาท)	เบิกจ่าย	%การเบิกจ่าย	งบคงเหลือ	กันเงินสุทธิ	เบิกจ่าย	%การเบิกจ่าย	งบคงเหลือ	กันเงินสุทธิ	เบิกจ่าย	%การเบิกจ่าย	งบคงเหลือ
1	อุดรธานี	13,000,000.00	695,700.00	5.35%	12,304,300.00	45,792,400.00	22,729,861.50	49.64%	23,062,538.50	559,523,300.00	916,000.00	0.16%	558,607,300.00	618,315,700.00	24,341,561.50	3.94%	593,974,138.50
2	สกลนคร	11,800,000.00	3,500,000.00	29.66%	7,700,000.00	194,340,000.00	3,755,200.00	1.93%	190,584,800.00	113,665,200.00	0.00	0.00%	113,665,200.00	319,805,200.00	7,255,200.00	2.27%	312,550,000.00
3	นครพนม	550,000.00	0.00	0.00%	5,500.00	33,100,000.00	33,075,600.00	99.93%	24,400.00				33,650,000.00	33,075,600.00	98.29%	574,400.00	
4	เลย	16,850,000.00	3,749,000.00	22.25%	7,309,315.00	51,393,000.00	12,412,000.00	24.15%	38,981,000.00	12,377,100.00	0.00	0.00%	12,377,100.00	80,620,100.00	16,161,000.00	20.05%	64,459,100.00
5	หนองคาย	7,600,000.00	392,000.00	5.16%	7,208,000.00	137,720,500.00	817,500.00	0.59%	120,822,300.00	92,429,900.00	0.00	0.00%	89,140,900.00	237,750,400.00	1,209,500.00	0.51%	236,540,900.00
6	หนองบัวลำภู	3,350,000.00	0.00	0.00%	3,350,000.00	24,385,400.00	10,888,775.00	44.65%	9,595,075.00	34,894,300.00	1,027,000.00	2.94%	33,867,300.00	62,629,700.00	11,915,775.00	19.03%	50,713,925.00
7	บึงกาฬ	1,150,000.00	1,000,000.00	86.96%	150,000.00	17,625,000.00	0.00	0.00%	17,625,000.00	20,809,000.00	0.00	0.00%	20,809,000.00	39,584,000.00	1,000,000.00	2.53%	38,584,000.00
ผลรวม		54,300,000.00	9,336,700.00	17.19%	38,027,115.00	504,356,300.00	83,678,936.50	16.59%	400,695,113.50	833,698,800.00	1,943,000.00	0.23%	828,466,800.00	1,392,355,100.00	94,958,636.50	6.82%	1,297,396,463.50

ข้อมูล ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 07.30 น.

ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบลงทุน

สถานะดำเนินการงบลงทุนปี 2567 ที่กันเงินเหลือมปีใช้จ่ายปี 2568 (ก่อสร้างปีเดียว) แยกรายจังหวัด

ลำดับ	จังหวัด	จำนวนทั้งหมด (รายการ)	ประกาศผู้ชนะเสนอราคา	ทำถึงขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง						จำนวนงวดงานที่ล่าช้า					สถานะความเสี่ยง			
				เริ่มงานก่อสร้างตามแผน	ผู้ควบคุมงานรายงานสรุป	ผู้รับจ้างเตรียมส่งมอบ	กรรมการตรวจรับงานจ้าง	เบิกจ่ายเงินตามงวดงาน	เบิกจ่ายงวดสุดท้าย	ไม่มีล่าช้า	ช้า 1 งวด	ช้า 2 งวด	มากกว่า 2 งวด	ไม่มีข้อมูล	เสี่ยงต่ำ	เสี่ยงกลาง	เสี่ยงสูง	
1	อุดรธานี	3	0	0	0	0	0	1	2	0	2	1	0	0.00%	0	2	0	1
2	สกลนคร	4	0	0	0	0	0	1	3	4	0	0	0	0.00%	0	3	1	0
3	นครพนม																	
4	เลย	8	0	0	8	0	0	0	0	2	3	0	3	37.50%	0	0	0	8
5	หนองคาย	7	3	3	0	1	0	0	0	4	0	3	0	0.00%	0	0	7	0
6	หนองบัวลำภู																	
7	บึงกาฬ	10	0	0	0	0	0	10	0	8	0	1	1	10.00%	0	0	10	0
ผลรวม		32	3	3	8	1	0	12	5	18	5	5	4	12.50%	0	5	18	9

หมายเหตุ : รายการที่ต้องหาผู้รับจ้างรายใหม่ อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา 3 รายการ
ข้อมูล ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 07.30 น.

ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบลงทุน

สถานะดำเนินการงบลงทุนปี 67 เหลือปี 68 (ก่อสร้างปีเดียว) **ที่ต้องจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ 3 รายการ**

ลำดับ	ชื่อรายการตาม พรบ.	ชื่อสถานที่	จังหวัด	ทำถึงขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง	สาเหตุความล่าช้า	เดือนที่คาดว่าจะเบิกจ่ายเหลือปีแล้วเสร็จ
25	บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ ปฏิบัติการ/ อาวุโส/ ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่านศรีสุข ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย 1 หลัง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่านศรีสุข	หนองคาย	12.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP/ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/จัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 7 ก.พ.68 ยื่นเสนอราคา 1 ราย อยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างมาทำสัญญา	มี.ค.-68
26	บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ ปฏิบัติการ/ อาวุโส/ ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเทพประทับ ตำบลนาจิว อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 1 หลัง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเทพประทับ	หนองคาย	12.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP/ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/จัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 7 ก.พ.68 ยื่นเสนอราคา 1 ราย อยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างมาทำสัญญา	เม.ย.-68
27	บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ ปฏิบัติการ/ อาวุโส/ ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าสำราญ ตำบลน้ำโมง อำเภอกำแพง จังหวัดหนองคาย 1 หลัง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าสำราญ	หนองคาย	12.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP/ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/จัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 7 ก.พ.68 ยื่นเสนอราคา 3 ราย อยู่ระหว่างเว้นระยะเวลาอุทธรณ์ 7 วันทำการ สิ้นสุดวันที่ 19 ก.พ. 68	มี.ค.-68



สรุปเบื้องต้น ผลการเสนอราคาบ้านพักข้าราชการ 3 รายการ ที่ดำเนินการใหม่

รายการ	งบประมาณ	ราคากลาง	ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	หมายเหตุ
1.บ้านพักข้าราชการ ที่ รพสต.บ้านเทพประทับ อ.สังคม	1,176,000 บาท	1,242,900 บาท	1.บ.เคแพลน ดีวีลอปเม้น จก.	1,176,000 บาท	เสนอรายเดียว
2.บ้านพักข้าราชการ ที่ รพสต.ด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก	1,134,000 บาท	1,242,900 บาท	2.กิจการร่วมค้า K-NON	1,134,000 บาท	เสนอรายเดียว
3.บ้านพักข้าราชการ ที่ รพสต.บ้านท่าสำราญ	1,134,000 บาท	1,242,900 บาท	1.ทจก.ธนภูมิคอนกรีต (2548) 2.กิจการร่วมค้า K-NON 3.บ.สถาปนวิศว์ จก.	1,180,000 บาท 1,134,000 บาท 1,120,000 บาท	เสนอราคา 3 ราย

หมายเหตุ กิจการร่วมค้า K-NON เป็นเจ้าเดียวกับ บ.เคแพลน ดีวีลอปเม้น จก.

ข้อมูล ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 07.30 น.

ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ

สถานะดำเนินการงบประมาณ ปี 2567 ที่กันเงินเหลือมปีใช้จ่ายปี 2568 (ก่อสร้างผูกพัน) แยกรายจังหวัด

ลำดับ	จังหวัด	จำนวนทั้งหมด (รายการ)	ทำถึงขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง						จำนวนงวดงานที่ล่าช้า					สถานะความเสี่ยง				
			จัดทำแผน/TOR/BOQ	รอลงนามสัญญา	ลงนามสัญญา	เริ่มงานก่อสร้างตามแผน	ผู้ควบคุมงานรายงานสรุป	เบิกจ่ายเงินตามงวดงาน	ไม่มีล่าช้า	ล่าช้า 1 งวด	ล่าช้า 2 งวด	มากกว่า 2 งวด	ไม่มีข้อมูล	เสี่ยงต่ำ	เสี่ยงกลาง	เสี่ยงสูง	เสี่ยงพิบ	
1	อุดรธานี	5	0	0	0	2	0	3	0	4	0	0	0.00%	1	0	4	1	0
2	สกลนคร	4	1	1	0	1	0	1	0	0	0	4	100.00%	0	0	1	2	1
3	นครพนม	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	100.00%	0	0	1	1	0
4	เลย	3	0	0	0	3	0	0	1	2	0	0	0.00%	0	0	2	0	1
5	หนองคาย	3	0	0	0	2	0	1	1	0	1	1	33.33%	0	0	3	0	0
6	หนองบัวลำภู	2	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	50.00%	0	0	0	2	0
7	บึงกาฬ	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	50.00%	1	0	1	1	0
ผลรวม		21	3	1	2	10	0	5	2	6	2	9	42.86%	2	0	12	7	2

หมายเหตุ : 1. sw.วังสะพุง ผู้รับจ้างเริ่มเข้างานสัปดาห์นี้แล้ว กบรส.คาดการณ์ว่ามีความเสี่ยงที่จะถูกพิบบงบประมาณสองงวดงาน หากเร่งรัดอาจดำเนินการได้ทันตามกำหนด
 2. sw.พังโคน สำนักงบเห็นชอบราคากลางแล้ว (หนังสือลงวันที่ 31 ม.ค. 68) ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนเสนอ รบว.ลงนามคณะขยายเวลา

ข้อมูล ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 07.30 น.

ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบลงทุน

สถานะดำเนินการงบลงทุน ปี 67 เหลือปี 68 (ก่อสร้างผูกพัน) ที่ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง 3 รายการ, เสียงพัน 2 รายการ

ลำดับ	ชื่อรายการตาม พ.ร.บ.	ชื่อสถานที่	จังหวัด	ทำถึงขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง	สาเหตุความล่าช้า	เดือนที่คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	แผนดำเนินการ	ผลดำเนินการ ณ 19 ก.พ.68	หมายเหตุ
2	อาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 936 ตารางเมตร โรงพยาบาลหนองบัวลำภู ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 1 หลัง	โรงพยาบาลหนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	7.เผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง	1.ยกเลิกประกาศประกวดราคา เมื่อวันที่ 1 ต.ค.67 และขอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกวดราคา bidding ใหม่ /2. อยู่ระหว่างเปิดวิจารณ์ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา 3 วันทำการ สิ้นสุดวันที่ 15 ม.ค.68 /3. ดำเนินการเผยแพร่ประกาศประกวดราคา 12 วันทำการ ประกาศวันที่ 22 ม.ค.68 -7 ก.พ.68 ยื่นเสนอราคา วันที่ 10 ก.พ.68 เปิดพิจารณาได้ 11 ก.พ.68 เป็นต้นไป	ก.ย.-68			
41	อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,919 ตารางเมตร โรงพยาบาลบ้านม่วง ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 1 หลัง	โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต	สกลนคร	7.เผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง	อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศประกวดราคา 20 ม.ค.68 - 18 ก.พ.68 เสนอราคา 19 ก.พ.68	ก.ย.-68	19 ก.พ.68 ผู้ประกอบการยื่นเสนอราคา	19 ก.พ.68 ผู้ประกอบการยื่นเสนอราคา	เป็นไปตามแผน
46	อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,919 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลนาหว้า ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 1 หลัง	โรงพยาบาลนาหว้า	นครพนม	3.กำหนดคุณสมบัติเฉพาะ/ขอบเขตของงาน (TOR) / BOQ	ยกเลิกประกาศ เพื่อประกาศครั้งที่ 2	มี.ย.-68			
19	หอผู้ป่วยใน 7 ชั้น (จำนวน 156 เตียง) เป็นอาคาร คสล.7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,184 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลวังสะพุง ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 1 หลัง	โรงพยาบาลวังสะพุง	เลย	18.ผู้ควบคุมงานรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน	เป็นไปตามงวดงาน กำหนดส่งมอบงานงวดแรก เม.ย. 68	ก.ย.-68			
40	อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุฉุกเฉิน บำบัดรักษาและสำนักงาน เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 11,600 ตารางเมตร โรงพยาบาลพังโคน ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 1 หลัง	โรงพยาบาลพังโคน	สกลนคร	11.จัดทำบันทึกรายงานผลการพิจารณา	อยู่ระหว่างส่งหนังสือไป ที่ กระทรวง อนุมัติสั่งจ้าง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง และส่งสำนักงบประมาณ เพื่อยกขยเวลาการดำเนินงานก่อสร้าง	ก.ย.-68		เสนอ รมว. เพื่อขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อนผูกพันข้ามปี กรณีทำนร.ลงนามทันทีคาดว่าจะแล้วเสร็จ 21 กุมภาพันธ์ 2568	

ข้อมูล ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 07.30 น.

ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบลงทุน

สถานะดำเนินการงบลงทุน (งบกลาง) ปี 2567 (ครุภัณฑ์) แยกรายจังหวัด

ลำดับ	จังหวัด	จำนวนทั้งหมด (รายการ)					เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	
			ประกาศเชิญชวน	รอลงนาม	ลงนามสัญญา	ส่งมอบ/ตรวจรับ	รายการ	ร้อยละ
1	อุดรธานี	21	0	0	4	0	17	80.95%
2	สกลนคร	47	0	0	25	1	21	44.68%
3	นครพนม	11	0	0	0	0	11	100.00%
4	เลย	66	0	0	22	6	38	57.58%
5	หนองคาย	25	0	0	21	0	4	16.00%
6	หนองบัวลำภู	5	0	0	0	5	0	0.00%
7	บึงกาฬ	23	0	0	3	0	20	86.96%
รวม		198	0	0	75	12	111	56.06%

ข้อมูล ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 07.30 น.

ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบลงทุน

สถานะดำเนินการงบลงทุน ปี 2568 (ครุภัณฑ์) แยกรายจังหวัด

ลำดับ	จังหวัด	จำนวนทั้งหมด (รายการ)	จัดทำแผน/กำหนด spec		ประกาศเชิญชวน		รอลงนามสัญญา		ลงนามสัญญา		รอส่งมอบ/ตรวจรับ		เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	
			8/2/68	19/2/68	8/2/68	19/2/68	8/2/68	19/2/68	8/2/68	19/2/68	8/2/68	19/2/68	8/2/68	19/2/68
1	อุดรธานี	495	0	0	0	0	72	71	245	245	97	15	81	164
2	สกลนคร	36	0	0	1	1	0	0	19	19	8	0	8	16
3	นครพนม	28	0	0	0	0	0	0	11	11	0	0	17	17
4	เลย	73	0	0	0	0	2	2	0	0	4	2	67	69
5	หนองคาย	127	2	2	17	12	19	22	84	57	5	32	0	2
6	หนองบัวลำภู	502	2	2	4	4	26	22	384	378	85	14	1	82
7	บึงกาฬ	15	0	0	0	0	0	0	11	11	1	1	3	3
รวม		1,276	4	4	22	17	119	117	754	721	200	64	177	353

ข้อมูล ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 07.30 น.

ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบลงทุน

สถานะดำเนินการงบลงทุน ปี 2568 (ครุภัณฑ์) **ที่อยู่ในขั้นตอนกำหนด TOR /Spec/ราคากลาง และร่างประกาศฯ**

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ชื่อสถานที่	จังหวัด	ทำถึงขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง	สาเหตุความล่าช้า	เดือนที่คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	แผนดำเนินการ	ผลดำเนินการ ณ 19 ก.พ.68	หมายเหตุ
80	เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์เอ็ม กำลังไม่น้อยกว่า 15 kW	1	โรงพยาบาลหนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	3.จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ	รายงานผลการพิจารณา ประกาศประกวดราคาไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติตามที่ sw.กำหนด จึงขอยกเลิกประกาศประกวดราคาใหม่ ลงวันที่ 25/12/2567	ก.ย.-68			
106	ชุดกล้องส่องตรวจทางเดินอาหารด้วยคลื่นความถี่สูง (EUS)	1	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ	หนองคาย	4.ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเพื่อรับคำวิจารณ์		2 ส.ค.68	17 ก.พ. 68 ประกาศเชิญชวนประกวดราคา ผ่านเว็บไซต์	17 ก.พ.- 3 มี.ค.68 ประกาศเชิญชวนประกวดราคา ผ่านเว็บไซต์(10 วันทำการ)	เป็นไปตามแผน
117	เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติด้วยแก๊สเอทิลีนออกไซด์ 100 % แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 150 ลิตร	1	โรงพยาบาลนากลาง	หนองบัวลำภู	2.แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่าง TOR/Spec/ราคากลาง	ประกาศยกเลิกการประกวดราคาลงวันที่ 11 กพ.68 เนื่องจากไม่มีผู้ผ่านเงื่อนไขการเสนอราคา	มี.ค.-68			
176	กล้องส่องตรวจและผ่าตัดกระดูกสันหลัง	1	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ	หนองคาย	4.ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเพื่อรับคำวิจารณ์		27 ส.ค.68	18 ก.พ. 68 แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่าง TOR/Spec/ราคากลาง	18 ก.พ. 68 แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่าง TOR/Spec/ราคากลาง (คกก.ขอกบทวนคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อ)	

ข้อมูล ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 07.30 น.

ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ

สถานะดำเนินการงบประมาณ ปี 2568 (สิ่งก่อสร้าง) แยกรายจังหวัด

ลำดับ	จังหวัด	จำนวนทั้งหมด (รายการ)	ทำถึงขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง							ส่งคืนงบประมาณ	สถานะความเสี่ยง			
			จัดทำแผน/TOR/BOQ/ร่างประกาศ	ประกาศเชิญชวน	รอลงนามสัญญา	ลงนามสัญญา	เริ่มก่อสร้าง/จัดหาตามแผน	คกก.ตรวจรับ	เบิกจ่ายเงินงวดสุดท้าย		เสี่ยงต่ำ (รายการ)	เสี่ยงกลาง (รายการ)	เสี่ยงสูง (รายการ)	ร้อยละ
1	อุดรธานี	14	1	0	2	3	4	0	2	2	1	2	11	78.57%
2	สกลนคร	4	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	4	100.00%
3	นครพนม													
4	เลย	3	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	4	133.33%
5	หนองคาย	4	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4	100.00%
6	หนองบัวลำภู	7	2	0	5	0	0	0	0	0	4	2	1	14.29%
7	บึงกาฬ	5	0	0	1	4	0	0	0	0	5	0	0	0.00%
ผลรวม		37	6	0	11	8	7	0	3	2	10	4	24	64.86%

ข้อมูล ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 07.30 น.

ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบลงทุน

สถานะดำเนินการงบลงทุน ปี 2568 (สิ่งก่อสร้าง) **ที่อยู่ในขั้นตอนกำหนด TOR/BOQ/จัดทำร่างประกาศฯ 6 รายการ**


ลำดับ	รายการ	ชื่อสถานที่	จังหวัด	กำลังขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง	สาเหตุความล่าช้า	เดือนที่คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	แผนดำเนินการ	ผลดำเนินการ ณ 19 ก.พ.68	หมายเหตุ
10	หอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (จำนวน 114 เตียง) เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,797 ตารางเมตร	โรงพยาบาลพังโคน	สกลนคร	3.กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ/ขอบเขตของงาน (TOR) /BOQ	อยู่ระหว่างทำราคากลางจังหวัด				
2	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง เป็นอาคาร คสล.7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,908 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	โรงพยาบาลโพธิ์ชัย	หนองคาย	5.ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา		23 พ.ย..69	10 ก.พ. - 10 มี.ค.68 ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธี e-biding (20 วันทำการ)	เผยแพร่ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา	ล่าช้ากว่าแผน
33	อาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพ (ระดับปฐมภูมิ) เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 611 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	โรงพยาบาลรัตนวาปี	หนองคาย	5.ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา		7 ก.พ.69	10 -26 ก.พ.68 ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธี e-biding (12 วันทำการ)	เผยแพร่ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา	ล่าช้ากว่าแผน
8	อาคารทันตกรรม 8 ยูนิต เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 766 ตารางเมตร	โรงพยาบาลสุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	3.กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ/ขอบเขตของงาน (TOR) /BOQ	นัดประชุม กก.กำหนดราคากลาง ,ร่างขอบเขตงานก่อสร้าง ในวัน จันทร์ ที่ 17 กพ..68				
23	อาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 576 ตารางเมตร	โรงพยาบาลโนนสัง	หนองบัวลำภู	5.ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา	อยู่ระหว่างการลงร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา สิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็นฯ 24 กพ.68				
1	อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.9 ชั้น และ 1 ชั้นใต้ดิน พื้นที่ใช้สอยประมาณ 31,420 ตารางเมตร	โรงพยาบาลอุดรธานี	อุดรธานี	4.จัดทำรายงานขอซื้อของจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ		ก.ค.68	10 - 18 ก.พ.68 ส่งเอกสารราคากลาง/ร่างประกาศประกวดราคาให้ กองกฎหมาย-กองคลัง	รายงาน TOR/ราคากลาง	ล่าช้ากว่าแผน

ข้อมูล ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 07.30 น.



การบริหารจัดการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2567 เขตสุขภาพที่ 8

ผลการเบิกจ่ายงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2567
เขตสุขภาพที่ 8

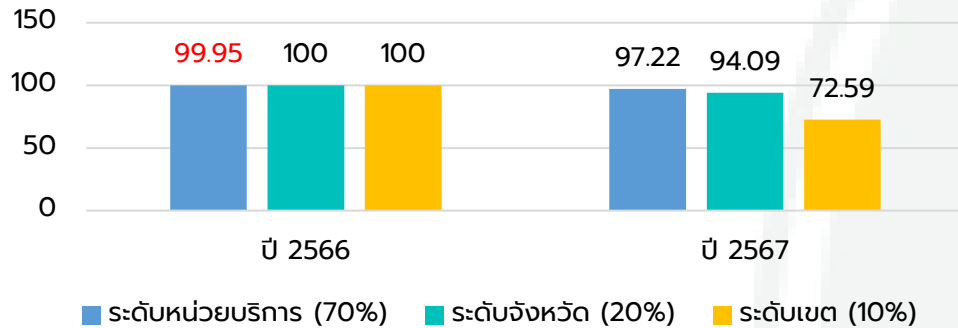

ภาพรวมการจัดสรร ปี 2567 วงเงินทั้งสิ้น 521,816,797.42 บาท

รายการ	70%	20%	10%
จัดสรร	365,271,758.19 (2,847 รายการ)	104,363,359.49 (541 รายการ)	52,181,679.74 (135 รายการ)
เบิกจ่าย	178,095,082.40 (2,304 รายการ)	45,750,275.85 (403 รายการ)	20,839,679.74 (61 รายการ)
คงเหลือ	187,176,675.79 (543 รายการ)	58,613,083.64 (138 รายการ)	31,342,000 (74 รายการ)

*รายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ปี 2566

อุดรธานี : sw.อุดรธานี


วงเงินระดับหน่วยบริการ (70%)

- รายการก่อสร้าง วงเงิน 12,461,862.00 บาท
ซ่อมแซมระบบปรับอากาศ
งานพื้นและประตูลำหรับห้องผ่าตัด
จำนวน 4 ห้อง

ผลการดำเนินงาน :

- อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 2/4
- ทำขยายเวลาแล้ว เสร็จสิ้น 31 มีนาคม 2568

วงเงินและร้อยละการเบิกจ่าย (งบค่าเสื่อม) ในสังกัด สป.สร. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

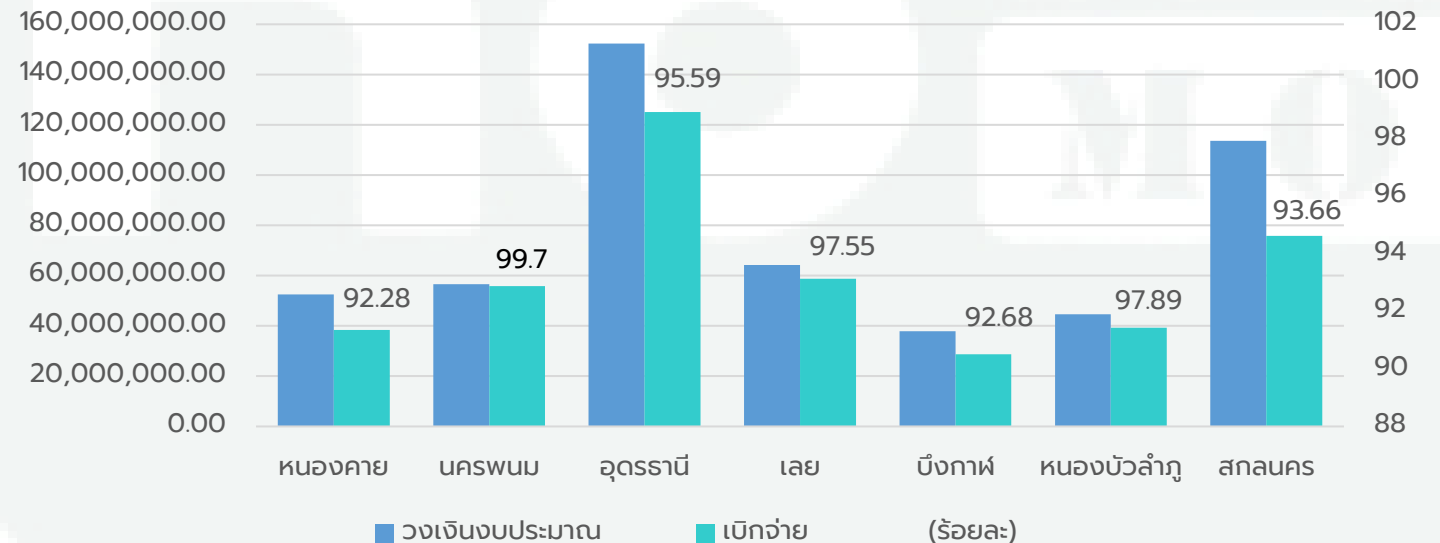

การบริหารจัดการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน


สรุปสถานการณ์ดำเนินงาน (ตามจำนวนรายการ) ปีงบประมาณ 2567 **ประเภทงบ ในสังกัด สป.สร.**

ลำดับ	จังหวัด	วงเงินงบประมาณ	รายการ	จัดทำแผนการจัดซื้อ/จ้างแล้ว		ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้างแล้ว		ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว		ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว		เบิกจ่ายเงินแล้ว					
				รายการ	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	งบตามแผน	งบที่ใช้ไป	เงินเหลือจ่าย	%เงินเหลือจ่าย
1	หนองคาย	52,570,194.50	324	0	0	0	0	12	3.7	13	4.01	299	92.28	38,351,370.44	37,934,469.11	416,901.33	1.09
2	นครพนม	56,553,341.14	328	0	0	0	0	1	0.3	0	0	327	99.7	55,783,341.14	55,619,443.29	163,897.85	0.29
3	อุดรธานี	152,357,970.55	953	0	0	4	0.42	31	3.25	7	0.73	911	95.59	125,032,471.64	122,586,061.63	2,446,410.01	1.96
4	เลย	64,203,282.05	490	0	0	2	0.41	4	0.82	6	1.22	478	97.55	58,808,282.05	58,589,766.88	218,515.17	0.37
5	บึงกาฬ	37,928,558.17	164	0	0	3	1.83	9	5.49	0	0	152	92.68	28,771,967.90	28,408,635.91	363,331.99	1.26
6	หนองบัวลำภู	44,586,238.65	569	1	0.18	3	0.53	8	1.41	0	0	557	97.89	39,286,238.65	39,053,938.18	232,300.47	0.59
7	สกลนคร	113,617,212.36	694	0	0	8	1.15	33	4.76	3	0.43	650	93.66	75,879,798.72	75,379,949.44	499,849.28	0.66
รวม เขต 8		521,816,797.42	3,522	1	0.03	20	0.57	98	2.78	29	0.82	3,374	95.8	421,913,470.54	417,572,264.44	4,341,206.10	1.03

ข้อมูล : โปรแกรม สปสช. เขต 8 อุดรธานี ณ วันที่ 18 ก.พ. 2567 เวลา 16.00 น. รายงานโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (R8-CIO)

การบริหารจัดการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน

ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบค่าเสื่อม เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 (ไม่รวม รพ.สต.ถ่ายโอน)

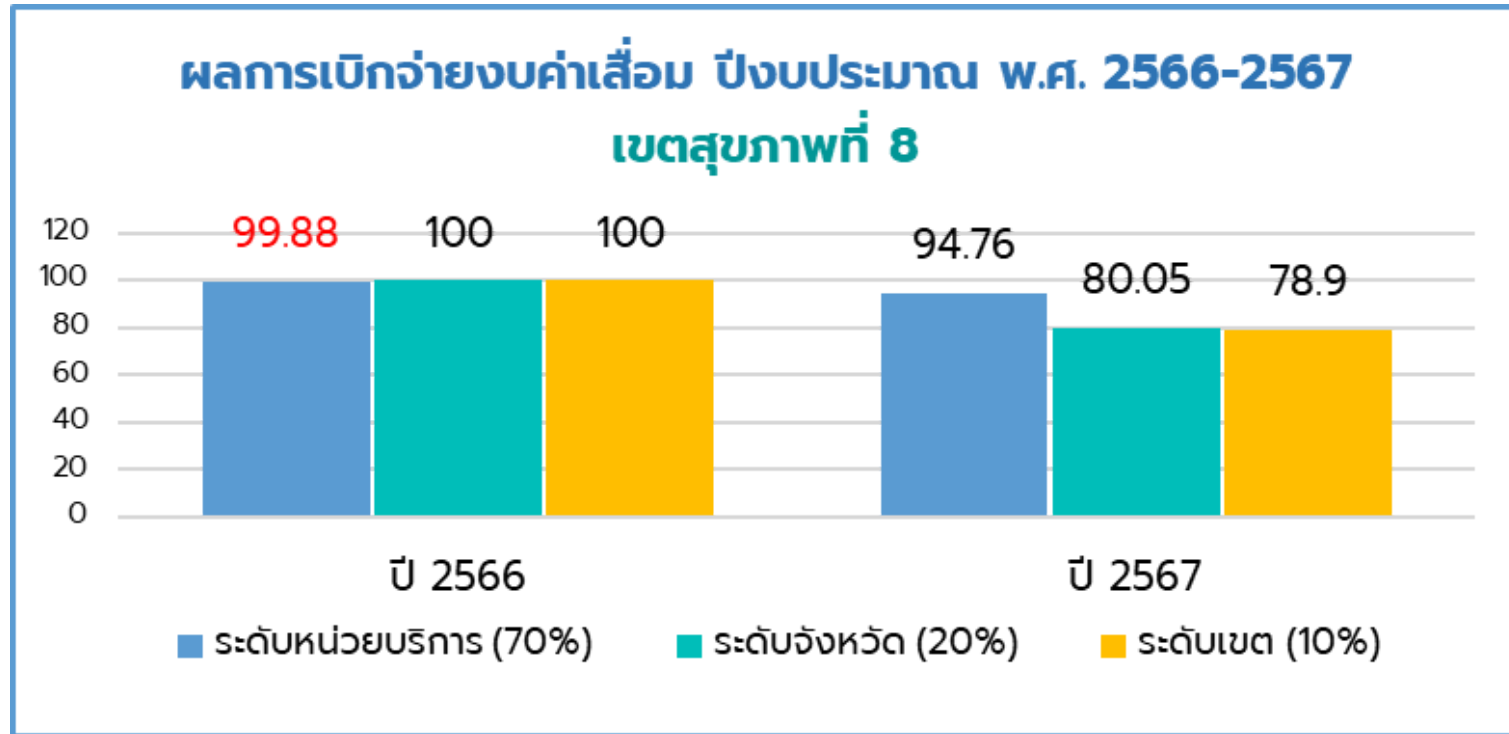

ภาพรวมการจัดสรร ปี 2567 วงเงินทั้งสิ้น 486,486,750.12 บาท

รายการ	70%	20%	10%
จัดสรร	333,217,010.89 (1,828 รายการ)	101,183,559.49 (475 รายการ)	52,086,179.74 (131 รายการ)
เบิกจ่าย	293,709,447.78 (1,783 รายการ)	77,091,137.85 (455 รายการ)	40,468,504.74 (115 รายการ)
คงเหลือ	39,507,563.11 (45 รายการ)	24,092,421.64 (20 รายการ)	11,617,675.00 (16 รายการ)

***รายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ปี 2566**

อุดรธานี : รพ.อุดรธานี


วงเงินระดับหน่วยบริการ (70%)

- รายการก่อสร้าง วงเงิน 12,461,862.00 บาท
- ซ่อมแซมระบบปรับอากาศ
- งานพื้นและประตูสำหรับห้องผ่าตัด
- จำนวน 4 ห้อง

ผลการดำเนินงาน :

- อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 2/4
- ทำขยายเวลาแล้ว เสร็จสิ้น 31 มีนาคม 2568

วงเงินและร้อยละการเบิกจ่าย (งบค่าเสื่อม) ในสังกัด สป.สร. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

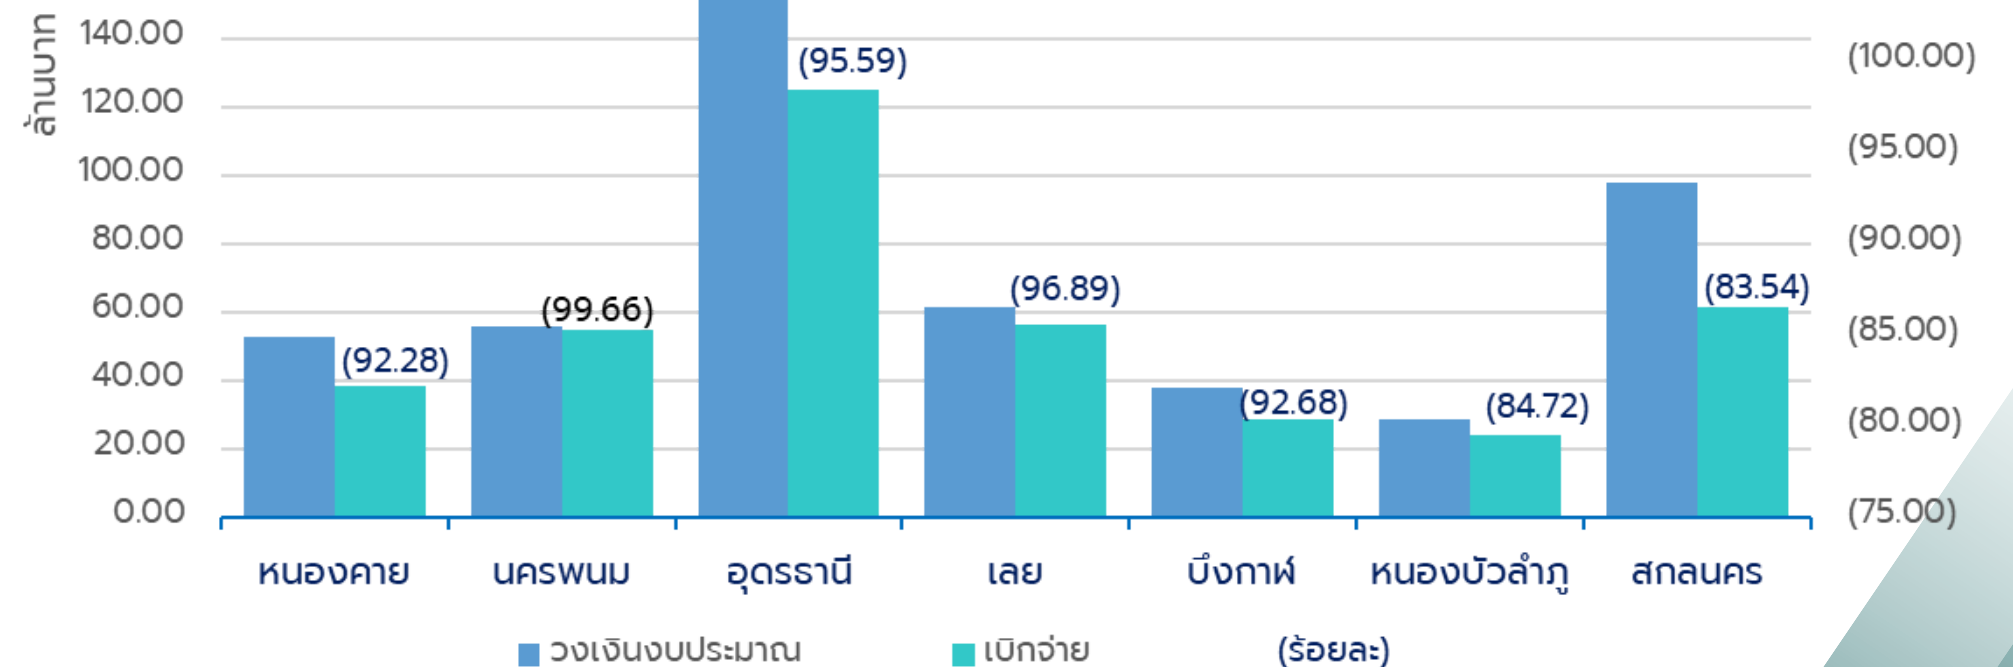

การบริหารจัดการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน

สรุปสถานการณ์ดำเนินงาน (ตามจำนวนรายการ) ปีงบประมาณ 2567 ประเภทงบ ในสังกัด สป.สร. (ไม่รวม รพ.สต.ถ่ายโอน)

ลำดับ	จังหวัด	วงเงินงบประมาณ	รายการ	จัดทำแผนการ จัดซื้อ/จ้างแล้ว		ขออนุมัติจัดซื้อ/ จ้างแล้ว		ทำสัญญา เรียบร้อยแล้ว		ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว		เบิกจ่ายเงินแล้ว					
				รายการ	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	งบตามแผน	งบที่ใช้ไป	เงินเหลือจ่าย	%เงิน เหลือจ่าย
1	หนองคาย	52,570,194.50	324	0	0.00	0	0.00	12	3.70	13	4.01	299	92.28	38,351,370.44	37,934,469.11	416,901.33	1.09
2	นครพนม	55,523,441.14	292	0	0.00	0	0.00	1	0.34	0	0.00	291	99.66	54,598,153.29	54,442,865.44	155,287.85	0.28
3	อุดรธานี	152,357,970.55	953	0	0.00	4	0.42	31	3.25	7	0.73	911	95.59	125,032,471.64	122,586,061.63	2,446,410.01	1.96
4	เลย	61,662,182.05	386	0	0.00	2	0.52	4	1.04	6	1.55	374	96.89	56,051,767.88	55,836,353.71	215,414.17	0.38
5	บึงกาฬ	37,928,558.17	164	0	0.00	3	1.83	9	5.49	0	0.00	152	92.68	28,771,967.90	28,408,635.91	363,331.99	1.26
6	หนองบัวลำภู	28,377,251.61	72	1	1.39	3	4.17	7	9.72	0	0.00	61	84.72	23,800,331.61	23,673,411.61	126,920.00	0.53
7	สกลนคร	98,067,152.10	243	0	0.00	8	3.29	29	11.93	3	1.23	203	83.54	61,203,035.18	60,779,481.90	423,553.28	0.69
รวม เขต 8		486,486,750.12	2,434	1	0.04	20	0.82	98	4.03	29	1.19	2,291	94.12	387,809,097.94	383,661,279.31	4,147,818.63	1.07

ข้อมูล : โปรแกรม สปสช. เขต 8 อุดรธานี ณ วันที่ 18 ก.พ. 2567 เวลา 16.00 น. รายงานโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (R8-CIO)



R8way
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8

THANK YOU

FOR YOUR ATTENTION

 <https://r8way.moph.go.th>

