



ที่ สธ ๐๒๓๓.๐๑/๒๒ รพ

สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘
๔ ถนนอิทธิติ ตำบลหมากแข้ง
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งมติการประชุมการกำกับ ติดตาม และประเมินความก้าวหน้าการบริหารจัดการงบลงทุน เขตสุขภาพที่ ๘
เรียน

อ้างถึง หนังสือ สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘ ที่ สธ ๐๒๓๓.๐๑/ ๑๙๘๖ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย มติการประชุมการกำกับ ติดตาม และประเมินความก้าวหน้าการบริหาร จำนวน ๑ ชุด
จัดการงบลงทุน เขตสุขภาพที่ ๘ ครั้งที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามที่สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘ ได้จัดประชุมการประชุมการกำกับ ติดตาม และประเมิน
ความก้าวหน้าการบริหารจัดการงบลงทุน เขตสุขภาพที่ ๘ เพื่อให้การบริหารงบประมาณ ตลอดจนการกำกับ
ติดตาม ความก้าวหน้าการบริหารงบลงทุนบรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ผ่านระบบออนไลน์ นั้น

ในการนี้ สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘ จึงขอส่งมติการประชุมการกำกับ ติดตาม และประเมิน
ความก้าวหน้าการบริหารจัดการงบลงทุน เขตสุขภาพที่ ๘ ครั้งที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และขอให้ ท่าน
เร่งรัด กำกับ ติดตามผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาของหน่วยงานในสังกัดอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายประพนธ์ เครือเจริญ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

โทร. ๐ ๔๒๒๑ ๙๒๐๗ ต่อ ๒๑๙

E-Mail : r8waycio@gmail.com

ผู้ประสาน : นางสาวสุภารัตน์ วัฒนธรรม



เรื่อง ประชุมการกำกับ ติดตาม และประเมินความก้าวหน้าการบริหารจัดการงบลงทุน เขตสุขภาพที่ 8
ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568 เวลา 13.30 – 16.30 น. ผ่านระบบวิดีโอผ่านทางไกล

เรื่อง	มติ ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ	
<p>ประธาน : นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8</p> <p>แจ้งในที่ประชุม : การกำกับ ติดตาม และประเมินความก้าวหน้าการบริหารจัดการงบลงทุน</p> <ol style="list-style-type: none"> ขอให้หน่วยงานแต่ละจังหวัดอัปเดตข้อมูลความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา ลงในแบบฟอร์ม Google Sheets ของเขตสุขภาพที่ 8 และโปรแกรม กบรส. ทุกสัปดาห์ ผู้บริหารจังหวัด เพิ่มความถี่ในการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทีมเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เขตสุขภาพที่ 8 (คณะ 2) <ol style="list-style-type: none"> รวบรวมผลการดำเนินงาน วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและการบริหารสัญญา รายการของหน่วยงานแต่ละจังหวัด เสนอต่อผู้บริหารทราบ ทุก 2 สัปดาห์ ประชุมกำกับ ติดตาม และประเมินความก้าวหน้าการบริหารจัดการงบลงทุน ทุก 1 เดือน 	- รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม	
<p>มติ การประชุมการกำกับ ติดตาม และประเมินความก้าวหน้าการบริหารจัดการงบลงทุน เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในวันที่ 24 มีนาคม 2568 เวลา 09.00 – 16.30 น. ผ่านระบบวิดีโอผ่านทางไกล</p>	- เห็นชอบ/ รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง	
<p>รายงานผลการดำเนินงานการบริหารงบลงทุน เขตสุขภาพที่ 8</p> <p>3.1 การบริหารจัดการงบลงทุนปี 2567 ที่กันไว้เบิกเหลือในปี 2568</p> <p>โดย นายแพทย์อดิศักดิ์ สัยลังกา นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย เลขานุการคณะกรรมการกำกับติดตามงบลงทุน งบค่าเสื่อม เขตสุขภาพที่ 8 (รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 1)</p> <p>3.1.1 รายการงบลงทุนปี 2567 ที่กันไว้เบิกเหลือปี 2568 (ก่อสร้างปีเดียว) ที่ดำเนินการล่าช้า/ ยกเลิกสัญญา มีสถานะเสี่ยงสูง/ เสี่ยงพับ</p> <p>1. จังหวัดหนองคาย</p> <p>จังหวัดชี้แจงในที่ประชุม :</p> <p>1) รพ.สต.อุดมพร : เสี่ยงสูง : บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ ปฏิบัติการ/ อาวุโส/ ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น</p> <p style="text-align: right;">ชั้นตอน...</p>	

เรื่อง	มติ ที่ประชุม
<p>ขั้นตอน : เนื่องจากผู้รับจ้างส่งผลทดสอบดินล่าช้า และมีการแก้ไขสัญญาการเปลี่ยนฐานจากเดิมเป็นฐานเข็มตอก เปลี่ยนเป็นฐานแพท ขณะนี้เอกสารอยู่ระหว่างส่งไปที่กองแบบแผน ณ ปัจจุบันการดำเนินงานก่อสร้างอยู่ช่วงงานที่ 3 - 4 กำหนดการก่อสร้างเสร็จสิ้นและส่งงานภายในเดือน มิถุนายน 2568</p> <p>2) รพ.สต.ตำบลศรีสุข : เสียงสูง : บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ ปฏิบัติการ/ อาวุโส/ ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น</p> <p>ขั้นตอน : ผู้รับจ้างรายเดิมทีมงานบอกเลิกสัญญาวันที่ 21 มกราคม 2568 จัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ ดำเนินการแทน ลงนามในสัญญาแล้ววันที่ 7 มีนาคม 2568 ณ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 1 กำหนดส่งมอบ 6 พฤษภาคม 2568 กำหนดส่งมอบตามสัญญาภายในวันที่ 3 กันยายน 2568 คาดว่าสามารถดำเนินการได้ทันเวลา</p> <p>3) รพ.สต.บ้านเทพประทีป : เสียงสูง : บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ ปฏิบัติการ/ อาวุโส/ ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น</p> <p>ขั้นตอน : ผู้รับจ้างรายเดิมทีมงานบอกเลิกสัญญาวันที่ 21 มกราคม 2568 จัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ ดำเนินการแทน ลงนามในสัญญาแล้ววันที่ 14 มีนาคม 2568 ณ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 1 กำหนดส่งมอบ 13 พฤษภาคม 2568 กำหนดส่งมอบตามสัญญาภายในวันที่ 13 กันยายน 2568 คาดว่าสามารถดำเนินการได้ทันเวลา</p> <p>4) รพ.สต.บ้านท่าสำราญ : เสียงสูง : บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ ปฏิบัติการ/ อาวุโส/ ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น</p> <p>ขั้นตอน : ผู้รับจ้างรายเดิมทีมงานบอกเลิกสัญญาวันที่ 21 มกราคม 2568 จัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ ดำเนินการแทน ลงนามในสัญญาแล้ววันที่ 7 มีนาคม 2568 ณ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 1 กำหนดส่งมอบ 6 พฤษภาคม 2568 กำหนดส่งมอบตามสัญญาภายในวันที่ 3 กันยายน 2568 คาดว่าสามารถดำเนินการได้ทันเวลา</p> <p>5) รพ.สต.นาดี : เสียงสูง : บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ ปฏิบัติการ/ อาวุโส/ ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น</p> <p>ขั้นตอน : ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างในงานงวดที่ 3 สิ้นสุดสัญญา 19 มีนาคม 2568 มีค่าปรับวันละ 1,109 บาท ได้แจ้งเรียกค่าปรับให้ผู้รับจ้างรับทราบแล้ว ให้ผู้รับจ้างปรับแผนการดำเนินงานและเพิ่มแรงงาน สัญญาสิ้นสุด วันที่ 19 มีนาคม 2568 มีการปรับแผนการส่งงานงวดสุดท้ายให้ภายในเดือน มิถุนายน 2568</p> <p>6) รพ.สต.บ้านมือ : เสียงสูง : บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ ปฏิบัติการ/ อาวุโส/ ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น</p> <p>ขั้นตอน : ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างในงานงวดที่ 3 สิ้นสุดสัญญา 19 มีนาคม 2568 มีค่าปรับวันละ 1,149 บาทได้แจ้งเรียกค่าปรับให้ผู้รับจ้างรับทราบแล้ว และให้ผู้รับจ้างปรับแผนการดำเนินงานและเพิ่มแรงงาน ลงนามในสัญญาแล้ว 20 กันยายน 2567 สัญญาสิ้นสุด วันที่ 19 มีนาคม 2568 มีการปรับแผนการส่งงานงวดสุดท้าย ภายในเดือน กรกฎาคม 2568</p> <p>*ข้อเสนอแนะ : ผู้รับจ้างรายเดียวกัน ได้แก่ รพ.สต.อุดมพร/ นาดี/ บ้านมือ จึงขอให้ คกก.ตรวจรับงาน เร่งรัด กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>- เห็นชอบ/ รับทราบ</p>


เรื่อง	มติ ที่ประชุม
<p>2. จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดชี้แจงในที่ประชุม :</p> <p>1) รพ.สต.บ้านสมสนุก : เสียงสูง : บ้านพักข้าราชการระดับอำนาจการต้น/ ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น ขั้นตอน : เบิกจ่ายงวดที่ 2 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 ตามแผนผู้รับจ้างส่งมอบงวดที่ 3 - 5 ในเดือนเมษายน 2568 มีการปรับแผนแล้ว ส่งงานงวดสุดท้ายภายในเดือน สิงหาคม 2568</p> <p>2) รพ.สต.ดอนหญ้านาง : เสียงสูง : บ้านพักข้าราชการระดับอำนาจการต้น/ ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น ขั้นตอน : ยกเลิกสัญญา ประกาศครั้งที่ 2 และได้ผู้รับจ้างใหม่แล้วจัดทำสัญญาวันที่ 21 มีนาคม 2568 งดงาน 120 วัน อยู่ระหว่างดำเนินงานก่อสร้างงวดที่ 1 และตามแผนผู้รับจ้างจะดำเนินการให้แล้วเสร็จ 19 กรกฎาคม 2568 สามารถดำเนินการได้ทันเวลา</p> <p>3) รพ.สต.หนองทุ่ม : เสียงสูง : บ้านพักข้าราชการระดับอำนาจการต้น/ ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น ขั้นตอน : เบิกจ่ายงวดที่ 2 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 และงวดที่ 3 - 5 ตามแผนผู้รับจ้างส่งมอบ งวดที่ 3 - 5 ในเดือนมิถุนายน 2568 และมีการปรับแผนแล้ว ส่งงานงวดสุดท้ายภายในเดือน สิงหาคม 2568</p> <p>4) รพ.สต.หัวช้าง : เสียงสูง : บ้านพักข้าราชการระดับอำนาจการต้น/ ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น ขั้นตอน : เบิกจ่ายงวดที่ 2 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 และงวดที่ 3 - 5 ตามแผนผู้รับจ้างส่งมอบ งวดที่ 3 - 5 ในเดือนพฤษภาคม 2568 และมีการปรับแผนแล้ว ส่งงานงวดสุดท้ายภายในเดือน สิงหาคม 2568</p> <p>5) รพ.สต.ท่ากกแดง : เสียงสูง : บ้านพักข้าราชการระดับอำนาจการต้น/ ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น ขั้นตอน : เบิกจ่ายงวดที่ 2 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 และงวดที่ 3 - 5 ตามแผนผู้รับจ้าง คาดว่าผู้รับจ้างส่งมอบ งวดที่ 3 - 5 ในเดือนมิถุนายน 2568 และมีการปรับแผนแล้ว ส่งงานงวดสุดท้ายภายในเดือน สิงหาคม 2568</p> <p>6) รพ.สต.บ้านด้อย : เสียงสูง : บ้านพักข้าราชการระดับอำนาจการต้น/ ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น ขั้นตอน : เบิกจ่ายงวดที่ 2 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 และงวดที่ 3 - 5 ตามแผนผู้รับจ้างส่งมอบ งวดที่ 3 - 5 ในเดือนเมษายน 2568 และรับทราบการเสียค่าปรับแล้ว คาดว่าส่งงานงวดสุดท้ายภายในเดือน สิงหาคม 2568</p> <p>7) รพ.บึงโขงหลง : เสียงสูง : บ้านพักข้าราชการระดับอำนาจการต้น/ ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น</p> <p style="text-align: right;">ขั้นตอน...</p>	

เรื่อง	มติ ที่ประชุม
<p>ขั้นตอน : เบิกจ่ายงวดที่ 2 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 และงวดที่ 3 - 5 ตามแผนผู้รับจ้างส่งมอบ งวดที่ 3 - 5 ในเดือนเมษายน 2568 และรับทราบการเสียค่าปรับแล้ว คาดว่าส่งงานงวดสุดท้ายภายในเดือน สิงหาคม 2568</p> <p>8) รพ.ศรีวิไล : เสียงสูง : บ้านพักข้าราชการระดับอำนาจการต้น/ ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น</p> <p>ขั้นตอน : เบิกจ่ายงวดที่ 2 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 และงวดที่ 3 - 5 ตามแผนผู้รับจ้างส่งมอบ งวดที่ 3 - 5 ในเดือนพฤษภาคม 2568 และรับทราบการเสียค่าปรับแล้ว คาดว่าส่งงานงวดสุดท้ายภายในเดือน สิงหาคม 2568</p> <p>9) รพ.บึงคล้า : เสียงสูง : บ้านพักข้าราชการระดับอำนาจการต้น/ ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น</p> <p>ขั้นตอน : ส่งมอบงวดที่ 1 วันที่ 22 เมษายน 2568 รอตรวจรับ 16 พฤษภาคม 2568 ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างล่าช้า ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างในงวดที่ 2 ล่าช้า 3 งวดผู้รับเหมาจะนำเครื่องมืออุปกรณ์ในการก่อสร้างเข้ามาเพิ่มเติมจะดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ภายใน 70 วัน (ภายในเดือน มิถุนายน 2568)</p> <p>10) รพ.พรเจริญ : เสียงสูง : บ้านพักข้าราชการระดับปฏิบัติงาน (บ้านแฝด) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น</p> <p>ขั้นตอน : เบิกจ่ายงวดที่ 2 เบิกจ่าย 25 เมษายน 2568 และงวดที่ 3 - 5 ตามแผนผู้รับจ้าง คาดผู้รับจ้างส่งมอบ งวดที่ 3 - 5 ในเดือนพฤษภาคม 2568 (เงินกันหล่มปี งบปี 2567 เบิกหมดในเดือน มิถุนายน 2568) ปรับแผนแล้วคาดว่าส่งงานงวดสุดท้ายภายในเดือน สิงหาคม 2568</p> <p>*ข้อเสนอแนะ : 1. เนื่องจากหลายหน่วยงานผู้รับจ้างรายเดียวกัน จึงขอให้ คกก.ตรวจรับงาน เร่งรัด และกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง</p> <p>2. ขอให้ผู้รับผิดชอบงาน อัดเดทการปรับแผนงาน งบ.700 ในโปรแกรม กบรส. ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ความเสี่ยงในการบริหารสัญญา ต่อไป</p> <p>3.1.2 รายการงบประมาณปี 2567 ที่กันไว้เบิกหล่มปี 2568 (<u>ก่อสร้างผูกพัน</u>) ที่เสียงสูง/ เสียงพับ</p> <p>1. จังหวัดหนองบัวลำภู</p> <p>จังหวัดชี้แจงในที่ประชุม :</p> <p>1) รพ.สุวรรณคูหา : เสียงพับ : อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น</p> <p>ขั้นตอน : ลงนามสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2567 จำนวน 10 งวด ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง งวดที่ 2 ใกล้เสร็จสิ้นแล้ว เนื่องจากมีการแก้ไขแบบแปลนและรูปแบบ และมีการเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินการรายงานผลทดสอบเสาเข็ม เพื่อประชุมคณะกรรมการขอแก้ไขสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 คาดว่าผู้รับจ้างจะส่งงานงวดที่ 1 และ 2 พร้อมกันภายในเดือน พฤษภาคม 2568 โดยแจ้งผู้รับจ้างปรับแผนเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ล่าช้าอยู่ 90 วัน คาดว่าถูกพับงวดที่ 3</p> <p style="text-align: right;">2) รพ.หนองบัวลำภู...</p>	- เห็นชอบ/ รับทราบ

เรื่อง	มติ ที่ประชุม
<p>2) รพ.หนองบัวลำภู : เลี้ยงพัช : อาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น ขั้นตอน : ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568 ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง งานงวดที่ 1 กำหนดส่งมอบงานภายในวันที่ 10 กันยายน 2568 คาดว่าดำเนินการทันเวลา</p> <p>2. จังหวัดอุดรธานี</p> <p>1) รพ.หนองหาน : เลี้ยงพัช : อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น ขั้นตอน : 1. ประชุมเพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงฐานรากเสาเข็มเจาะ เป็นฐานรากชนิดแผ่ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2568 มีมติอนุมัติในหลักการให้ผู้รับจ้างก่อสร้างฐานรากแบบแผ่ และอยู่ระหว่างส่งเอกสารแบบแปลนให้กองแบบแผนพิจารณา</p> <p>2. กองแบบแผนพิจารณางานเปลี่ยนแปลงฐานรากอาคาร (ฐานรากแผ่) แล้ว ตรงตามข้อกำหนดและรูปแบบ เห็นควรให้ผู้รับจ้างใช้เป็นแนวทางในการก่อสร้างได้ (ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างฐานรากแผ่)</p> <p>3. ณ ปัจจุบัน ผู้รับเหมาได้ดำเนินการก่อสร้างฐานรากชนิดแผ่เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดที่ 1 – 6 ภายในเดือน กันยายน 2568 ผู้บริหารมีการติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง</p> <p>3. จังหวัดเลย จังหวัดชี้แจงในที่ประชุม :</p> <p>1) รพ.วังสะพุง : เลี้ยงพัช : หอผู้ป่วยใน 7 ชั้น (จำนวน 156 เตียง) เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น ขั้นตอน : จำนวน 6 งานงวดงาน ซึ่งคาดว่าจะไม่ทันเวลา เพื่อลดความเสี่ยง กกก.ตรวจการจ้าง จึงลงความเห็นให้ กบรส. ดึงงบคืนจำนวน 3 งานงวด งานที่ 1 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ณ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงานงวดที่ 2 (ไม่มีล่าช้า) ผู้บริหารมีการติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์</p> <p>4. จังหวัดสกลนคร จังหวัดชี้แจงในที่ประชุม :</p> <p>1) รพ.พังโคน : เลี้ยงพัช : อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุฉุกเฉิน บำบัดรักษาและสำนักงาน เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น ขั้นตอน : ปี 2567 มีจำนวน 6 งานงวดงาน คาดว่าเบิกจ่ายได้เพียง 1 งาน คาดว่าจะถูกพับในงวดที่ 2 - 6</p> <p>2) รพ.พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต : เลี้ยงพัช : อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น ขั้นตอน : ประกาศผู้ชนะแล้ว คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายใน พฤษภาคม 2568 ในงบปี 2567 มี 3 งานงวดงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ 1 งานงวดงาน และดึงงบคืน 2 งานงวดงาน</p> <p>3) รพ.พระอาจารย์วัน อุตต : เลี้ยงพัช : ห้องชุดครอบครัว 24 ครอบครัว เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น ขั้นตอน : ส่งมอบงานและตรวจรับงานงวดที่ 3 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน และดำเนินการก่อสร้างงานงวดที่ 4 คาดว่าสามารถดำเนินการได้ทันเวลา</p> <p>5. จังหวัดนครพนม</p> <p>1) รพ.ศรีสงคราม : เลี้ยงพัช : อาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง (มาตรฐาน) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น</p>	<p>ขั้นตอน...</p>

เรื่อง	มติ ที่ประชุม
<p>ขั้นตอน : ลงนามสัญญาวันที่ 14 มีนาคม 2568 สิ้นสุดสัญญา 11 มีนาคม 2569 อยู่ในขั้นตอนการประชุมพิจารณาการปักฝั่ง, ผลการทดสอบการรับน้ำ หนักของดิน, ผลการทดสอบแท่งคอนกรีต, และการอนุมัติใช้วัสดุก่อสร้างของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2568 สามารถเบิกจ่ายได้ 1 งวดงาน และตั้งบคิน 1 งวดงาน</p> <p>2) รพ.นาหว้า : เสียงพิบ : อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น</p> <p>ขั้นตอน : ประกาศครั้งที่ 2 รายงานผลการกำหนดราคากลางแล้ว อยู่ระหว่างเสนอพิจารณาขออนุมัติเห็นชอบพร้อมประกาศขึ้นร่างฯ เนื่องจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวทำให้ตึก สดง. ถล่ม ทาง คกก.จังหวัด จึงให้ทบทวนในเรื่องของราคาก่อสร้าง และครุภัณฑ์ส่วนควบตึก และจัดทำแบบสอบถามไปยังกองแบบแผนยืนยันราคาให้</p> <p>*ข้อเสนอแนะ : ให้จังหวัดจัดทำแผนการดำเนินงานอย่างละเอียดลงใน ง.700 เนื่องจากเป็นรายการเดียวของเขตสุขภาพที่ 8 ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา</p> <p>6. จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดชี้แจงในที่ประชุม :</p> <p>1) รพ.บึงกาฬ : เสียงพิบ : อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น</p> <p>ขั้นตอน : เนื่องจาก สัญญาจ้างก่อสร้าง ลงนามในวันที่ 11 มีนาคม 2567 เริ่มเข้าดำเนินการก่อสร้างในเดือนเมษายน 2567 ** การดำเนินงานก่อสร้าง ในงวดงานที่ 1 การก่อสร้างฐานราก อยู่ในช่วงฤดูฝน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2567 ถึงเดือน สิงหาคม 2567 มีน้ำท่วมขังฐานราก และบริเวณโครงการก่อสร้างเป็นบ่อน้ำ เดิม (ตาน้ำ) ทำให้น้ำซึม ส่งผลให้ไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างได้</p> <p>2) รพ.บึงกาฬ : เสียงพิบ : อาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น</p> <p>ขั้นตอน : ตรวจรับงวด 3 วันที่ 21 มีนาคม 2568 เนื่องจากเบิกจ่ายไม่ทัน จึงทำเรื่องขอขยายเวลาเบิกจ่ายงวด 3 วงเงิน 3 ล้านบาท</p> <p>*ข้อเสนอแนะ : ให้จัดทำ Time line การปรับแผน/ วันที่สิ้นสุดสัญญา บันทึกข้อมูล ง.700 ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อทราบถึงระยะเวลาที่แล้วเสร็จ</p> <p>3.2 การบริหารจัดการงบลงทุนปี 2568 โดย นายแพทย์ยอดลักษณ์ สัยลังกา นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย เลขานุการคณะกรรมการกำกับติดตามงบลงทุน งบค่าเสื่อม เขตสุขภาพที่ 8 (รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 1)</p> <p>3.2.1 การบริหารงบลงทุน (ครุภัณฑ์) ปี 2568 <u>ภาพรวมรายการงบลงทุนปี 2568 (ครุภัณฑ์)</u></p> <p>1) เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 1,211 หน่วย (94.90%) เพิ่มขึ้น 34 รายการ (2.67%) เมื่อเทียบกับเดือนก่อน</p> <p style="text-align: right;">2) อยู่ระหว่าง...</p>	<p>- เห็นชอบ/ รับทราบ</p> <p>- เห็นชอบ/ รับทราบ</p>

เรื่อง	มติ ที่ประชุม
<p>2) อยู่ระหว่างกำหนด spec/TOR ใหม่ 1 หน่วย เนื่องจากยกเลิกประกาศครั้งที่ 1 ได้แก่ จังหวัดหนองบัวลำภู : รพ.ศรีบุญเรือง รายการกล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องท้องชนิดวิดีโอทัศนแบบ คมชัดสูงชนิดภาพ 2 มิติ จำนวน 1 หน่วย วงเงิน 2,500,000 บาท จังหวัดชี้แจงในที่ประชุม : ณ ปัจจุบัน ได้ดำเนินการร่างประกาศเรียบร้อยแล้ว คาดว่าได้ผู้รับจ้างภายในเดือน พฤษภาคม 2568</p> <p>3) รอลงนามสัญญา 10 หน่วย ได้แก่ 3.1) จังหวัดหนองบัวลำภู : รพ.นากลาง รายการเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติด้วยแก๊สเอทิลีนออกไซด์ 100 % จำนวน 1 หน่วย วงเงิน 790,000 บาท จังหวัดชี้แจงในที่ประชุม : ณ ปัจจุบัน ได้พ้นระยะอุทธรณ์แล้ว และได้แจ้งผู้รับจ้างมาทำสัญญาต่อไป</p> <p>3.2) จังหวัดหนองคาย : รพ.หนองคาย รายการเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร และความดันฯ จำนวน 10 หน่วย วงเงิน 1,500,000 บาท จังหวัดชี้แจงในที่ประชุม : ประกาศผู้ชนะ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2568 (เว้นระยะอุทธรณ์ 7 วัน เริ่ม 7 พ.ค. 68 - 19 พ.ค. 68) รายงานผลอุทธรณ์ประมาณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2568 คาดว่าแจ้งมาลงนาม ในสัญญาได้ประมาณ วันที่ 28 - 30 พฤษภาคม 2568</p> <p>3.2.2 การบริหารงบลงทุน (ก่อสร้าง) ปี 2568 <u>การบริหารงบลงทุน (สิ่งก่อสร้าง) ปี 2568 เฉพาะรายการที่ยังไม่ลงนามสัญญา แยกรายจังหวัด</u> จังหวัดชี้แจง : รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 1</p> <p>*ข้อเสนอแนะ : การบริหารงบลงทุน สิ่งก่อสร้าง ปี 2568 เฉพาะรายการที่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อ/จัดจ้างภายในระยะเวลาที่กำหนด 2) บริหารสัญญาให้เป็นไปตามวงจางาน 3) ผู้บริหารจังหวัด เร่งรัด กำกับ ติดตาม การดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ 4) รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานให้เป็นปัจจุบัน <p>3.3 การติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2568 เขตสุขภาพที่ 8 โดย นายแพทย์ยอดลักษ์ สัยลังกา นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย เลขานุการคณะกรรมการกำกับติดตามงบลงทุน งบค่าเสื่อม เขตสุขภาพที่ 8 (รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 2)</p> <p>*ข้อเสนอแนะ : 1) รายการที่ยังไม่ลงนามในสัญญา ตามหลักเกณฑ์การขอขยายเวลาจัดซื้อจัดจ้าง สปสช. จะเกี่ยวข้องกับการขยายเวลาการดำเนินงานตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง หากไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในสัญญา สามารถขอขยายเวลาต้องแจ้งให้ สปสช. ทราบ พร้อมเหตุผลและความจำเป็นสามารถ ขยายเวลาได้อีก 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปีงบประมาณ</p> <p>2) ขอเร่งรัดให้ดำเนินการลงนามในสัญญา-เบิกจ่าย ให้แล้วเสร็จภายใน กรกฎาคม 2568 ระเบียบวาระ...</p>	<p>- เห็นชอบ/ รับทราบ</p> <p>- เห็นชอบ/ รับทราบ</p>

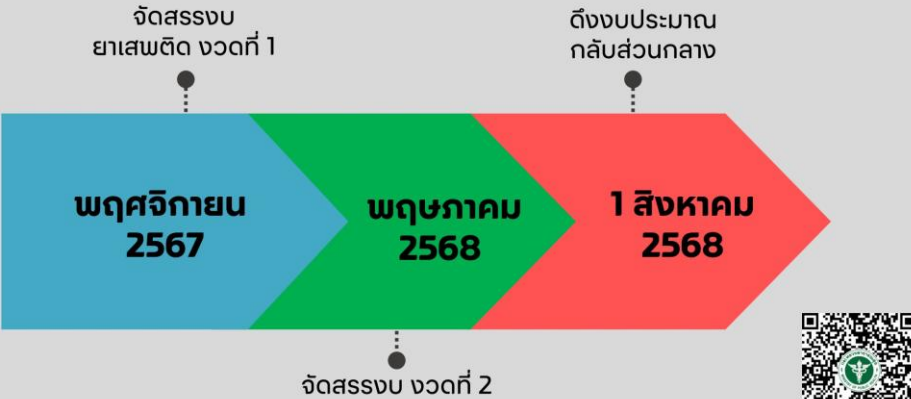เรื่อง	มติ ที่ประชุม																																													
ระเบียบวาระที่ 4 อื่นๆ																																														
<p>4.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568</p> <p>โดย นายวีระวัฒน์ ศิริรัตน์ไพบูลย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกำกับติดตามงบลงทุน งบค่าเสื่อม เขตสุขภาพที่ 8 (รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 3)</p> <div data-bbox="113 589 1246 1218" style="border: 1px solid gray; padding: 10px;"> <p style="text-align: center;">แผนการจัดสรรงบประมาณ 2568 ให้แก่หน่วยงานส่วนภูมิภาค สังกัด สป. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด</p>  </div> <p>4.1.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผนงานบูรณาการ ป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของ สคส. สธ. เขตสุขภาพที่ 8</p> <table border="1" data-bbox="113 1328 1246 1957"> <thead> <tr> <th>จังหวัด</th> <th>ได้รับจัดสรร (บาท)</th> <th>เบิกจ่าย (บาท)</th> <th>คงเหลือ (บาท)</th> <th>เดือนที่คาดว่าจะเบิกแล้วเสร็จ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>เขต 8</td> <td>38,626,550.00</td> <td>28,990,309.42</td> <td>9,636,240.58</td> <td></td> </tr> <tr> <td>อุดรธานี</td> <td>9,306,900.00</td> <td>8,907,902.00</td> <td>398,998.00</td> <td>ก.ค. 68</td> </tr> <tr> <td>สกลนคร</td> <td>7,513,900.00</td> <td>5,201,737.03</td> <td>2,312,162.97</td> <td>ก.ค. 68</td> </tr> <tr> <td>นครพนม</td> <td>8,674,900.00</td> <td>7,832,277.08</td> <td>842,622.92</td> <td>ก.ค. 68</td> </tr> <tr> <td>เลย</td> <td>3,446,900.00</td> <td>2,273,335.45</td> <td>1,173,564.55</td> <td>ก.ค. 68</td> </tr> <tr> <td>หนองคาย</td> <td>3,920,650.00</td> <td>598,552.00</td> <td>3,322,098.00</td> <td>ก.ค. 68</td> </tr> <tr> <td>หนองบัวลำภู</td> <td>3,087,400.00</td> <td>2,207,053.31</td> <td>880,346.69</td> <td>ก.ค. 68</td> </tr> <tr> <td>บึงกาฬ</td> <td>2,675,900.00</td> <td>1,969,452.55</td> <td>706,447.45</td> <td>ก.ค. 68</td> </tr> </tbody> </table> <p>*ผลการเบิกจ่ายงบ สคส.สธ. น้อยที่สุด คือ จังหวัดหนองคาย คิดเป็นร้อยละ 15.27</p> <p style="text-align: right;">จังหวัดชี้แจง...</p>	จังหวัด	ได้รับจัดสรร (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	เดือนที่คาดว่าจะเบิกแล้วเสร็จ	เขต 8	38,626,550.00	28,990,309.42	9,636,240.58		อุดรธานี	9,306,900.00	8,907,902.00	398,998.00	ก.ค. 68	สกลนคร	7,513,900.00	5,201,737.03	2,312,162.97	ก.ค. 68	นครพนม	8,674,900.00	7,832,277.08	842,622.92	ก.ค. 68	เลย	3,446,900.00	2,273,335.45	1,173,564.55	ก.ค. 68	หนองคาย	3,920,650.00	598,552.00	3,322,098.00	ก.ค. 68	หนองบัวลำภู	3,087,400.00	2,207,053.31	880,346.69	ก.ค. 68	บึงกาฬ	2,675,900.00	1,969,452.55	706,447.45	ก.ค. 68	
จังหวัด	ได้รับจัดสรร (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	เดือนที่คาดว่าจะเบิกแล้วเสร็จ																																										
เขต 8	38,626,550.00	28,990,309.42	9,636,240.58																																											
อุดรธานี	9,306,900.00	8,907,902.00	398,998.00	ก.ค. 68																																										
สกลนคร	7,513,900.00	5,201,737.03	2,312,162.97	ก.ค. 68																																										
นครพนม	8,674,900.00	7,832,277.08	842,622.92	ก.ค. 68																																										
เลย	3,446,900.00	2,273,335.45	1,173,564.55	ก.ค. 68																																										
หนองคาย	3,920,650.00	598,552.00	3,322,098.00	ก.ค. 68																																										
หนองบัวลำภู	3,087,400.00	2,207,053.31	880,346.69	ก.ค. 68																																										
บึงกาฬ	2,675,900.00	1,969,452.55	706,447.45	ก.ค. 68																																										

เรื่อง		มติ ที่ประชุม																	
<p>จังหวัดหนองคาย ชี้แจงในที่ประชุม : จากผลการเบิกจ่ายงบ ศคส.สธ. ณ ปัจจุบัน พบว่า หน่วยงานที่ยังไม่เบิกจ่าย ได้แก่ รพ.โพธิ์ตาก/โพนพิสัย/รัตนวาปี ส่วนหน่วยงานอื่นๆ อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายและจัดการเอกสารให้ถูกต้อง คาดว่าภายในเดือน พฤษภาคม 2568 จะเบิกจ่ายเกินร้อยละ 50</p> <p>4.1.2 ผลการเบิกจ่ายแทนกันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของ ป.ป.ส. เขตสุขภาพที่ 8</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>จังหวัด</th> <th>ได้รับจัดสรร (บาท)</th> <th>เบิกจ่าย (บาท)</th> <th>คงเหลือ (บาท)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>สกลนคร</td> <td>6,136,100.00</td> <td>693,530.00</td> <td>5,442,570.00</td> </tr> <tr> <td>นครพนม</td> <td>2,610,000.00</td> <td>-</td> <td>2,610,000.00</td> </tr> <tr> <td>บึงกาฬ</td> <td>2,024,780.00</td> <td>1,538,880.00</td> <td>485,900.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>*ผลการเบิกจ่ายงบ ป.ป.ส. น้อยที่สุด คือ จังหวัดหนองคาย คิดเป็นร้อยละ 0</p> <p>จังหวัดนครพนม ชี้แจงในที่ประชุม : จากผลการเบิกจ่ายงบ ป.ป.ส. ณ ปัจจุบัน นครพนมเบิกจ่ายแล้ว คิดเป็นร้อยละ 31.06 คาดว่าดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน มิถุนายน 2568</p> <p>*ข้อเสนอแนะ : ขอให้ทุกจังหวัดเร่งรัดการเบิกจ่ายทุกรายการให้แล้วเสร็จภายในเดือน มิถุนายน 2568</p> <p>- ปิดประชุม เวลา 16.30 น.</p>		จังหวัด	ได้รับจัดสรร (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สกลนคร	6,136,100.00	693,530.00	5,442,570.00	นครพนม	2,610,000.00	-	2,610,000.00	บึงกาฬ	2,024,780.00	1,538,880.00	485,900.00	<p>- เห็นชอบ/ รับทราบ</p>	
จังหวัด	ได้รับจัดสรร (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)																
สกลนคร	6,136,100.00	693,530.00	5,442,570.00																
นครพนม	2,610,000.00	-	2,610,000.00																
บึงกาฬ	2,024,780.00	1,538,880.00	485,900.00																

..... ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวสุดารัตน์ วัฒนธรรม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้ช่วยเลขานุการ

..... ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายวีระวัฒน์ ศิริรัตน์ไพบูลย์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

ผู้ช่วยเลขานุการ

..... ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม

(นายแพทย์ยอดลักษณ์ สัยลังกา)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย

กรรมการและเลขานุการ



การติดตามความก้าวหน้า

การบริหารจัดการ งบประมาณ

เขตสุขภาพที่ 8

16 พฤษภาคม 2568



1.การบริหารจัดการงบลงทุนปี 2567 ที่กันเงินเหลือมปีไว้ใช้จ่ายในปี 2568

ภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบลงทุน เขตสุขภาพที่ 8 แยกรายจังหวัด

ลำดับ	จังหวัด	ก่อสร้างปีเดียว				ก่อสร้างผูกพัน				ครุภัณฑ์				ผลรวม			
		กันเงินสุทธิ	เบิกจ่าย	%การเบิกจ่าย	งบคงเหลือ	กันเงินสุทธิ	เบิกจ่าย	%การเบิกจ่าย	งบคงเหลือ	กันเงินสุทธิ	เบิกจ่าย	%การเบิกจ่าย	งบคงเหลือ	กันเงินสุทธิ	เบิกจ่าย	%การเบิกจ่าย	งบคงเหลือ
1	อุดรธานี	3,313,575.00	3,313,575.00	100.00%	-	36,647,100.00	7,510,443.00	20.49%	29,136,657.00				0	39,960,675.00	10,824,018.00	27.09%	29,136,657.00
2	สกลนคร	4,362,500.00	4,362,500.00	100.00%	-	65,396,200.00	6,284,200.00	9.61%	59,112,000.00	2,936,004.00	2,936,004.00	100.00%	-	72,694,704.00	13,582,704.00	18.68%	59,112,000.00
3	นครพนม				0	58,444,900.00	0	0.00%	58,444,900.00	1,899,000.00	1,898,000.00	99.95%	1,000.00	60,343,900.00	1,898,000.00	3.15%	58,445,900.00
4	เลย	37,724,043.09	22,702,525.33	60.18%	15,021,517.76	50,375,700.00	10,659,285.97	21.16%	39,716,414.03	23,493,000.00	23,493,000.00	100.00%	-	111,592,743.09	56,854,811.30	50.95%	54,737,931.79
5	หนองคาย	13,455,969.69	1,224,769.69	9.10%	12,231,200.00	116,685,618.00	13,108,500.00	11.23%	103,577,118.00	12,053,800.00	12,053,800.00	100.00%	-	142,195,387.69	26,387,069.69	18.56%	115,808,318.00
6	หนองบัวลำภู				0	8,308,600.00	0	0.00%	8,308,600.00				0	8,308,600.00	0	0.00%	8,308,600.00
7	บึงกาฬ	15,555,718.00	4,670,535.00	30.02%	10,885,183.00	39,668,207.95	18,487,955.31	46.61%	21,180,252.64				0	55,223,925.95	23,158,490.31	41.94%	32,065,435.64
ผลรวม		74,411,805.78	36,273,905.02	48.75%	38,137,900.76	375,526,325.95	56,050,384.28	14.93%	319,475,941.67	40,381,804.00	40,380,804.00	100.00%	1,000.00	490,319,935.73	132,705,093.30	27.07%	357,614,842.43

ลำดับ	จังหวัด	งบลงทุนปี 67 (งบกลาง)				งบลงทุนปี 68 (ครุภัณฑ์)				งบลงทุนปี 68 (สิ่งก่อสร้าง)				ผลรวม			
		วงเงินรวม(บาท)	เบิกจ่าย	%การเบิกจ่าย	งบคงเหลือ	วงเงินรวม(บาท)	เบิกจ่าย	%การเบิกจ่าย	งบคงเหลือ	กันเงินสุทธิ	เบิกจ่าย	%การเบิกจ่าย	งบคงเหลือ	กันเงินสุทธิ	เบิกจ่าย	%การเบิกจ่าย	งบคงเหลือ
1	อุดรธานี	13,000,000.00	695,700.00	5.35%	12,304,300.00	45,792,400.00	5,799,793.50	12.67%	39,992,606.50	559,523,300.00	916,000.00	0.16%	558,607,300.00	618,315,700.00	7,411,493.50	1.20%	610,904,206.50
2	สกลนคร	11,800,000.00	3,500,000.00	29.66%	7,700,000.00	194,340,000.00	9,032,700.00	4.65%	185,307,300.00	113,665,200.00	0	0.00%	113,665,200.00	319,805,200.00	12,532,700.00	3.92%	307,272,500.00
3	นครพนม	550,000.00	0	0.00%	5,500.00	33,100,000.00	33,075,600.00	99.93%	24,400.00				33,650,000.00	33,075,600.00	98.29%	574,400.00	
4	เลย	16,850,000.00	16,833,205.00	99.90%	16,795.00	51,393,000.00	46,657,500.00	90.79%	4,735,500.00	12,377,100.00	300,000.00	2.42%	12,077,100.00	80,620,100.00	63,790,705.00	79.13%	16,829,395.00
5	หนองคาย	7,600,000.00	3,087,000.00	40.62%	4,513,000.00	137,720,500.00	817,500.00	0.59%	120,822,300.00	92,429,900.00	0	0.00%	92,009,200.00	237,750,400.00	3,904,500.00	1.64%	233,845,900.00
6	หนองบัวลำภู	3,350,000.00	0	0.00%	453,000.00	24,385,400.00	10,454,275.00	42.87%	3,533,775.00	34,894,300.00	1,027,000.00	2.94%	33,047,900.00	62,629,700.00	11,481,275.00	18.33%	51,148,425.00
7	บึงกาฬ	1,150,000.00	1,243,955.00	108.17%	-	17,625,000.00	9,776,000.00	55.47%	7,849,000.00	20,809,000.00	0	0	20,809,000.00	39,584,000.00	11,019,955.00	27.84%	28,564,045.00
ผลรวม		54,300,000.00	25,359,860.00	46.70%	24,992,595.00	504,356,300.00	115,613,368.50	22.92%	362,264,881.50	833,698,800.00	2,243,000.00	0.27%	830,215,700.00	1,392,355,100.00	143,216,228.50	10.29%	1,249,138,871.50

ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2568 เวลา 08.00 น.

1.การบริหารจัดการงบลงทุนปี 2567 ที่กันเงินเหลื่อมปีไว้ใช้จ่ายในปี 2568

ภาพรายการงบลงทุนปี 2567 เหลื่อมปี 2568(ก่อสร้างปีเดียว) แยกรายจังหวัด

ลำดับ	จังหวัด	จำนวนทั้งหมด (รายการ)	ทำถึงขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง							จำนวนงวดงานที่ล่าช้า					
			ประกาศผู้ชนะ เสนอราคา	รอลงนาม สัญญา	ลงนามสัญญา	เริ่มงาน ก่อสร้างตาม แผน	กรรมกร ตรวจสอบงาน จ้าง	เบิกจ่ายเงิน ตามงวดงาน	เบิกจ่ายงวด สุกท้ายแล้ว เสร็จ	ไม่มีล่าช้า	ช้า 1 งวด	ช้า 2 งวด	มากกว่า 2 งวด		ไม่มีข้อมูล
													จำนวน	ร้อยละ	
1	อุดรธานี	3	0	0	0	0	0	1	2	1	2	0	0	0.00%	0
2	สกลนคร	4	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0.00%	0
3	นครพนม														
4	เลย	8	0	0	0	4	1	0	3	4	1	2	1	12.50%	0
5	หนองคาย	7	0	0	0	7	0	0	0	4	0	2	1	14.29%	0
6	หนองบัวลำภู														
7	บึงกาฬ	10	0	0	0	2	0	8	0	1	0	8	1	10.00%	0
ผลรวม		32	0	0	0	13	1	9	9	14	3	12	3	9.38%	0

ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2568 เวลา 08.00 น.

รายการงบลงทุนปี 2567 เหลื่อมปี 2568 (ก่อสร้างปีเดียว) ที่ดำเนินการล่าช้า/ยกเลิกสัญญาเดิม/ผู้รับจ้างทิ้งงาน

- ส่งมอบงานล่าช้าเกินกำหนดสัญญา 12 รายการ(หนองคาย 3, บึงกาฬ 9)
- ยกเลิกสัญญาเดิมต้องลงนามสัญญาใหม่เนื่องจากผู้รับจ้างทิ้งงาน 4 รายการ(หนองคาย 3, บึงกาฬ 1)

1.การบริหารจัดการงบลงทุนปี 2567 ที่กันเงินเหลื่อมปีไว้ใช้จ่ายในปี 2568

1.1 รายการงบลงทุนปี 2567 เหลื่อมปี 2568(ก่อสร้างปีเดียว) ที่ดำเนินงานล่าช้า/ยกเลิกสัญญา แยกรายจังหวัด

ลำดับ	ชื่อรายการตาม พ.ร.บ.	ชื่อสถานที่	จังหวัด	ทำถึงขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง	วันที่ลงนามจริง	วันครบกำหนดส่งมอบตามสัญญา	วันที่เบิกจ่ายเงินจริง	จำนวนงวดงานปี 2568 (ระบุงวดงาน)	ปัจจุบันดำเนินการถึงงวดงานที่	จำนวนงวดงานที่ล่าช้า	สาเหตุความล่าช้า	สถานะความเสี่ยง
24	บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ ปฏิบัติการ/ อวูโส/ ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุดมพร ตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 1 หลัง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุดมพร	หนองคาย	18.ผู้ควบคุมงานรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน	20/9/2024	19/3/2025	๒	4	2	2	ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างในงวดที่ 3 สิ้นสุดสัญญา 19 มี.ค.68 มีค่าปรับวันละ 1,109 บาท ได้แจ้งเรียกค่าปรับให้ผู้รับจ้างทราบแล้วให้ผู้รับจ้างปรับแผนการดำเนินงานและเพิ่มแรงงาน ทำงานถึงงวดที่ 2 แต่ส่งมอบงานงวดที่ 1 ไม่ได้รอเอกสารผลการทดสอบดินทดสอบคอนกรีต ทดสอบเหล็กเส้น แรงงานมีน้อย ให้ปรับแผนการทำงานและเพิ่มแรงงานกำหนดส่งงานงวดสุดท้ายภายในเดือน มิถุนายน 2568	เสี่ยงสูง
25	บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ ปฏิบัติการ/ อวูโส/ ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่านศรีสุข ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย 1 หลัง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่านศรีสุข	หนองคาย	18.ผู้ควบคุมงานรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน	7/3/2025	3/9/2025	3/9/2025	5	1	0ไม่มีล่าช้า	ผู้รับจ้างรายเดิมทั้งงาน มอกเลิกสัญญา 21 มี.ค.68 จัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ดำเนินการแทน ลงนามในสัญญาแล้ว 7 มีนาคม 2568 กำหนดส่งมอบตามสัญญา 3 กันยายน 2568 สามารถดำเนินการได้ทัน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 1 กำหนดส่งมอบ 6 พ.ค.68	เสี่ยงสูง
26	บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ ปฏิบัติการ/ อวูโส/ ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเทพประกับ ตำบลนาขี้วัว อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 1 หลัง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเทพประกับ	หนองคาย	18.ผู้ควบคุมงานรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน	14/3/2025	10/9/2025	10/9/2025	5	1	0ไม่มีล่าช้า	ผู้รับจ้างรายเดิมทั้งงาน มอกเลิกสัญญา 21 มี.ค.68 จัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ดำเนินการแทน ลงนามในสัญญาแล้ว 14 มีนาคม 2568 กำหนดส่งมอบตามสัญญา 13 กันยายน 2568 สามารถดำเนินการได้ทัน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 1 กำหนดส่งมอบ 13 พ.ค.68	เสี่ยงพบ
27	บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ ปฏิบัติการ/ อวูโส/ ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าสำราญ ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 1 หลัง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าสำราญ	หนองคาย	18.ผู้ควบคุมงานรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน	7/3/2025	3/9/2025	3/9/2025	5	1	0ไม่มีล่าช้า	ผู้รับจ้างรายเดิมทั้งงาน มอกเลิกสัญญา 21 มี.ค.68 จัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ดำเนินการแทน เริ่มดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 1 กำหนดส่งมอบ 6 พ.ค.68	เสี่ยงสูง
28	บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ ปฏิบัติการ/ อวูโส/ ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาดี ตำบลนาดี อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 1 หลัง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาดี	หนองคาย	18.ผู้ควบคุมงานรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน	20/9/2024	19/3/2025	๒	5	3	2	ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างในงวดที่ 3 สิ้นสุดสัญญา 19 มี.ค.68 มีค่าปรับวันละ 1,109 บาท ได้แจ้งเรียกค่าปรับให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว ให้ผู้รับจ้างปรับแผนการดำเนินงานและเพิ่มแรงงาน สัญญาสิ้นสุด วันที่ 19 มีนาคม 2568 มีการปรับแผนการส่งงานงวดสุดท้าย ภายในเดือน มิถุนายน 2568	เสี่ยงสูง

ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2568 เวลา 08.00 น.

1.การบริหารจัดการงบลงทุนปี 2567 ที่กันเงินเหลื่อมปีไว้ใช้จ่ายในปี 2568

1.1 รายการงบลงทุนปี 2567 เหลื่อมปี 2568(ก่อสร้างปีเดียว) ที่ดำเนินงานล่าช้า/ยกเลิกสัญญา แยกรายจังหวัด(ต่อ)

ลำดับ	ชื่อรายการตาม พ.ร.บ.	ชื่อสถานที่	จังหวัด	ทำถึงขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง	วันที่ลงนามจริง	วันครบกำหนดส่งมอบตามสัญญา	วันที่เบิกจ่ายเงินจริง	จำนวนงวดงานปี 2568 (ระบุงวดงาน)	ปัจจุบันดำเนินการถึงงวดงานที่	จำนวนงวดงานที่ล่าช้า	สาเหตุความล่าช้า	สถานะความเสี่ยง
29	บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ ปฏิบัติการ/ อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผือ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 1 หลัง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผือ	หนองคาย	18.ผู้ควบคุมงานรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน	20/9/2024	19/3/2025		5	2	3	ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างในงวดที่ 3 สิ้นสุดสัญญา 19 มี.ค.68 มีค่าปรับวันละ 1,149 บาทได้แจ้งเรียกค่าปรับให้ผู้รับจ้างรับทราบแล้วให้ผู้รับจ้างปรับแผนการดำเนินงานและเพิ่มแรงงานลงนามในสัญญาแล้ว 20 กันยายน 2567 สัญญาสิ้นสุด วันที่ 19 มีนาคม 2568มีการปรับแผนการส่งงานงวดสุดท้าย ภายในเดือน กรกฎาคม 2568	เสี่ยงสูง
47	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสมสนุก ตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 1 หลัง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสมสนุก	บึงกาฬ	17.ผู้รับจ้างก่อนเริ่มงานก่อสร้างตามแผนแผนบริหารสัญญาและแผนควบคุมงาน	30/8/2024	26/2/2025	งวดที่ 1 เบิกจ่าย 16/12/67 งวดที่ 2 เบิกจ่าย 28/3/2025	5	3	2	เบิกจ่ายงวดงานที่ 1 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2567 เบิกจ่ายงวดงานที่ 2 เมื่อวันที่ 28/03/2568 และงวดที่ 3-5 ตามแผนผู้รับจ้างคาดว่าจะผู้รับจ้างส่งมอบ งวดที่ 3-5 ในเดือนเมษายน 2568 (เงินกันเหลื่อมปี งบประมาณปี 2567 เบิกหมดในเดือน มิถุนายน 2568)	เสี่ยงสูง
48	บ้านพักข้าราชการระดับอำนวยการต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนหญ้านาง ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 1 หลัง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนหญ้านาง	บึงกาฬ	17.ผู้รับจ้างก่อนเริ่มงานก่อสร้างตามแผนแผนบริหารสัญญาและแผนควบคุมงาน	21/3/2025	19/7/2025		4	1	0ไม่มีล่าช้า	ยกเลิกสัญญา ประกาศครั้งที่ 2 และได้ผู้รับจ้างใหม่แล้วจัดทำสัญญา เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2568 งวดงาน 120 วัน และตามแผนผู้รับจ้างจะดำเนินการแล้วเสร็จ 19 กรกฎาคม 2568	เสี่ยงสูง
49	บ้านพักข้าราชการระดับอำนวยการต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุ่ม ตำบลหนองกุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 1 หลัง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุ่ม	บึงกาฬ	25.เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างตามงวดงาน	12/12/2024	11/5/2025	งวดที่ 1 เบิกจ่าย 13/01/2025 งวดที่ 2 เบิกจ่าย 8/5/2025	5	3	2	เบิกจ่ายงวดงานที่ 1 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2568 งวดที่ 2 เบิกจ่าย 8/5/2568 และงวดที่ 3-5 ตามแผนผู้รับจ้างคาดว่าจะผู้รับจ้างส่งมอบ งวดที่ 3-5 ในเดือนมิถุนายน 2568 (เงินกันเหลื่อมปี งบประมาณปี 2567 เบิกหมดในเดือน มิถุนายน 2568)	เสี่ยงสูง
50	บ้านพักข้าราชการระดับอำนวยการต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหัวช้าง ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 1 หลัง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหัวช้าง	บึงกาฬ	25.เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างตามงวดงาน	16/9/2024	15/3/2025	งวดที่ 1 เบิกจ่าย 16/12/2024 งวดที่ 2 เบิกจ่าย 25/04/68	5	3	2	เบิกจ่ายงวดงานที่ 1 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2567 งวดที่ 2 เบิกจ่าย 25/04/68 และงวดที่ 3-5 ตามแผนผู้รับจ้างคาดว่าจะผู้รับจ้างส่งมอบ งวดที่ 2-5 ในเดือนพฤษภาคม 2568 (เงินกันเหลื่อมปี งบประมาณปี 2567 เบิกหมดในเดือน มิถุนายน 2568)	เสี่ยงสูง

ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2568 เวลา 08.00 น.

1.การบริหารจัดการงบลงทุนปี 2567 ที่กันเงินเหลือในปีไว้ใช้จ่ายในปี 2568

1.1 รายการงบลงทุนปี 2567 เหลือปี 2568(ก่อสร้างปีเดียว) ที่ดำเนินงานล่าช้า/ยกเลิกสัญญา แยกรายจังหวัด(ต่อ)

ลำดับ	ชื่อรายการตาม พ.ร.บ.	ชื่อสถานที่	จังหวัด	ทำถึงขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง	วันที่ลงนามจริง	วันครบกำหนดส่งมอบตามสัญญา	วันที่เบิกจ่ายเงินจริง	จำนวนงวดงานปี 2568 (ระบุงวดงาน)	ปัจจุบันดำเนินการถึงงวดงานที่	จำนวนงวดงานที่ล่าช้า	สาเหตุความล่าช้า	สถานะความเสี่ยง
51	บ้านพักข้าราชการระดับอำนวยการต้น/ ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร (โครงสร้างชั้นพื้นดินโหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลท่ากกแดง อำเภอเขกา จังหวัดบึงกาฬ 1 หลัง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลท่ากกแดง	บึงกาฬ	25.เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างตามงวดงาน	12/12/2024	11/5/2025	งวดที่ 1 เบิกจ่าย 16/12/2024 งวดที่ 2 เบิกจ่าย 8/5/2025	5	3	2	เบิกจ่ายงวดงานที่ 1 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2567งวดที่ 2 เบิกจ่าย 8/5/2568และงวดที่ 3-5 ตามแผนผู้รับจ้างคาดว่าจะผู้รับจ้างส่งมอบ งวดที่ 3-5 ในเดือนมิถุนายน 2568 (เงินกันเหลือปี งบประมาณ 2567 เบิกหมดในเดือน มิถุนายน 2568)	เสี่ยงสูง
52	บ้านพักข้าราชการระดับอำนวยการต้น/ ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร (โครงสร้างชั้นพื้นดินโหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านด้อง อำเภอเขกา จังหวัดบึงกาฬ 1 หลัง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านด้อง	บึงกาฬ	25.เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างตามงวดงาน	30/8/2024	26/2/2025	งวดที่ 1 เบิกจ่าย 16/12/2024 งวดที่ 2 เบิกจ่าย 28/3/2025	5	3	2	เบิกจ่ายงวดงานที่ 1 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2567 เบิกจ่ายงวดงานที่ 2 เมื่อวันที่ 28/03/2568 และงวดที่ 3-5ตามแผนผู้รับจ้างคาดว่าจะผู้รับจ้างส่งมอบ งวดที่ 3-5 ในเดือนเมษายน 2568 (เงินกันเหลือปี งบประมาณ 2567 เบิกหมดในเดือน มิถุนายน 2568)	เสี่ยงสูง
53	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร (โครงสร้างชั้นพื้นดินโหว) โรงพยาบาลบึงโขงหลง ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 1 หลัง	โรงพยาบาลบึงโขงหลง	บึงกาฬ	25.เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างตามงวดงาน	30/8/2024	26/2/2025	งวดที่ 1 เบิกจ่าย 16/12/2024 งวดที่ 2 เบิกจ่าย 28/3/2025	5	3	2	เบิกจ่ายงวดงานที่ 1 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2567 เบิกจ่ายงวดงานที่ 2 เมื่อวันที่ 28/03/2568 และงวดที่ 3-5 ตามแผนผู้รับจ้างคาดว่าจะผู้รับจ้างส่งมอบ งวดที่ 3-5 ในเดือนเมษายน 2568 (เงินกันเหลือปี งบประมาณ 2567 เบิกหมดในเดือน มิถุนายน 2568)	เสี่ยงสูง
54	บ้านพักข้าราชการระดับอำนวยการต้น/ ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร (โครงสร้างชั้นพื้นดินโหว) โรงพยาบาลศรีวิไล ตำบลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 1 หลัง	โรงพยาบาลศรีวิไล	บึงกาฬ	25.เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างตามงวดงาน	16/9/2024	15/3/2025	งวดที่ 1 เบิกจ่าย 23/12/2024 งวดที่ 2 เบิกจ่าย 25/04/68	5	3	2	เบิกจ่ายงวดงานที่ 1 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2567 งวดที่ 2 เบิกจ่าย 25/04/68 และงวดที่ 3-5 ตามแผนผู้รับจ้างคาดว่าจะผู้รับจ้างส่งมอบ งวดที่ 2-5 ในเดือนพฤษภาคม 2568 (เงินกันเหลือปี งบประมาณ 2567 เบิกหมดในเดือน มิถุนายน 2568)	เสี่ยงสูง
55	บ้านพักข้าราชการระดับอำนวยการต้น/ ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร (โครงสร้างชั้นพื้นดินโหว) โรงพยาบาลบุงคล้า ตำบลบุงคล้า อำเภอบุงคล้า จังหวัดบึงกาฬ 1 หลัง	โรงพยาบาลบุงคล้า	บึงกาฬ	25.เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างตามงวดงาน	25/9/2024	24/3/2025	งวดที่ 1 ส่งมอบ 22/4/68 รอตรวจรับ	5	2	3	ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างล่าช้าปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างในงวดที่ 2ล่าช้า3 ผู้รับเหมานำเครื่องมืออุปกรณ์ในการก่อสร้างเข้ามาเพิ่มเติมจะดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ภายใน 70 วัน (ภายในเดือน มิถุนายน 2568) ส่งมอบงวดที่ 1 วันที่ 22/4/2568 รอตรวจรับ16/05/2568	เสี่ยงสูง
56	บ้านพักข้าราชการระดับปฏิบัติงาน (บ้านแฝด) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 130 ตารางเมตร (โครงสร้างชั้นพื้นดินโหว) โรงพยาบาลพรเจริญ ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 1 หลัง	โรงพยาบาลพรเจริญ	บึงกาฬ	25.เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างตามงวดงาน	16/9/2024	15/3/2025	งวดที่ 1 เบิกจ่าย 26/11/2024 งวดที่ 2 เบิกจ่าย 25/04/2025	5	3	2	เบิกจ่ายงวดงานที่ 1 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 งวดที่ 2 เบิกจ่าย 25/04/2568 และงวดที่ 3-5 ตามแผนผู้รับจ้างคาดว่าจะผู้รับจ้างส่งมอบ งวดที่ 3-5 ในเดือนพฤษภาคม 2568 (เงินกันเหลือปี งบประมาณ 2567 เบิกหมดในเดือน มิถุนายน 2568)	เสี่ยงสูง

ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2568 เวลา 08.00 น.

1.การบริหารจัดการงบลงทุนปี 2567 ที่กันเงินเหลือในปีไว้ใช้จ่ายในปี 2568

ภาพรายการงบลงทุนปี 2567 เหลือปี 2568(ก่อสร้างผูกพัน) แยกรายจังหวัด

ลำดับ	จังหวัด	จำนวน ทั้งหมด (รายการ)	ทำถึงขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง						จำนวนงวดงานที่ล่าช้า					สถานะความเสี่ยง				
			จัดทำ แผน/TOR/BOQ /ร่างประกาศ	รอลงนาม สัญญา	ลงนาม สัญญา	เริ่มงาน ก่อสร้าง ตามแผน	ผู้ควบคุม งานรายงาน สรุปร	เบิกจ่ายเงิน ตามงวดงาน	ไม่มีล่าช้า	ช้า 1-2 งวด	ช้า 3-4งวด	5 งวดขึ้นไป		ไม่มีข้อมูล	เสี่ยงต่ำ	เสี่ยงกลาง	เสี่ยงสูง	เสี่ยงพบ
												จำนวน	ร้อยละ					
1	อุดรธานี	5	0	0	0	2	0	3	0	4	1	0	0.00%	0	0	3	1	1
2	สกลนคร	4	0	2	0	1	0	1	1	0	1	2	50.00%	0	0	0	1	3
3	นครพนม	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	100.00%	0	0	0	0	2
4	เลย	3	0	0	0	3	0	0	1	0	2	0	0.00%	0	0	0	2	1
5	หนองคาย	3	0	0	0	1	0	2	2	0	1	0	0.00%	0	2	0	1	0
6	หนองบัวลำภู	2	0	0	2	0	0	0	0	1	0	1	50.00%	0	0	0	0	2
7	บึงกาฬ	2	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	50.00%	0	0	0	0	2
ผลรวม		21	1	2	2	10	0	6	4	6	5	6	28.57%	0	2	3	5	11

ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2568 เวลา 08.00 น.

รายการงบลงทุนปี 2567 เหลือปี 2568 (ก่อสร้างผูกพัน) ที่ยังไม่ลงนามสัญญา/ก่อสร้างล่าช้าเกิน 5 งวดงาน/เสี่ยงพบ

- เสี่ยงพบ 11 รายการ(อุดรธานี 1, สกลนคร 3, นครพนม 2, เลย 1, หนองบัวลำภู 2, บึงกาฬ 2)
- ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง 1 รายการ(อาคารผู้โดยสารนอก 3 ชั้น SW.นาหว้า นครพนม)
- รอลงนาม 2 รายการ(อาคารผู้โดยสารนอก SW.พังโคน และอาคารผู้โดยสารนอก 3 ชั้น SW.พระอาจารย์มั่นฯ สกลนคร)
- ก่อสร้างล่าช้า 5 งวดขึ้นไป 6 รายการ(นครพนม2, บึงกาฬ1, สกลนคร2, หนองบัวลำภู1)

1.การบริหารจัดการงบลงทุนปี 2567 ที่กันเงินเหลื่อมปีไว้ใช้จ่ายในปี 2568

1.2 รายการงบลงทุนปี 2567 เหลื่อมปี 2568(ก่อสร้างผูกพัน) ที่ดำเนินงานล่าช้า/เสี่ยงพับ แยกรายจังหวัด

ลำดับ	ชื่อรายการตาม พ.ร.บ.	ชื่อสถานที่	จังหวัด	ทำถึงขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง	วันที่คาดว่าจะลงนามสัญญา	วันที่ลงนามจริง	วันครบกำหนดส่งมอบตามสัญญา	จำนวนงวดงานปี 2568 (ระบุงวดงาน)	ปัจจุบันดำเนินการถึงงวดงานที่	จำนวนงวดงานที่ล่าช้า	สาเหตุความล่าช้า	สถานะความเสี่ยง
1	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,724 ตารางเมตร โรงพยาบาลสุวรรณคูหา ตำบลสุวรรณคูหา อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 1 หลัง	โรงพยาบาลสุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	15.ส่งสำเนาสัญญา/ข้อตกลงให้ สตง. และกรมสรรพากร	๒	29/10/2024	๒	4	2	2	ลงนามสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2567 จำนวน 10 งวด ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้าง งวดที่ 2 ตอกเสาเข็ม จำนวน 61 ต้นแล้ว เริ่มตอกเสาตอหม้อ วางผังคอกอบกริด ดึงเก็บน้ำใต้ดิน อยู่ระหว่างปรับพื้นที่เพื่อทดสอบเสาเข็ม เมื่อผ่านแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการแก้ไขสัญญา และเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินการรายงานผลการทดสอบเสาเข็มเพื่อประชุมคณะกรรมการทวงแก้ไขสัญญา และจะประชุมการแก้ไขสัญญาระหว่าง 8 พค. 2568 คาดว่าจะผู้รับจ้างจะส่งงานงวดที่ 1 และ 2 พร้อมกันภายในเดือน 10 พฤษภาคม 2568 แต่ยังไม่ล่าช้าอยู่ 90 วัน คาดว่าผูกพันงวด 3	เสี่ยงพับ
2	อาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 936 ตารางเมตร โรงพยาบาลหนองบัวลำภู ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 1 หลัง	โรงพยาบาลหนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	14.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดภายหลังพ้นจากระยะเวลาอุทธรณ์	10/4/2025	11/4/2025	๒	8	0	8	1.ยกเลิกประกาศประกวดราคา เมื่อวันที่ 1 ต.ค.67 และขอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกวดราคา bidding ใหม่ /2. อยู่ระหว่างเปิดวิจารณ์ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา 3 วันทำการ สิ้นสุดวันที่ 15 ม.ค.68 /3. ดำเนินการเผยแพร่ประกาศประกวดราคา 12 วันทำการ ประกาศวันที่ 22 ม.ค.68 -7 ก.พ.68 ยื่นเสนอราคา วันที่ 10 ก.พ.68 เปิดพิจารณาได้ 11 ก.พ.68 เป็นต้นไป /4. คณะกรรมการพิจารณาผล จัดทำบันทึกรายงานผลการพิจารณา 17 ก.พ.68 - ลงนามในสัญญาในวันที่ 11 เมษายน 2568	เสี่ยงพับ
7	อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,796 ตารางเมตร โรงพยาบาลหนองหาน ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง	โรงพยาบาลหนองหาน	อุดรธานี	18.ผู้ควบคุมงานรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน	๒	26/11/2024	21/7/2026	3	1	1	- ประชุมเพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงฐานรากเสาเข็มเจาะ เป็นฐานรากชนิดแผ่ เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 68 มีมติอนุมัติในหลักการให้ผู้รับจ้างก่อสร้างฐานรากแบบแผ่ และอยู่ระหว่างส่งเอกสารแบบแปลนให้กองแบบแผนพิจารณา - กองแบบแผนพิจารณาจากเปลี่ยนแปลงฐานรากอาคาร (ฐานรากแผ่) แล้ว ตรงตามข้อกำหนดและรูปแบบ เห็นควรให้ผู้รับจ้างใช้เป็นแนวทางในการก่อสร้างได้ (ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างฐานรากแผ่) - ณ ปัจจุบัน ผู้รับเหมาได้ดำเนินงานก่อสร้างฐานรากชนิดแผ่เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดที่ 1 - 6 ภายในเดือน กันยายน 2568 ผู้บริหารมีการติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง	เสี่ยงพับ
19	หอผู้ป่วยใน 7 ชั้น (จำนวน 156 เตียง) เป็นอาคาร คสล.7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,184 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลวังสะพุง ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 1 หลัง	โรงพยาบาลวังสะพุง	เลย	18.ผู้ควบคุมงานรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน	9มค2025	9มค2025	7รค2026	1	2	0ไม่มีล่าช้า	ปัจจุบันอยู่งานงวดที่2/20	เสี่ยงพับ
40	อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุฉุกเฉิน บำบัดรักษาและสำนักงาน เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 11,600 ตารางเมตร โรงพยาบาลพังโคน ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 1 หลัง	โรงพยาบาลพังโคน	สกลนคร	11.จัดทำบันทึกรายงานผลการพิจารณา	12-30 เม.ย.2025	-	๒	6	0	19	- สำนักงบประมาณเห็นชอบความเหมาะสมของราคาของรายการอาคารผู้ป่วยนอกฯ (หนังสือด่วนที่สุดที่ รส 0712/2465 ลว. 31 ม.ค.68) - รบว.สาธารณสุขุลงนามอนุมัติขยายเวลาท่อนี้ผูกพันข้ามปีถึงปี 2571 (3 มี.ค.68) - ผู้เสนออาคารรายที่ 1 ไม่ยื่นราคา - ผู้เสนออาคารรายที่ 2 ยื่นราคา 120 วัน - อยู่ระหว่าง พวจ.ลงนามในรายงานผลการพิจารณาครั้งที่ 2 เสนอ ผู้ตรวจราชการเขต 8 อนุมัติ (จบปี 67 มี 6 งวดงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ 1 งวด 11,497,920 บาท จบปี 5 งวดงาน 37,222,080 บาท)	เสี่ยงพับ

1.การบริหารจัดการงบลงทุนปี 2567 ที่กันเงินเหลื่อมปีไว้ใช้จ่ายในปี 2568

1.2 รายการงบลงทุนปี 2567 เหลื่อมปี 2568(ก่อสร้างผูกพัน) ที่ดำเนินงานล่าช้า/เสี่ยงพับ แยกรายจังหวัด(ต่อ)

ลำดับ	ชื่อรายการตาม พ.ร.บ.	ชื่อสถานที่	จังหวัด	ทำถึงขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง	วันที่คาดว่าจะลงนามสัญญา	วันที่ลงนามจริง	วันครบกำหนดส่งมอบตามสัญญา	จำนวนงวดงานปี 2568 (ระบุงวดงาน)	ปัจจุบันดำเนินการถึงงวดงานที่	จำนวนงวดงานที่ล่าช้า	สาเหตุความล่าช้า	สถานะความเสี่ยง
41	อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,919 ตารางเมตร โรงพยาบาลบ้านม่วง ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 1 หลัง	โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต	สกลนคร	13.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา	กลางเดือนพฤษภาคม	-	☐	0	0	10	- ครบกำหนดประกาศผู้ชนะ ไม่มีผู้อุทธรณ์ อยู่ระหว่างเสนอรายงานผลการอุทธรณ์ และ เสนอหนังสือเรียกทำสัญญา รอง ผวจ.สกลนคร / สป. เห็นชอบหนังสือขอย้ายระยะเวลาการใช้บผูกพัน และหนังสือขอความเห็นชอบ จาก (หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0712/4123 ลงวันที่ 3 เม.ย.2568) - คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายใน พ.ค.68 (จบปี 67 มี 3 งวดงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ 2 งวดงาน 8,937,068.40 บาท จนพับ 1 งวดงาน 1,454,931.60 บาท)	เสี่ยงพับ
42	ห้องชุดครอบครัว 24 ครอบครัว เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 819 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่องดาว ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 1 หลัง	โรงพยาบาลพระอาจารย์วัน อุตต	สกลนคร	17.ผู้รับจ้างก่อนเริ่มงานก่อสร้างตามแผนบริหารสัญญาและแผนควบคุมงาน	-	31/10/2024	26/10/2025	2	4	4	- ส่งมอบงานและตรวจรับงานงวดที่ 3 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างส่งตั้งเบิกจ่ายเงิน และดำเนินการก่อสร้างงานงวดที่ 4	เสี่ยงพับ
45	อาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง (มาตรฐาน) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,508 ตารางเมตร (โครงสร้างชั้นพื้นดินไหว) โรงพยาบาลศรีสงคราม ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 1 หลัง	โรงพยาบาลศรีสงคราม	นครพนม	17.ผู้รับจ้างก่อนเริ่มงานก่อสร้างตามแผนบริหารสัญญาและแผนควบคุมงาน	☐	14/3/2025	11/3/2026	8	0	8	ลงนามสัญญาวันที่ 14 มีนาคม 2568 สิ้นสุดสัญญา 11 มีนาคม 2569 อยู่ในขั้นตอนการประชุมพิจารณาการปักฟัง, ผลการทดสอบการรับน้ำหนักของดิน,ผลการทดสอบแท่งคอนกรีต, และการอนุมัติใช้วัสดุก่อสร้างของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ในวันที่ 14 พ.ค.68	เสี่ยงพับ
46	อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,919 ตารางเมตร (โครงสร้างชั้นพื้นดินไหว) โรงพยาบาลนาหว้า ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 1 หลัง	โรงพยาบาลนาหว้า	นครพนม	3.กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ/ขอบเขตของงาน (TOR) /BOQ	19/5/2025	☐	☐	10	0	10	ประกาศครั้งที่ 2 รายงานผลการกำหนดราคากลางแล้ว อยู่ระหว่างเสนอพิจารณาลงนามเห็นชอบพร้อมประกาศขึ้นร่างฯ	เสี่ยงพับ
57	อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 23,765 ตารางเมตรโรงพยาบาลบึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 หลัง	โรงพยาบาลบึงกาฬ	บึงกาฬ	17.ผู้รับจ้างก่อนเริ่มงานก่อสร้างตามแผนบริหารสัญญาและแผนควบคุมงาน	☐	22/3/2024	5/3/2026	23	1	6	เนื่องจาก สัญญาจ้างก่อสร้าง ลงนามในวันที่ 11 มีนาคม 2567 เริ่มเข้าดำเนินการก่อสร้างในเดือนเมษายน 2567 ** การดำเนินงานก่อสร้าง ในงวดงานที่ 1 การก่อสร้างฐานราก อยู่ในช่วงฤดูฝน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2567- เดือน สิงหาคม 2567 มีน้ำท่วมขังฐานราก และบริเวณโครงการก่อสร้างเป็นบ่อน้ำเดิม (ตม้ำ) ทำให้มีน้ำซึม ส่งผลให้ไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างได้	เสี่ยงพับ
58	อาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,487 ตารางเมตร (โครงสร้างชั้นพื้นดินไหว) โรงพยาบาลบึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 หลัง	โรงพยาบาลบึงกาฬ	บึงกาฬ	18.ผู้ควบคุมงานรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน	☐	11/9/2024	☐	9	3	1	ตรวจรับงวด 3 วันที่ 21 มีนาคม 2568 เนื่องจากเบิกจ่ายไม่ทัน จึงทำเรื่องขอยกเวลาเบิกจ่ายงวด 3 วงเงิน 3 ล้านบาท	เสี่ยงพับ

ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2568 เวลา 08.00 น.

2.การบริหารจัดการงบประมาณปี 2568

2.1 การบริหารงบประมาณ(ครุภัณฑ์)ปี 2568

ลำดับ	จังหวัด	จำนวนทั้งหมด (รายการ)	จัดทำแผน/กำหนด spec		ประกาศเชิญชวน		รอลงนามสัญญา		ลงนามสัญญา		รอส่งมอบ/ตรวจรับ		เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	
			18/4/2568	15/5/2568	18/4/2568	15/5/2568	18/4/2568	15/5/2568	18/4/2568	15/5/2568	18/4/2568	15/5/2568	18/4/2568	15/5/2568
1	อุดรธานี	495	0	0	0	0	1	0	1	1	3	1	490	493
2	สกลนคร	36	0	0	0	0	1	0	7	6	1	1	27	29
3	นครพนม	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28
4	เลย	73	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1	70	70
5	หนองคาย	127	0	0	0	0	11	10	26	25	1	0	89	92
6	หนองบัวลำภู	502	1	1	0	0	3	1	27	6	2	1	469	493
7	บึงกาฬ	15	0	0	0	0	0	0	8	7	3	2	4	6
รวม		1,276	1	1	0	0	16	11	71	47	11	6	1,177	1,211

ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2568 เวลา 08.00 น.

ภาพรวมรายการงบประมาณปี 2568 (ครุภัณฑ์)

- เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 1,211 หน่วย (94.90%) เพิ่มขึ้น 34 รายการ (2.67%) เมื่อเทียบกับเดือนก่อน
- อยู่ระหว่างกำหนด spec/TOR ใหม่ 1 หน่วย เนื่องจากยกเลิกประกาศครั้งแรก (กล้องส่องตรวจและผ่าตัดช่องท้องฯ สว.ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู)
- รอลงนามสัญญา 10 หน่วย(เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติฯ สว.นากลาง 1 หน่วย , เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร และความดันฯ สว.หนองคาย 10 หน่วย)

2.การบริหารจัดการงบลงทุนปี 2568

2.1 การบริหารงบลงทุน(ครุภัณฑ์)ปี 2568 เฉพาะรายการที่ยังไม่ลงนามสัญญา แยกรายจังหวัด

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย(บาท)	จำนวน	ชื่อสถานที่	จังหวัด	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	ทำถึงขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง	วันที่ลงนามสัญญาจริง	วันครบกำหนดส่งมอบตามสัญญา	เดือนที่คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	สาเหตุความล่าช้า
93	กล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องท้องชนิดวีดีทัศน์แบบคมชัดสูงชนิดภาพ 2 มิติ	2,500,000.00	1	โรงพยาบาลศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	E.bidding	4.ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อรับคำวิจารณ์		23 กค.2025	1/7/2025	ได้ประกาศยกเลิก e-bidding.วันที่ 10 เมย. 68 เนื่องจากมีผู้ผ่านการเชิญไว้ 1 ราย
117	เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติด้วยแก๊สเอทิลีนออกไซด์ 100 % แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 150 ลิตร	790,000.00	1	โรงพยาบาลนากลาง	หนองบัวลำภู	E.bidding	15.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา		๒	1/3/2025	กำหนดรับใบเสนอราคา 11 เมย.68
185	เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร และความดันพร้อมระบบเครื่องอัตโนมัติ	1,500,000.00	10	โรงพยาบาลหนองคาย	หนองคาย	E.bidding	10.จัดทำบันทึกรายงานผลการพิจารณาพร้อมเสนอหัวหน้าหน่วยงานให้ความเห็นชอบ		๒	1/9/2025	ยื่นเสนอราคา 10.เม.ย.68 จำนวน 2 ราย 1. บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) 2. บริษัท ดูฮอสเมด จำกัด คณะกรรมการฯ พิจารณาให้บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด เป็นผู้ชนะเสนอราคา 14,970,000 บาท ประกาศผู้ชนะวันที่ 7 พ.ค.68 (เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ 7 วัน เริ่ม 7 พ.ค.68 ถึง 19 พ.ค.68) รายงานผลอุทธรณ์ประมาณ วันที่ 20 พ.ค.68 คาดว่าแจ้งมาลงนามในสัญญาได้ประมาณ วันที่ 28-30 พ.ค.2568

ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2568 เวลา 08.00 น.

2.การบริหารจัดการงบประมาณปี 2568

2.2 การบริหารงบลงทุน(สิ่งก่อสร้าง)ปี 2568

ลำดับ	จังหวัด	จำนวนทั้งหมด (รายการ)	ทำถึงขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง								สถานะความเสี่ยง			
			จัดทำ แผน/TOR/BO Q/ร่างประกาศ	ประกาศเชิญ ชวน	รอลงนาม สัญญา	ลงนามสัญญา	เริ่มก่อสร้าง/ จัดหาตามแผน	คกก.ตรวจรับ	เบิกจ่ายเงิน งวดสุดท้าย	ส่งคืนงบ ประมาณ	เสี่ยงต่ำ	เสี่ยงกลาง	เสี่ยงสูง	
											(รายการ)	(รายการ)	(รายการ)	ร้อยละ
1	อุดรธานี	14	0	1	0	0	3	4	4	2	6	0	9	64.29%
2	สกลนคร	4	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	5	125.00%
3	นครพนม													
4	เลย	3	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	3	100.00%
5	หนองคาย	4	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	4	100.00%
6	หนองบัวลำภู	7	1	0	1	5	0	0	0	0	4	0	3	42.86%
7	บึงกาฬ	5	0	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0.00%
ผลรวม		37	3	2	1	5	15	4	5	2	16	0	24	64.86%

ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2568 เวลา 08.00 น.

รายการงบลงทุน68(สิ่งก่อสร้าง) ที่ยังไม่ลงนามสัญญา

- อยู่ระหว่างกำหนด spec/TOR 3 รายการ(หนองคาย 2 รายการ/ หนองบัวลำภู 1 รายการ)
- อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน 2 รายการ(อุดรธานี 1 รายการ/ สกลนคร 1 รายการ)
- รอลงนาม 1 รายการ(หนองบัวลำภู 1 รายการ)

2.การบริหารจัดการงบลงทุนปี 2568

2.2 การบริหารงบลงทุน(สิ่งก่อสร้าง)ปี 2568 เฉพาะรายการที่ยังไม่ลงนามสัญญา แยกรายจังหวัด

ลำดับ	รายการ	จำนวน	วงเงินรวม(บาท)	ชื่อสถานที่	จังหวัด	ประเภทคำขอ	ทำถึงขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง	วันที่คาดว่าจะลงนามสัญญา	วันที่ลงนามจริง	วันครบกำหนดส่งมอบตามสัญญา	วันที่คาดว่าจะส่งมอบงานงวดสุดท้าย	งวดงานทั้งสิ้น	จำนวนงวดงานปี 2568	สาเหตุความล่าช้า
10	หอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (จำนวน 114 เตียง) เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,797 ตารางเมตร	1	108,861,600.00	โรงพยาบาลพังโคน	สกลนคร	ก่อสร้างผูกพัน	7.เผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง	สิ้นเดือนพฤษภาคม	-	☹	☹	14		อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา ตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย.68 ถึง 21 พ.ค.68 เสนอราคา 22 พ.ค.68
2	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง เป็นอาคาร คสล.7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,908 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	1	75,239,200.00	โรงพยาบาลโพนพิสัย	หนองคาย	ก่อสร้างผูกพัน	3.กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ/ขอบเขตของงาน (TOR) /BOQ	15/5/2025	ยกเลิกประกาศเนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา	☹	27/10/2026	15	5	กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 26 มี.ค.68 แต่ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ดำเนินการประกาศใหม่ ครั้งที่ 2 อยู่ระหว่างรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายลงนามประกาศยกเลิกประกาศเชิญชวนก่อนดำเนินการครั้งที่ 2
33	อาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพ (ระดับปฐมภูมิ) เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 611 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	1	13,481,000.00	โรงพยาบาลรัตนวาปี	หนองคาย	ก่อสร้างปีเดียว	3.กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ/ขอบเขตของงาน (TOR) /BOQ	9/5/2025	"ยกเลิกประกาศเนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา"	☹	26/3/2026	6	2	กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 14 มี.ค.68 แต่ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ดำเนินการประกาศใหม่ ครั้งที่ 2 อยู่ระหว่างรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายลงนามประกาศยกเลิกประกาศเชิญชวนก่อนดำเนินการครั้งที่ 2
8	อาคารทันตกรรม 8 ยูนิต เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 766 ตารางเมตร	1	25,147,900.00	โรงพยาบาลสุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	ก่อสร้างผูกพัน	5.ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา	10 กค.2025	21 พค.2025	☹	20/4/2026	8	2	เสนออนุมัติใช้ราคากลางต่อผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 31 มี.ค.68 -ราคากลาง หมดอายุ จึงต้องจัดทำราคากลางใหม่ -กำหนดประชุม ทก.ราคากลางใหม่ ในวันที่ 15 พค. 68 -สาเหตุที่ดำเนินการจัดจ้างไม่ทันเนื่องจาก รองฯ ผวอ.ได้ลาในช่วงที่เสนอ จึงอนุมัติไม่ทันภายในอายุราคากลางเดิม
23	อาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 576 ตารางเมตร	1	8,596,400.00	โรงพยาบาลโนนสัง	หนองบัวลำภู	ก่อสร้างปีเดียว	13.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา	8 กค.2025	21 พค.2025	☹	20/3/2026	6	2	ประกาศผู้ชนะราคาวันที่ 6 พค.68 เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ถึง 16 พค.68
1	อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.9 ชั้น และ 1 ชั้นใต้ดิน พื้นที่ใช้สอยประมาณ 31,420 ตารางเมตร	1	537,170,000.00	โรงพยาบาลอุดรธานี	อุดรธานี	ก่อสร้างผูกพัน	9.กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	15/7/2025	☹	☹	☹			ขั้นตอนการจัดทำราคากลาง ขั้นตอนการขออนุมัติราคากลางล่าช้า

ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2568 เวลา 08.00 น.

การติดตามความก้าวหน้า

การบริหารจัดการ งบประมาณเชื่อมโยง

เขตสุขภาพที่ 8

16 พฤษภาคม 2568

GROUP LINE


ผู้ประสานงานจังหวัด





การบริหารจัดการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เขตสุขภาพที่ 8



ร้อยละ เงินจัดสรร ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง ในสังกัด สป.สร.

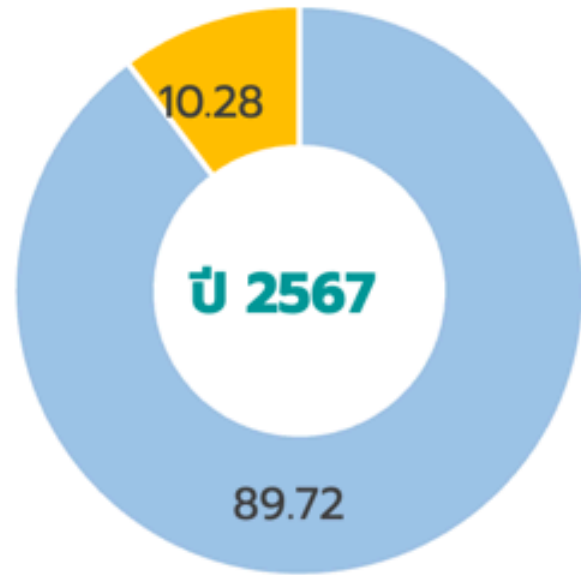

■ ครุภัณฑ์ ■ สิ่งก่อสร้าง (ซ่อมแซม)

ภาพรวมการจัดสรร ปี 2567 วงเงินทั้งสิ้น 521,816,797.42 บาท			
รายการ	70%	20%	10%
จัดสรร	365,271,758.19 (2,846 รายการ)	104,363,359.49 (541 รายการ)	52,181,679.74 (135 รายการ)
เบิกจ่าย	346,514,027.92 (2,818 รายการ)	83,272,381.89 (520 รายการ)	43,071,679.74 (127 รายการ)
คงเหลือ	18,757,730.27 (28 รายการ)	21,090,977.60 (21 รายการ)	9,110,000.00 (8 รายการ)

วงเงินและร้อยละการเบิกจ่าย (งบค่าเสื่อม) ในสังกัด สป.สร. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

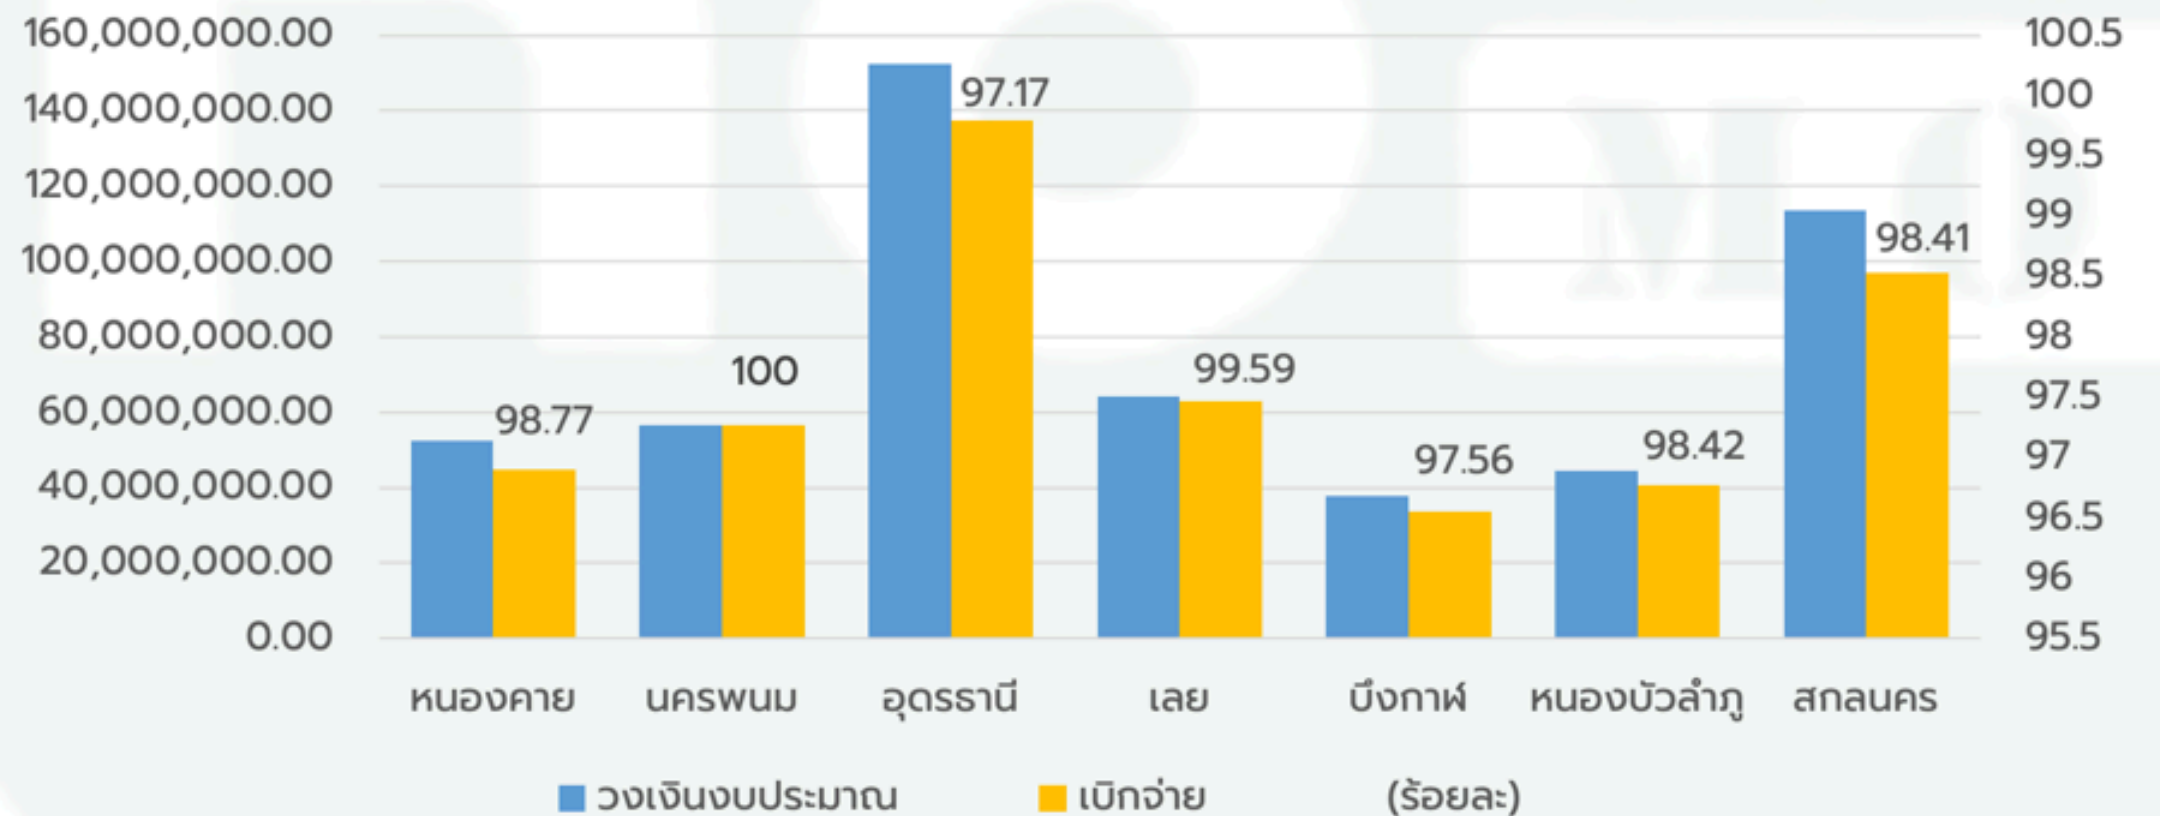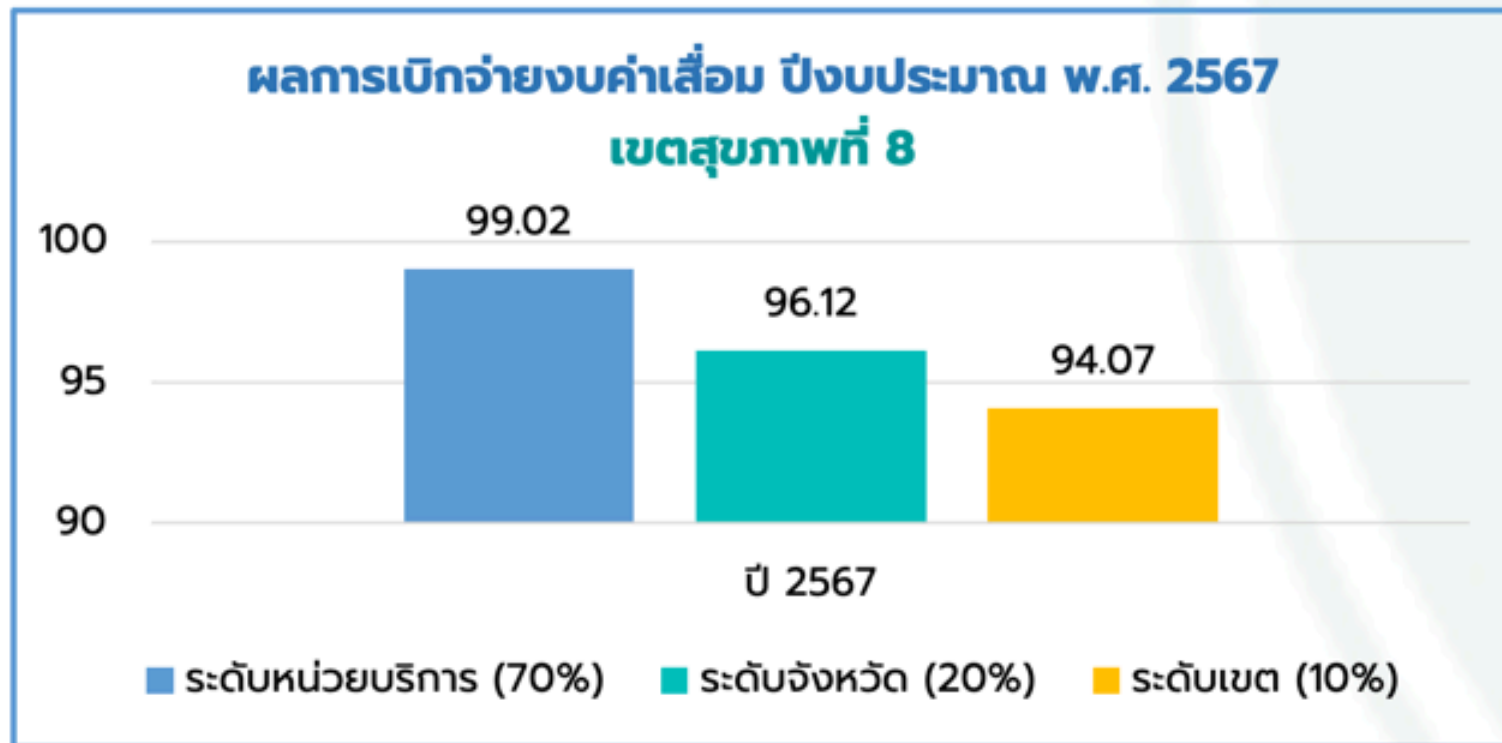



สรุปสถานการณ์ดำเนินงาน (ตามจำนวนรายการ) ปีงบประมาณ 2567 ประเภทงบ ในสังกัด สป.สร. เขตสุขภาพที่ 8


ลำดับ	จังหวัด	วงเงินงบประมาณ	รายการ	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้างแล้ว		ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว		ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว		เบิกจ่ายเงินแล้ว					
				รายการ	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	งบตามแผน	งบที่ใช้ไป	เงินเหลือจ่าย	% เงินเหลือจ่าย
1	หนองคาย	52,570,194.50	324	0	0	3	0.93	1	0.3	320	98.8	44,820,194.50	44,303,093.17	517,101.33	1.15
2	นครพนม	56,553,341.14	328	0	0	0	0	0	0	328	100	56,553,341.14	56,389,443.29	163,897.85	0.29
3	อุดรธานี	152,357,970.55	953	2	0.21	20	2.1	5	0.5	926	97.2	137,330,606.81	134,413,196.80	2,917,410.01	2.12
4	เลย	64,203,282.05	490	1	0.2	0	0	1	0.2	488	99.6	62,848,282.05	62,607,866.88	240,415.17	0.38
5	บึงกาฬ	37,928,558.17	164	0	0	4	2.44	0	0	160	97.6	33,655,577.90	33,166,303.91	489,273.99	1.45
6	หนองบัวลำภู	44,586,238.65	569	3	0.53	5	0.88	1	0.2	560	98.4	40,736,238.65	40,503,938.18	232,300.47	0.57
7	สกลนคร	113,617,212.36	694	2	0.29	8	1.15	1	0.1	683	98.4	96,913,848.50	96,301,999.22	611,849.28	0.63
รวม เขต 8		521,816,797.42	3,522	8	0.23	40	1.14	9	0.3	3,465	98.4	472,858,089.55	467,685,841.45	5,172,248.10	1.09

**** ขอเร่งรัดให้ดำเนินการลงนามในสัญญา-เบิกจ่าย ให้แล้วเสร็จก่อน กรกฎาคม 2568 ****



การบริหารจัดการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เขตสุขภาพที่ 8 (ไม่รวม รพ.สต.ถ่ายโอน)

ร้อยละ เงินจัดสรร ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง ในสังกัด สป.สร.


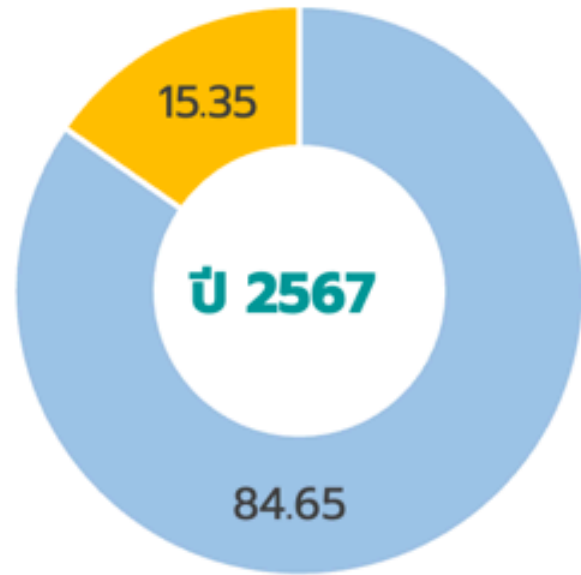


■ ครุภัณฑ์ ■ สิ่งก่อสร้าง (ซ่อมแซม)

ภาพรวมการจัดสรร ปี 2567 วงเงินทั้งสิ้น 486,486,750.12 บาท

รายการ	70%	20%	10%
จัดสรร	333,217,010.89 (1,828 รายการ)	101,183,559.49 (475 รายการ)	52,086,679.74 (131 รายการ)
เบิกจ่าย	310,549,804.03 (1,802 รายการ)	79,786,522.85 (454 รายการ)	45,405,504.74 (124 รายการ)
คงเหลือ	22,667,206.86 (26 รายการ)	21,397,036.64 (21 รายการ)	6,681,175.00 (7 รายการ)

วงเงินและร้อยละการเบิกจ่าย (งบค่าเสื่อม) ในสังกัด สป.สร. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

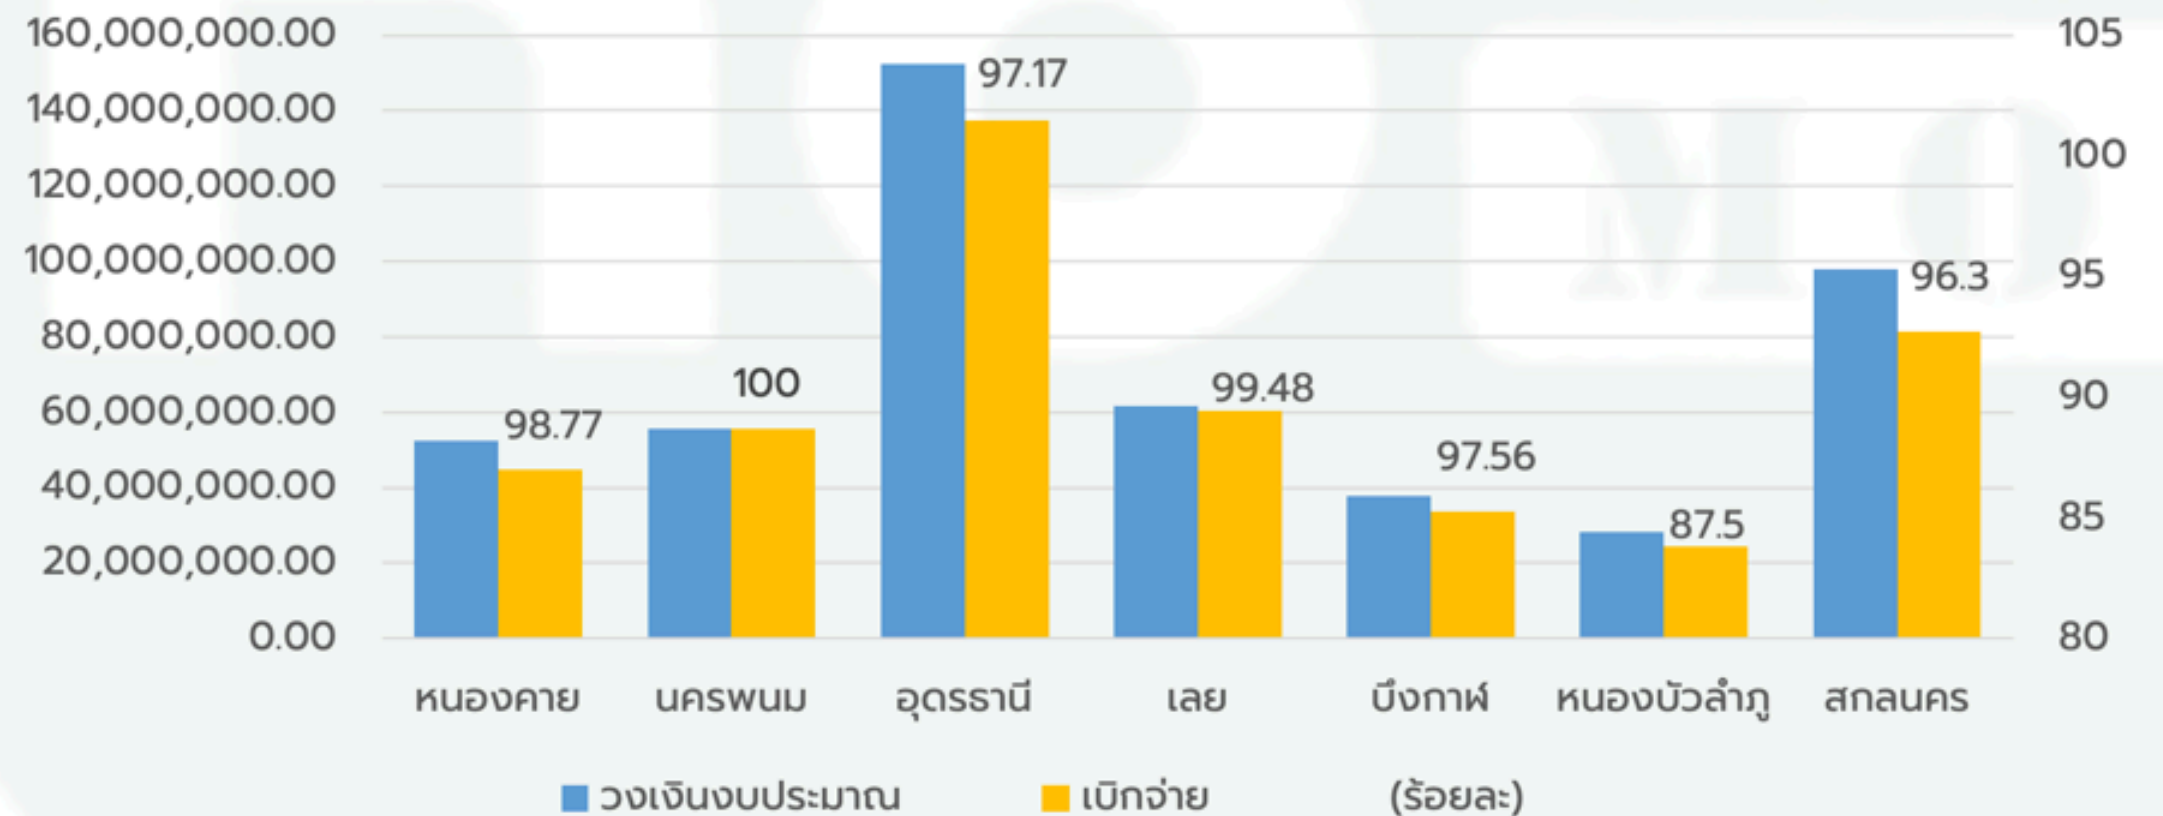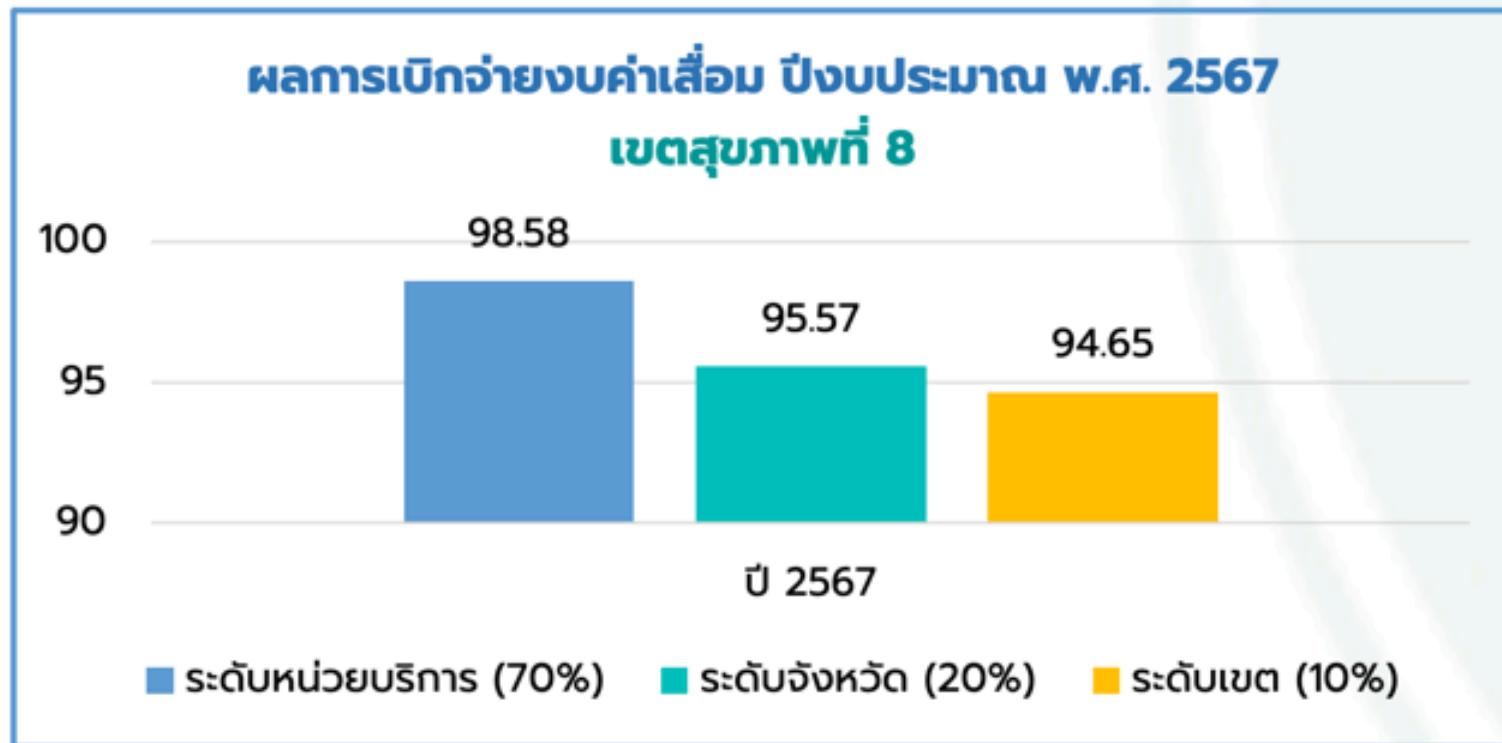



สรุปสถานการณ์ดำเนินงาน (ตามจำนวนรายการ) ปีงบประมาณ 2567 ประเภทงบ ในสังกัด สป.สร. เขตสุขภาพที่ 8 (ไม่รวม sw.สต. ต่ายโอบ)

ลำดับ	จังหวัด	วงเงินงบประมาณ	รายการ	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้างแล้ว		ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว		ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว		เบิกจ่ายเงินแล้ว					
				รายการ	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	งบตามแผน	งบที่ใช้ไป	เงินเหลือจ่าย	% เงินเหลือจ่าย
1	หนองคาย	52,570,194.50	324	0	0	3	0.93	1	0.31	320	98.77	44,820,194.50	44,303,093.17	517,101.33	1.15
2	นครพนม	55,523,441.14	292	0	0	0	0	0	0	292	100	55,523,441.14	55,368,153.29	155,287.85	0.28
3	อุดรธานี	152,357,970.55	953	2	0.21	20	2.10	5	0.52	926	97.17	137,330,606.81	134,413,196.80	2,917,410.01	2.12
4	เลย	61,662,182.05	386	1	0.26	0	0	1	0.26	384	99.48	60,307,182.05	60,069,867.88	237,314.17	0.39
5	บึงกาฬ	37,928,558.17	164	0	0	4	2.44	0	0	160	97.56	33,655,577.90	33,166,303.91	489,273.99	1.45
6	หนองบัวลำภู	28,377,251.61	72	3	4.17	5	6.94	1	1.39	63	87.50	24,527,251.61	24,400,331.61	126,920.00	0.52
7	สกลนคร	98,067,152.10	243	2	0.82	6	2.47	1	0.41	234	96.30	81,363,788.24	80,751,938.96	611,849.28	0.75
รวม เขต 8		486,486,750.12	2,434	8	0.33	38	1.56	9	0.37	2379	97.74	437,528,042.25	432,472,885.62	5,055,156.63	1.16

จังหวัดที่ยังไม่ลงนามในสัญญา

- อุดรธานี = 2
- เลย = 1
- หนองบัวลำภู = 3
- สกลนคร = 2

**** ขอเร่งรัดให้ดำเนินการลงนามในสัญญา-เบิกจ่าย ให้แล้วเสร็จก่อน กรกฎาคม 2568 ****



สรุปสถานการณ์ดำเนินงาน (ตามจำนวนรายการ) ปีงบประมาณ 2567 ประเภทงบ ในสังกัด สป.สร. เขตสุขภาพที่ 8 (ไม่รวม sw.สต. ต่ายโอน)


หน่วยงานที่ยังไม่ลงนามในสัญญา

จังหวัด	หน่วยบริการแม่ข่าย	หน่วยบริการลูกข่าย	ประเภทแผน	ประเภท	รายการ	จำนวน	รวมเงิน	หมายเหตุ การดำเนินการ
อุดรธานี	sw.อุดรธานี	sw.อุดรธานี	หน่วยบริการ	ครุภัณฑ์	ชุดเครื่องมือผ่าตัดสมองพื้นฐาน	1	600,000.00	อยู่ระหว่างการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
อุดรธานี	sw.หนองหาน	sw.หนองหาน	จังหวัด	ครุภัณฑ์	เครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด์	1	805,000.00	ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 อยู่ในขั้นตอนส่งเรื่องอุทธรณ์ไปที่กรมบัญชีกลาง เพื่อพิจารณา เนื่องจากบริษัทฯ เข้าอุทธรณ์
เลย	sw.ปากชม	sw.ปากชม	จังหวัด	ครุภัณฑ์	เครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด์	1	805,000.00	อยู่ระหว่างการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หนองบัวลำภู	sw.ศรีบุญเรือง	sw.ศรีบุญเรือง	หน่วยบริการ	ครุภัณฑ์	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ	1	930,000.00	อยู่ระหว่างการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หนองบัวลำภู	sw.ศรีบุญเรือง	sw.ศรีบุญเรือง	เขต	ครุภัณฑ์	ยูนิตทำฟัน	1	460,000.00	อยู่ระหว่างการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หนองบัวลำภู	sw.ศรีบุญเรือง	sw.ศรีบุญเรือง	จังหวัด	ครุภัณฑ์	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ	1	930,000.00	อยู่ระหว่างการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
สกลนคร	sw.กุสุมาลย์	sw.กุสุมาลย์	จังหวัด	ครุภัณฑ์	เครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด์	1	805,000.00	อยู่ระหว่างการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
สกลนคร	sw.พังโคน	sw.พังโคน	จังหวัด	ครุภัณฑ์	รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง	1	2,500,000.00	อยู่ระหว่างการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์



การบริหารจัดการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เขตสุขภาพที่ 8

ประเภทงบ ในสังกัด สป.สร. เขต 08 อุตรดิตถ์

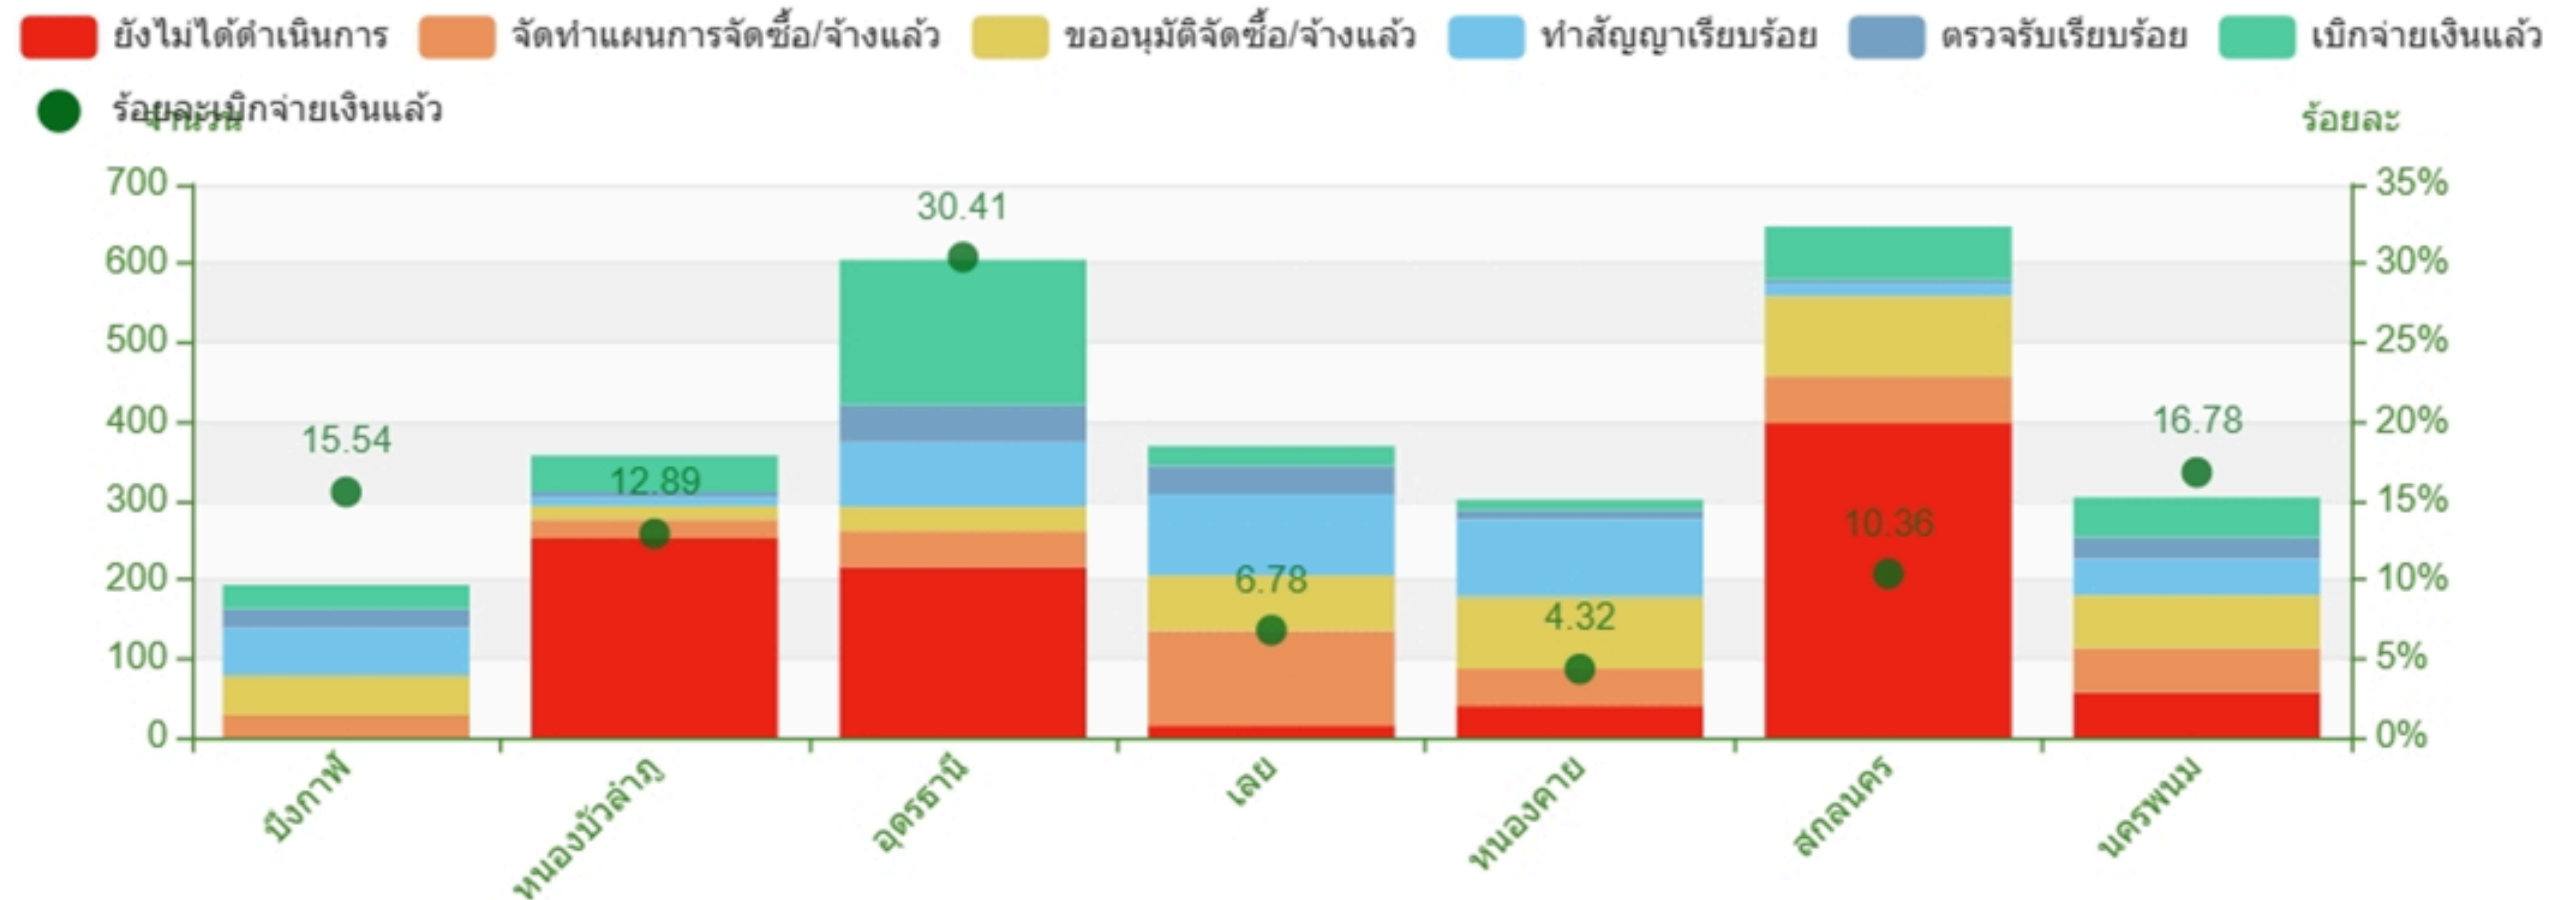

สรุปสถานะการดำเนินงาน (ตามจำนวนรายการ) ปีงบประมาณ 2568ประเภทงบ ในสังกัด สป.สร. เขต 08 อุตรดิตถ์

ลำดับ	จังหวัด	วงเงิน งบประมาณ	งบประมาณตาม แผนทั้งหมด	รายการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จัดทำแผนการ จัดซื้อ/จ้างแล้ว		ขออนุมัติจัดซื้อ/ จ้างแล้ว		ทำสัญญา เรียบร้อย		ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว		เบิกจ่ายเงินแล้ว					
					จำนวน	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	งบตามแผน	งบที่ใช้ไป	เงินเหลือจ่าย	% เงิน เหลือจ่าย		
1	หนองคาย	52,199,237.56	52,199,237.56	301	40	13.29	47	15.61	91	30.23	98	32.56	12	3.99	13	4.32	595,630.13	594,967.00	663.13	0.11
2	นครพนม	57,588,018.82	57,588,018.82	304	57	18.75	56	18.42	67	22.04	46	15.13	27	8.88	51	16.78	4,776,083.40	4,763,820.00	12,263.40	0.26
3	อุตรดิตถ์	152,570,263.90	152,570,263.90	605	216	35.7	45	7.44	31	5.12	82	13.55	47	7.77	184	30.41	19,881,461.94	19,842,056.37	39,405.57	0.2
4	เลย	61,825,681.47	61,825,681.47	369	15	4.07	120	32.52	70	18.97	103	27.91	36	9.76	25	6.78	2,106,400.00	2,106,400.00	0	0
5	บึงกาฬ	36,395,294.66	36,395,294.66	193	0	0	28	14.51	50	25.91	61	31.61	24	12.44	30	15.54	2,136,207.37	2,106,847.37	29,360.00	1.37
6	หนองบัวลำภู	41,533,467.64	41,533,467.64	357	252	70.59	24	6.72	17	4.76	11	3.08	7	1.96	46	12.89	1,217,996.00	1,216,676.00	1,320.00	0.11
7	สกลนคร	119,909,903.13	119,909,903.13	647	398	61.51	59	9.12	102	15.77	16	2.47	5	0.77	67	10.36	1,826,700.00	1,824,990.00	1,710.00	0.09
รวม				2,776	978	35.23	379	13.65	428	15.42	417	15.02	158	5.69	416	14.99	32,540,478.84	32,455,756.74	84,722.10	0.26



GROUP LINE CPO



THANK YOU

FOR YOUR ATTENTION


 <https://r8way.moph.go.th>





**ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผนงานบูรณาการ
ป้องกัน ปรามปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ประจำปีงบประมาณ 2568**


แผนการจัดสรรงบประมาณ 2568 ให้แก่หน่วยงานส่วนภูมิภาค สังกัด สป. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด

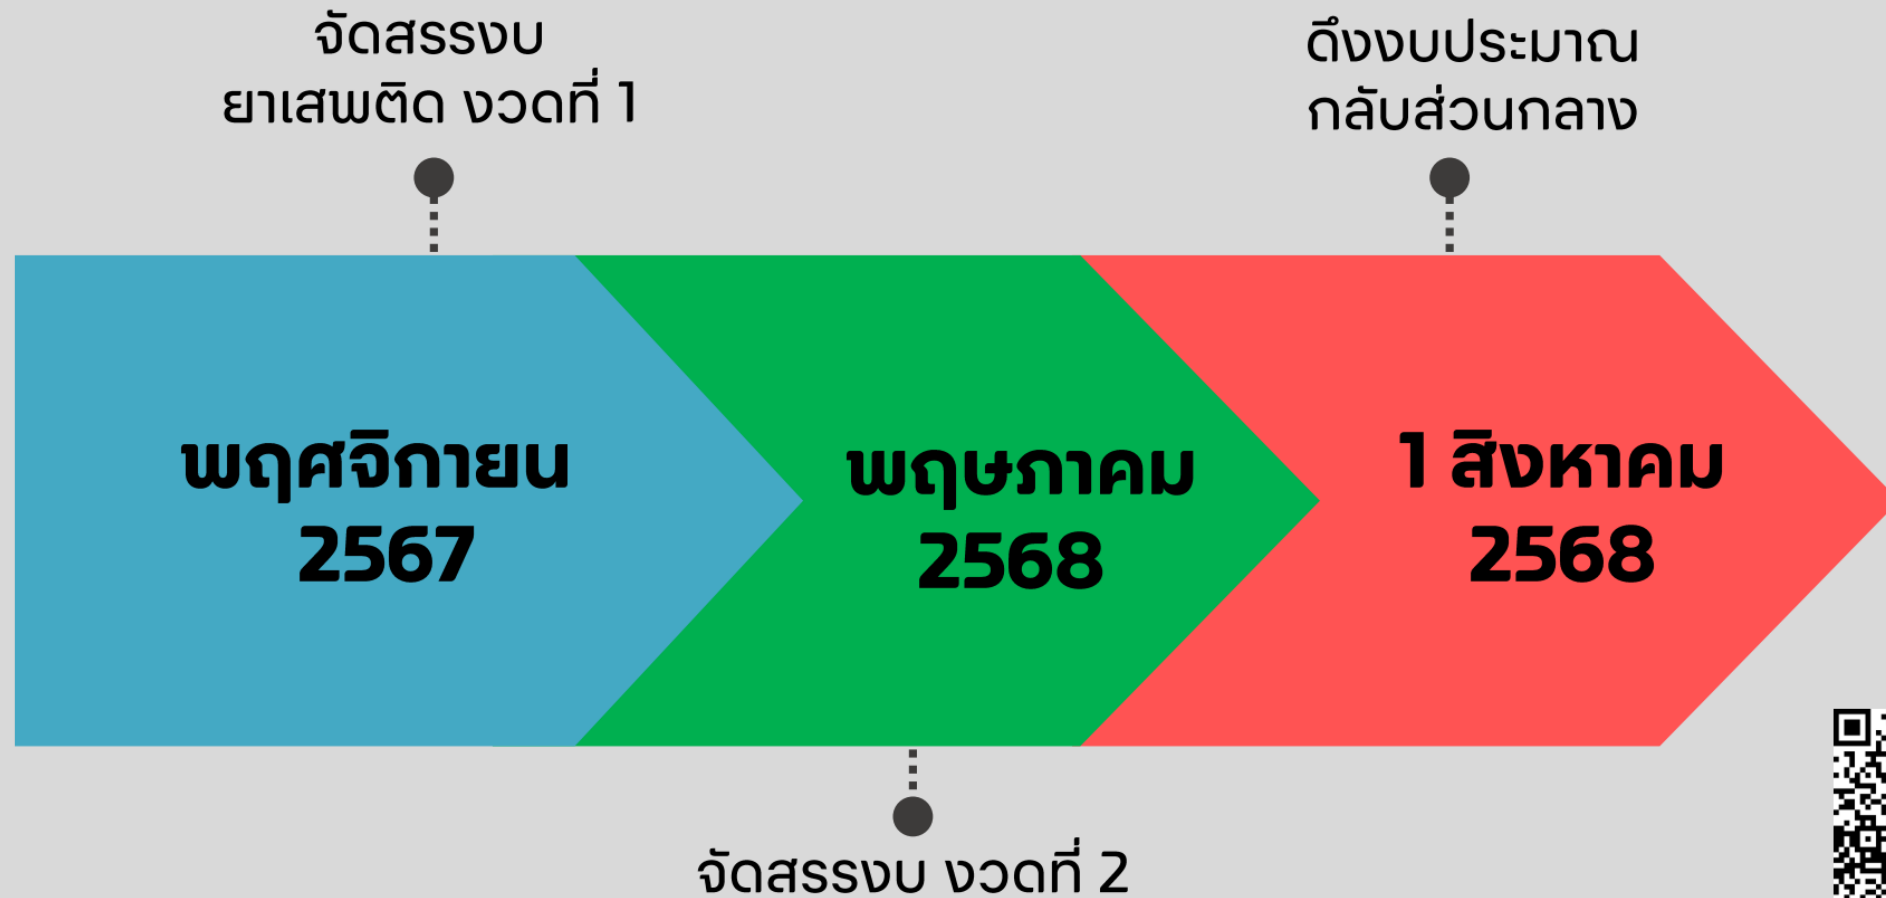

หนังสือจัดสรร
และหนังสือเร่งรัด งวดที่ 1

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ 2568 ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค สังกัด สป. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด

เป้าหมายไตรมาสที่ 2 : ร้อยละ 78 ของงบที่ได้รับงวดที่ 1

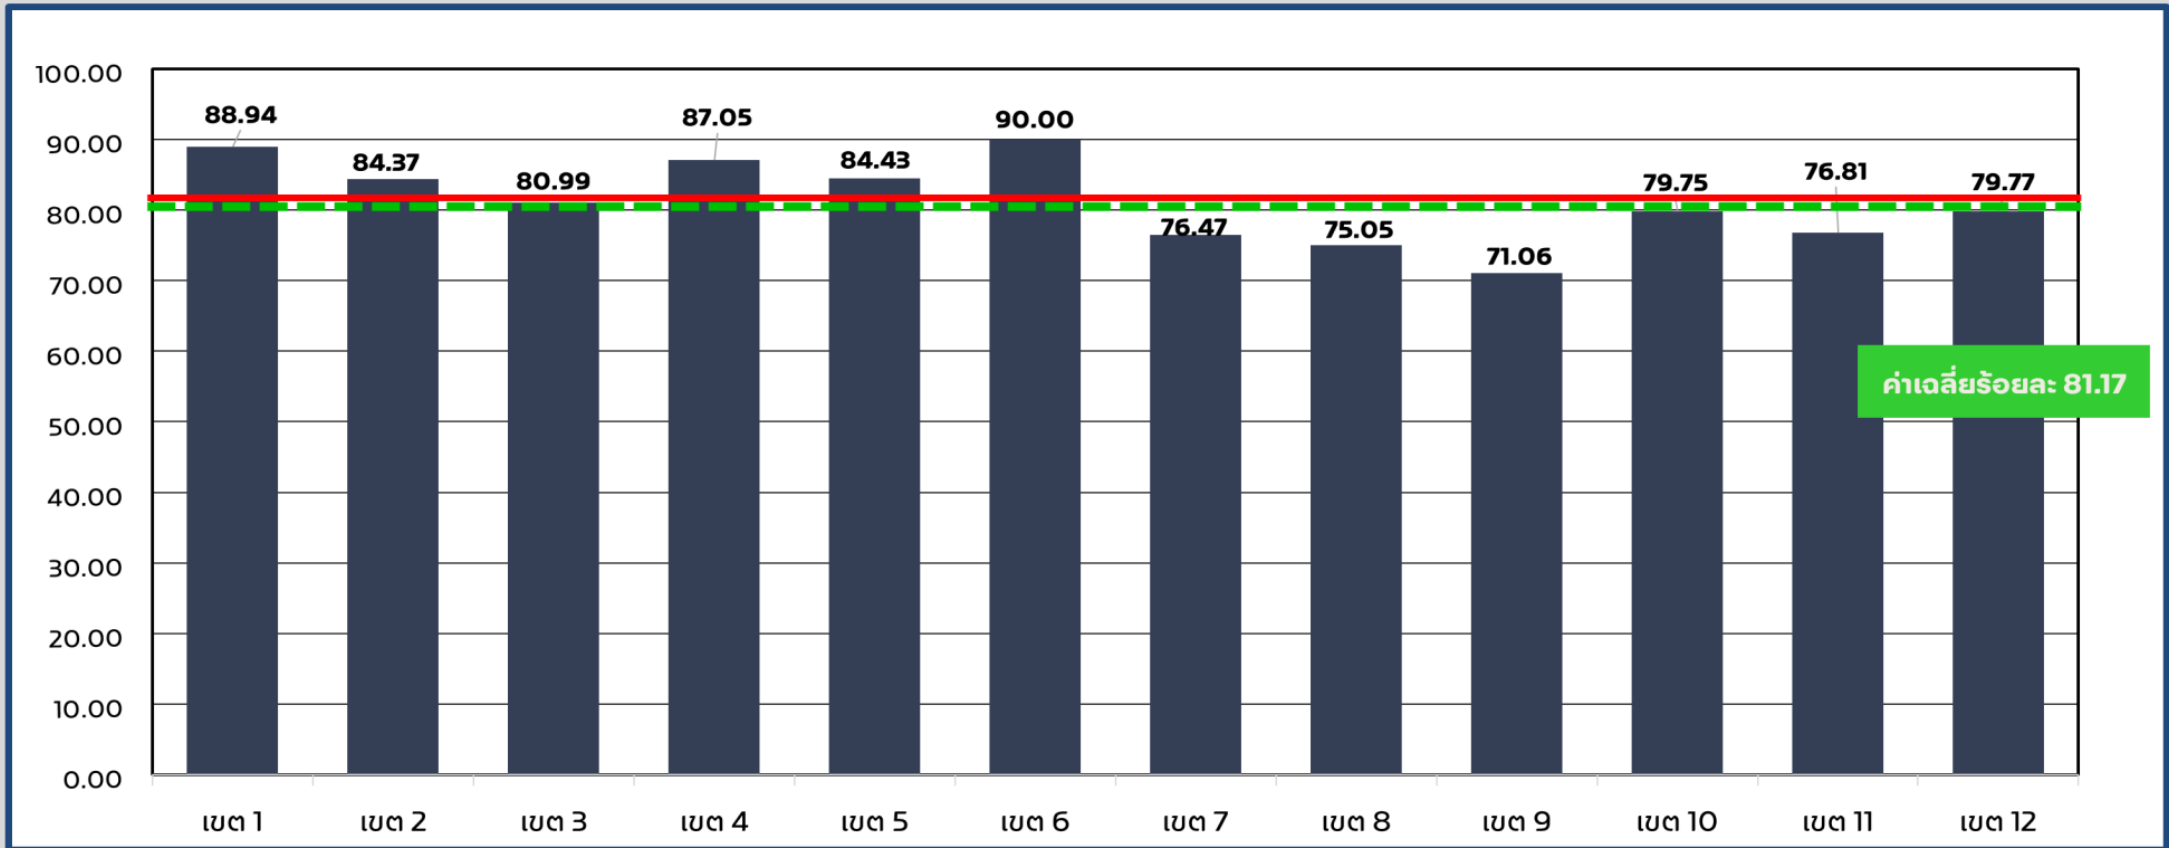




ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผนงานบูรณาการ ป้องกัน ปราบปรามและแก้ไข ปัญหาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของ สคส. สร. เขตสุขภาพที่ 8


เป้าหมายไตรมาสที่ 2
ร้อยละ 78 ของงบที่ได้รับงวด 1

จังหวัด	ได้รับจัดสรร (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	เดือนที่คาดว่าจะ เบิกแล้วเสร็จ
เขต 8	38,626,550.00	28,990,309.42	9,636,240.58	
อุดรธานี	9,306,900.00	8,907,902.00	398,998.00	ก.ค. 68
สกลนคร	7,513,900.00	5,201,737.03	2,312,162.97	ก.ค. 68
นครพนม	8,674,900.00	7,832,277.08	842,622.92	ก.ค. 68
เลย	3,446,900.00	2,273,335.45	1,173,564.55	ก.ค. 68
หนองคาย	3,920,650.00	598,552.00	3,322,098.00	ก.ค. 68
หนองบัวลำภู	3,087,400.00	2,207,053.31	880,346.69	ก.ค. 68
บึงกาฬ	2,675,900.00	1,969,452.55	706,447.45	ก.ค. 68

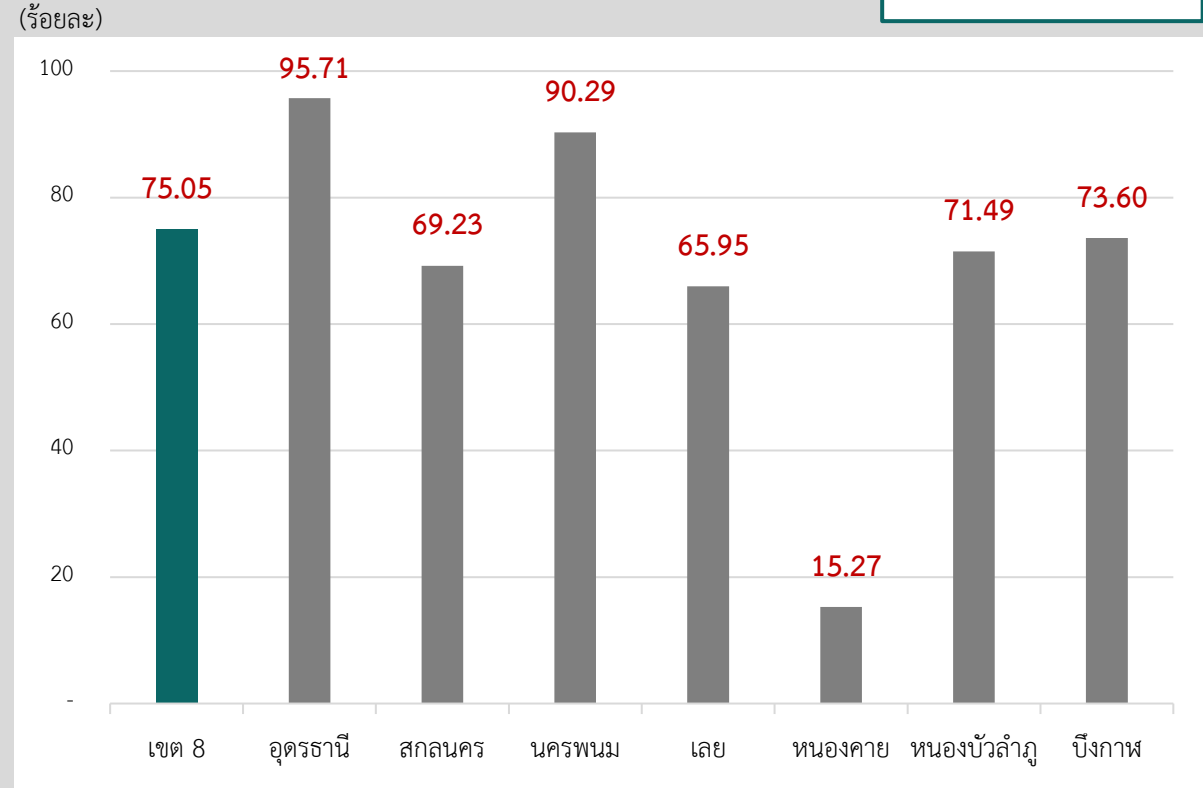

สคส. สร. : สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข

ผลการเบิกจ่ายแทนกันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของ ป.ป.ส. (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 1 พฤษภาคม 2568)

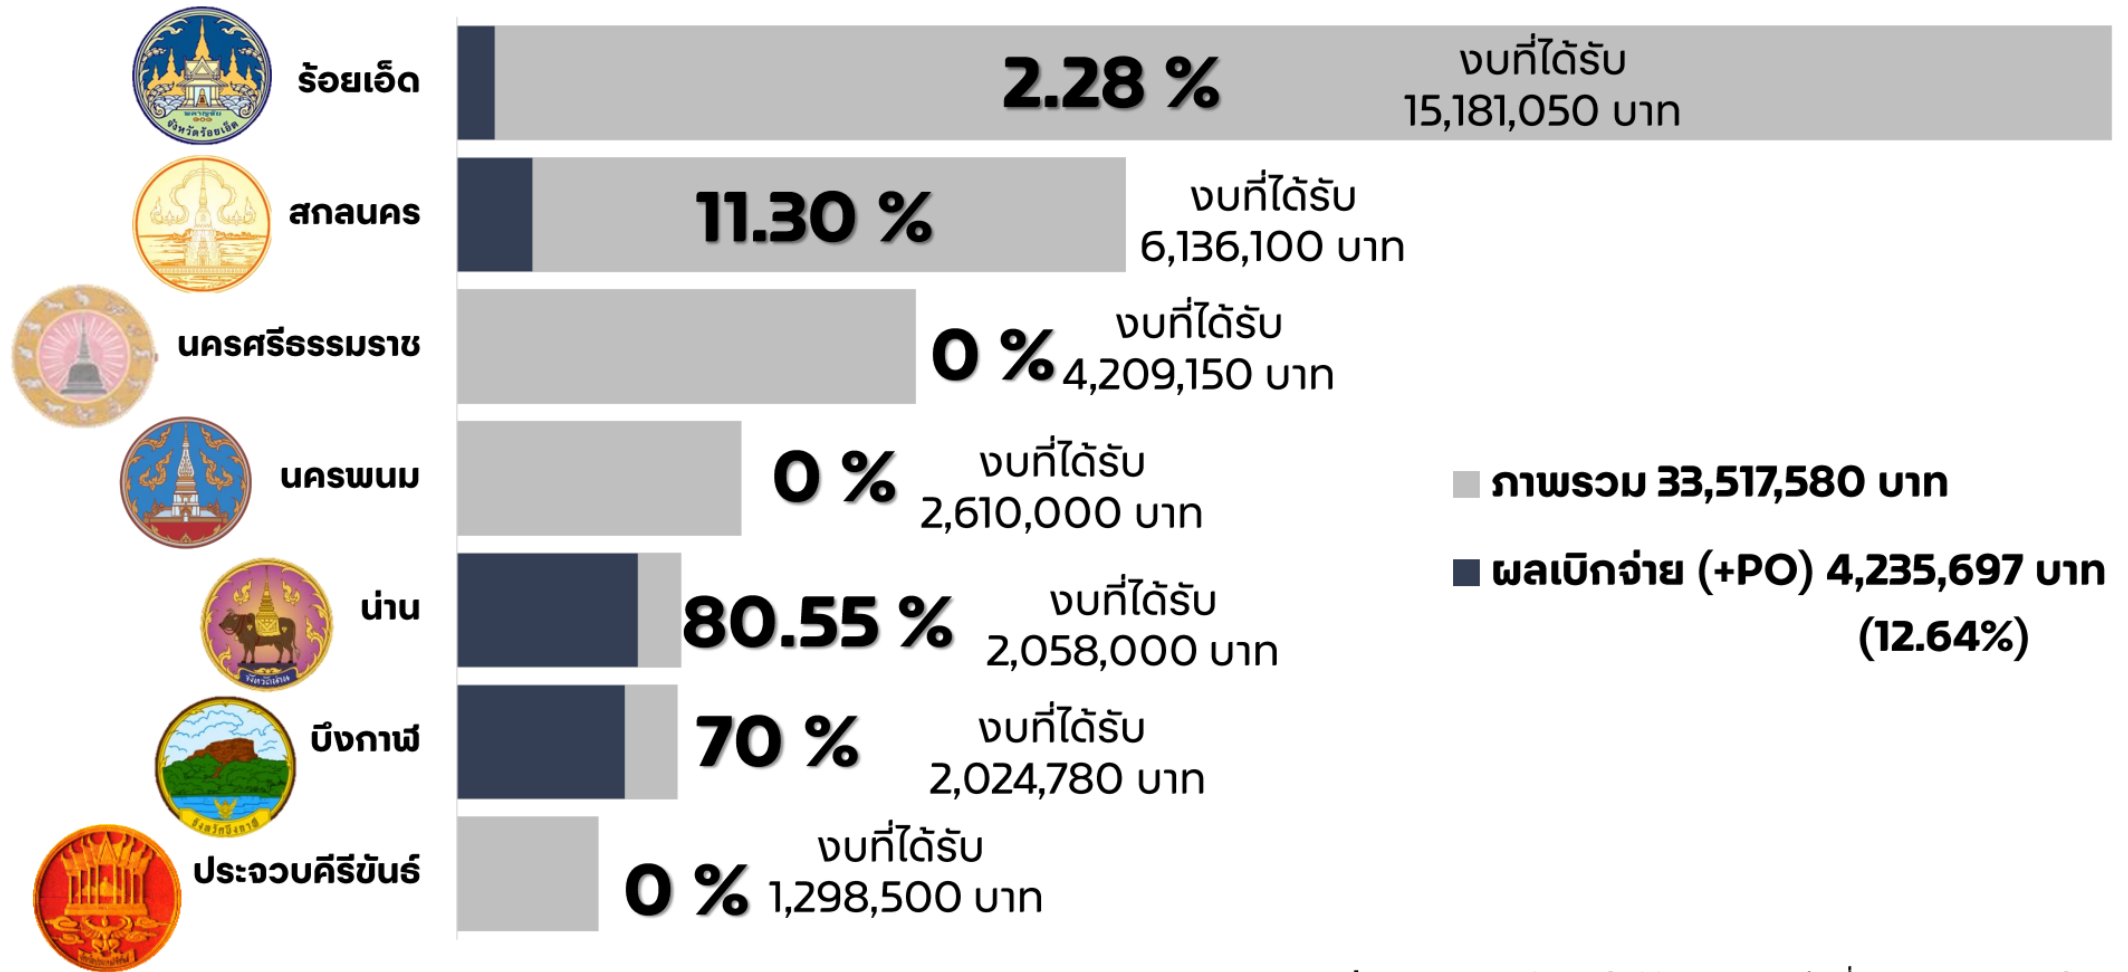

ข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 เวลา 11.50 น.



ผลการเบิกจ่ายแทนกันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของ ป.ป.ส. เขตสุขภาพที่ 8

จังหวัด	ได้รับจัดสรร (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
สกลนคร	6,136,100.00	693,530.00	5,442,570.00
นครพนม	2,610,000.00	-	2,610,000.00
บึงกาฬ	2,024,780.00	1,538,880.00	485,900.00

(ร้อยละ)

