



ที่ สธ ๐๒๓๓.๐๑/ ๓๕๒๕

สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘
๔ ถนนอธิบดี ตำบลหมากแข้ง
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐

๔ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งมติการประชุมการกำกับ ติดตาม และประเมินความก้าวหน้าการบริหารจัดการงบลงทุน เขตสุขภาพที่ ๘
เรียน

อ้างถึง หนังสือ สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘ ที่ สธ ๐๒๓๓.๐๑/ ๓๕๒๕ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย มติการประชุมการกำกับ ติดตาม และประเมินความก้าวหน้าการบริหาร จำนวน ๑ ชุด
จัดการงบลงทุน เขตสุขภาพที่ ๘ ครั้งที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามที่สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘ ได้จัดประชุมการประชุมการกำกับ ติดตาม และประเมิน
ความก้าวหน้าการบริหารจัดการงบลงทุน เขตสุขภาพที่ ๘ เพื่อให้การบริหารงบประมาณ ตลอดจนการกำกับ
ติดตาม ความก้าวหน้าการบริหารงบลงทุนบรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ผ่านระบบออนไลน์ นั้น

ในการนี้ สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘ จึงขอส่งมติการประชุมการกำกับ ติดตาม และประเมิน
ความก้าวหน้าการบริหารจัดการงบลงทุน เขตสุขภาพที่ ๘ ครั้งที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และขอให้ ท่าน
เร่งรัด กำกับ ติดตามผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาของหน่วยงานในสังกัดอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายประพนธ์ เครือเจริญ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

โทร. ๐ ๔๒๒๑ ๙๒๐๗ ต่อ ๒๑๙

E-Mail : r8waycio@gmail.com

ผู้ประสาน : นางสาวสุดารัตน์ วัฒนธรรม



เรื่อง ประชุมการกำกับ ติดตาม และประเมินความก้าวหน้าการบริหารจัดการงบลงทุน เขตสุขภาพที่ 8
ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2568 เวลา 13.30 – 16.30 น. ผ่านระบบวิดีโอผ่านทางไกล

เรื่อง	มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ ประธาน : นายแพทย์นพดล พิษณุวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลย ประธานคณะกรรมการกำกับติดตามงบลงทุน งบค่าเสื่อม เขตสุขภาพที่ 8 แจ้งในที่ประชุม : การกำกับ ติดตาม และประเมินความก้าวหน้าการบริหารจัดการงบลงทุน 1. ขอให้หน่วยงานแต่ละจังหวัดอัปเดตข้อมูลความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา ลงในแบบฟอร์ม Google Sheets ของเขตสุขภาพที่ 8 และโปรแกรม กบรส. ทุกสัปดาห์ 2. ผู้บริหารจังหวัด เพิ่มความถี่ในการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 3. ทิมเลขาของคณะกรรมการยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เขตสุขภาพที่ 8 (คณะ 2) 3.1 รวบรวมผลการดำเนินงาน วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและการบริหารสัญญา รายการของหน่วยงานแต่ละจังหวัด เสนอต่อผู้บริหารทราบ ทุก 2 สัปดาห์ 3.2 ประชุมกำกับ ติดตาม และประเมินความก้าวหน้าการบริหารจัดการงบลงทุน ทุก 1 เดือน	- รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม มติ การประชุมการกำกับ ติดตาม และประเมินความก้าวหน้าการบริหารจัดการงบลงทุน เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568 เวลา 13.30 – 16.30 น. ผ่านระบบวิดีโอผ่านทางไกล	- เห็นชอบ/ รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง รายงานผลการดำเนินการบริหารงบลงทุน เขตสุขภาพที่ 8 3.1 การบริหารจัดการงบลงทุนปี 2567 ที่กันไว้เบิกเหลือในปี 2568 โดย นายแพทย์ยอธลักข์ สัยลังกา นายแพทย์เชียวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย เลขานุการคณะกรรมการกำกับติดตามงบลงทุน งบค่าเสื่อม เขตสุขภาพที่ 8 (รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 1) 3.1.1 รายการงบลงทุนปี 2567 ที่กันไว้เบิกเหลือปี 2568 (<u>ก่อสร้างปีเดียว</u>) ที่ดำเนินการล่าช้า/ ยกเลิก สัญญา มีสถานะเสี่ยงสูง/ เสี่ยงพับ 1. <u>จังหวัดหนองคาย</u> จังหวัดชี้แจงในที่ประชุม : 1) รพ.สต.ด่านศรีสุข : เสี่ยงสูง : บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ ปฏิบัติการ/ อาวุโส/ ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น ขั้นตอน : ส่งมอบงานงวด 1-2 เเบ็กจ่ายแล้ว แจ้งส่งมอบงานงวดที่ 3 กำหนดตรวจรับงาน วันที่ 30 ก.ค. 2568 อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 4-5 2) รพ.สต.บ้านเทพประทับ : เสี่ยงพับ : บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ ปฏิบัติการ/ อาวุโส/ ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น	

เรื่อง	มติที่ประชุม
ขั้นตอน : ส่งมอบงานงวด 1 เบิกจ่ายแล้ว รอส่งมอบงานงวดที่ 2-3 อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 4 ผลการดำเนินงานอยู่ที่ร้อยละ 40.20 มีโอกาสเสี่ยงพ่วงงวดที่ 5 3) รพ.สต.บ้านท่าสำราญ : เสียงสูง : บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ ปฏิบัติการ/ อาวุโส/ ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น ขั้นตอน : ส่งมอบงานงวด 1 เบิกจ่ายแล้ว แจ้งส่งมอบงานงวด 2-3 กำหนดตรวจรับงานวันที่ 29 ก.ค.68 อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 4-5 ผลการดำเนินงานอยู่ที่ร้อยละ 69.50 4) รพ.สต.บ้านผือ : เสียงสูง : บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ ปฏิบัติการ/ อาวุโส/ ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น ขั้นตอน : อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 5 (สุดท้าย) คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ 3-5 วันที่ 29 ก.ค.68 จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดชี้แจงในที่ประชุม : 1) รพ.บุงคล้า : เสียงพับ : บ้านพักข้าราชการระดับอำนวยการต้น/ ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น ขั้นตอน : ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างในงวดที่ 2 ล่าช้า 3 งวด และได้ยกเลิกสัญญา วันที่ 7 กรกฎาคม 2568 อยู่ในขั้นตอนการกำหนดราคากลางสำหรับงานก่อสร้างส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ คาดว่าจะดำเนินการ ประกาศใหม่ ในเดือน ก.ค. 2568 2) รพ.สต.ดอนหญ้านาง : เสียงพับ : บ้านพักข้าราชการระดับอำนวยการต้น/ ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น ขั้นตอน : ส่งมอบงวดงานที่ 1 เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2568 ตามแผนผู้รับจ้างปรับใหม่คาดว่าจะผู้รับจ้าง ส่งมอบ งวดที่ 2 - 4 ภายในวันที่ 15 กันยายน 2568 *ข้อเสนอแนะ : ประธานฯ แจ้งให้ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานที่มีความเสี่ยงสูง/เสียงพับ อย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 1) ให้ดำเนินการหารือภายในจังหวัด เพื่อหาแหล่งเงินทุนในการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้น 2) รายงานผลความก้าวหน้า (ตามข้อ 1) ภายใน 1 สัปดาห์ 3) หากยังสามารถดำเนินการได้ทัน อาจจะต้องมีการปรับกระบวนการ ประสานผู้รับจ้างระดมกำลังคนเพิ่ม เพื่อเข้าทำงานให้เสร็จทันเวลา 4) ขอให้ผู้รับผิดชอบงาน อัปเดตการปรับแผนงาน ง.700 ในโปรแกรม กบรส. และแบบฟอร์ม Google Sheets ของเขตสุขภาพที่ 8 ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ความเสี่ยงในการบริหารสัญญา ต่อไป 3.1.2 รายการงบประมาณปี 2567 ที่กักไว้เบิกเหลือเมื่อปี 2568 (ก่อสร้างผูกพัน) ที่เสียงสูง/ เสียงพับ 1. จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดชี้แจงในที่ประชุม : 1) รพ.สุวรรณคูหา : เสียงพับ : อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น ขั้นตอน : ลงนามสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2567 จำนวน 10 งวด มีการประชุมแก้ไขแบบเมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2568 และเสนอ ผวจ.ต่อไป หลังจากอนุมัติแล้ว นัดตรวจรับ งวดที่ 1 – 3 วันที่ 6 ส.ค. 2568 (โดย กบรส. แจ้งว่าจะดึงเงินไปใช้ก่อนและจะคืนกลับ) คาดว่าจะเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ส.ค. 2568 ณ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินงานก่อสร้าง งวดที่ 5 - 6	- เห็นชอบ/รับทราบ

เรื่อง	มติที่ประชุม
2) รพ.หนองบัวลำภู : เสี่ยงพับ : อาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น ขั้นตอน : งวดที่ 1 ตรวจรับแล้วเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2568 อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ และงวดที่ 2 คาดว่าแล้วเสร็จภายในวันที่ 20 ก.ย. 2568 มีเงินเหลือจ่ายประมาณ 9,xxx บาท ทั้งนี้ อีก 6 งวด เป็นของบประมาณ 2568 *ข้อเสนอแนะ : อัปเดตรายงานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และเพิ่มความถี่ในการติดตามผลการดำเนินงาน 2. จังหวัดอุดรธานี 1) รพ.หนองหาน : เสี่ยงพับ : อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น ขั้นตอน : ณ ปัจจุบัน ผู้รับเหมาได้ดำเนินงานก่อสร้างงวดที่ 1-3 คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดที่ 4 ภายในเดือน กันยายน 2568 โดย กบรส. ได้ทำเรื่องโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว วงเงินประมาณ 10 ล้านบาท *ข้อเสนอแนะ : ในปี 68 จะรวมเป็น 8 งวด ขอให้บริหารสัญญาและดำเนินการให้แล้วเสร็จทันเวลาที่กำหนด 3. จังหวัดเลย จังหวัดชี้แจงในที่ประชุม : 1) รพ.วังสะพุง : เสี่ยงพับ : หอผู้ป่วยใน 7 ชั้น (จำนวน 156 เตียง) เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น ขั้นตอน : ปี 67 จำนวน 7 งวดงาน สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายใน ก.ย. 2568 จำนวน 4 งวดงาน งวดที่ 5 วงเงิน 6 แสนบาท เนื่องจากยังไม่มีหน่วยงานใดแจ้งความประสงค์ขอใช้ จึงใช้วิธีโอนให้หน่วยงานภายในจังหวัด คือ รพ.ภูหลวง/นาด้วง ใช้ในอาคารพักแพทย์ 24 ยูนิต งวดที่ 6 – 7 ถูกพับ ปัญหาที่พบคือมีความล่าช้าในการสั่งเหล็กในงวดที่ 3 – 4 โดยผู้บริหารมีการติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ 4. จังหวัดสกลนคร จังหวัดชี้แจงในที่ประชุม : 1) รพ.พังโคน : เสี่ยงพับ : อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุฉุกเฉิน บำบัดรักษาและสำนักงาน เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น ขั้นตอน : ปี 2567 มีจำนวน 6 งวดงาน – สำนักงบประมาณเห็นชอบความเหมาะสมของราคาของรายการอาคารผู้ป่วยนอกฯ (หนังสือด่วนที่สุดที่ นร 0712/2465 ลว. 31 ม.ค.68) - รมว.สาธารณสุขลงนามอนุมัติขยายเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีถึงปี 2571 (3 มี.ค.68) - ผู้เสนอราคารายที่ 1 ไม่ยื่นราคา - อยู่ระหว่างเสนอ ยกเลิกประกวดราคา คาดว่าลงนามสัญญาได้ภายในเดือน 30 ก.ย. 2568 แต่ถ้าไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ลงนามในเดือน ต.ค. 2568 แต่ต้องใช้งบของปี 2568 ไปก่อน จึงจะตั้งปี 2567 (48 ล้านบาท) กลับมาภายหลัง *ข้อเสนอแนะ : ประธานมอบทีมเลขาฯ ตรวจสอบจำนวนวันที่ดำเนินการไม่ทันเวลา กับจำนวนวันที่ขอยาวเวลา สอดคล้องกันหรือไม่ เพื่อกำหนดแผนการดำเนินการต่อไป 2) รพ.พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต : เสี่ยงพับ : อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น ขั้นตอน : ประกาศผู้ชนะแล้ว คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายใน พฤษภาคม 2568 ในงบปี 2567	- เห็นชอบ/รับทราบ - เห็นชอบ/รับทราบ - เห็นชอบ/รับทราบ

เรื่อง	มติที่ประชุม
มี 4 งวดงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ 1 งวดงาน และดิ่งบคืน 3 งวดงาน ทั้งนี้ กบรส. ได้ทำเรื่องโอนเปลี่ยนแปลงแล้วงวดที่ 2 - 4 3) รพ.พระอาจารย์วัน อุตต : เสียงพับ : ห้องชุดครอบครัว 24 ครอบครัว เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น ขั้นตอน : งบปี 67 เบิกจ่ายครบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินงวดที่ 6 และดำเนินการก่อสร้างงานงวดที่ 7 คาดว่าสามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน ต.ค. 2568 ทั้งนี้ ได้ดำเนินการทำเรื่องกันงบแล้ว 5. จังหวัดนครพนม 1) รพ.ศรีสงคราม : เสียงพับ : อาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง (มาตรฐาน) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น ขั้นตอน : ลงนามสัญญาวันที่ 14 มีนาคม 2568 สิ้นสุดสัญญา 11 มีนาคม 2569 อยู่ระหว่างรอส่งงานงวดที่ 1 ภายในวันที่ 15 ส.ค. 2568 งวดที่ 2 ยังเหลืองบประมาณ 4.7 ลบ. คาดว่าจะถูกพับ (ไม่มีการแจ้งจาก กบรส. ในการโอนเปลี่ยนแปลง) *ข้อเสนอแนะ : 1) ทำเรื่องประสาน กบรส. เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไข 2) ทำเรื่องขอยายเวลาในงบปี 2568 ประชุมหารือผู้รับเหมาในการดำเนินงานให้แล้วเสร็จทันเวลาที่กำหนด 3) ผู้บริหารมีการติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ 2) รพ.นาหว้า : เสียงพับ : อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น ขั้นตอน : ประกาศครั้งที่ 2 รายงานผลการกำหนดราคากลางแล้ว อยู่ระหว่างเสนอพิจารณาลงนามเห็นชอบพร้อมประกาศขึ้นร่างฯ เนื่องจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวทำให้ตึก สตง. ถล่ม ทาง คกก.จังหวัด จึงให้ ทบทวนในเรื่องของราคาก่อสร้าง และครุภัณฑ์ส่วนควบตึก และจัดทำแบบสอบถามไปยังกองแบบแผนยืนยันราคาให้ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือน ก.ย. 2568 ทั้งนี้ กบรส. แจ้งจะจัดทำแผนตั้งงบใหม่ให้ถึงปี 70 *ข้อเสนอแนะ : มอบทีมเลขา ติดตามขั้นตอนและแจ้งรายละเอียดการขอยายเวลาและการตั้งงบใหม่ 6. จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดชี้แจงในที่ประชุม : 1) รพ.บึงกาฬ : เสียงพับ : อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น ขั้นตอน : ปี 67 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ณ ปัจจุบันตรวจรับงวดที่ 6 เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2568 ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 35.27 ค่าซ้ำ 6 งวดงาน 2) รพ.บึงกาฬ : เสียงพับ : อาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น ขั้นตอน : ปี 67 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ณ ปัจจุบันตรวจรับงวด 6 วันที่ 25 ก.ค. 2568 ค่าซ้ำ 1 งวดงาน *ข้อเสนอแนะ : ให้จัดทำ Time line การปรับแผน/ วันที่สิ้นสุดสัญญา บันทึกข้อมูล งบ.700 ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อทราบถึงระยะเวลาที่แล้วเสร็จ 3.2 การบริหารจัดการงบลงทุนปี 2568 โดย นายแพทย์อดุลย์ ลัยลังกา นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย เลขานุการคณะกรรมการกำกับติดตามงบลงทุน งบค่าเสื่อม เขตสุขภาพที่ 8 (รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 1) 3.2.1 การบริหารงบลงทุน (ครุภัณฑ์) ปี 2568	- เห็นชอบ/รับทราบ - เห็นชอบ/ รับทราบ - เห็นชอบ/ รับทราบ

เรื่อง	มติที่ประชุม
<u>ภาพรวมรายการงบลงทุนปี 2568 (ครุภัณฑ์) จำนวน 1,276 รายการ</u> 1) เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 1,251 หน่วย (98.04%) เพิ่มขึ้น 40 รายการ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน 2) รองมอบ/ อยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุ 8 รายการ 8 หน่วย ได้แก่ 1) อุดรธานี = 1 รายการ 1 หน่วย 2) สกลนคร = 7 รายการ 7 หน่วย จังหวัดชี้แจงในที่ประชุม : ณ ปัจจุบัน อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน สามารถดำเนินการได้ทันเวลา 3.2.2 การบริหารงบลงทุน (ก่อสร้าง) ปี 2568 (รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 1) <u>การบริหารงบลงทุน (สิ่งก่อสร้าง) ปี 2568 เฉพาะรายการที่ยังไม่เริ่มดำเนินการก่อสร้าง</u> ได้แก่ 1) รองลงนาม 5 รายการ (รพ.อุดรธานี จ.อุดรธานี , รพ.พังโคน จ.สกลนคร, รพ.โพนพิสัย และ รพ.รัตนวาปี จ.หนองคาย, รพ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู) 2) ลงนามสัญญาแล้ว 2 รายการ (รพ.นาวังฯ รพ.หนองบัวลำภู (2 รายการ) *ข้อเสนอแนะ : การบริหารงบลงทุน สิ่งก่อสร้าง ปี 2568 เฉพาะรายการที่ยังไม่เริ่มดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้ 1) รายการที่ล่าช้า ให้อัพเดทในโปรแกรมของ กบรส. รายงานปัญหาที่เกิดขึ้น และเตรียมดำเนินการ กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีให้พร้อม เพื่อมิให้งบบกพับ 2) บริหารสัญญาให้เป็นไปตามงวดงาน 3) ผู้บริหารจังหวัด เร่งรัด กำกับ ติดตาม การดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ 4) รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานให้เป็นปัจจุบัน 3.3 ผลการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้าง (ร่าง) พรบ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รายการงบลงทุน (รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 1) โดย นายแพทย์ยอดลักษ์ สัยลังกา นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย เลขานุการคณะกรรมการกำกับติดตามงบลงทุน งบค่าเสื่อม เขตสุขภาพที่ 8 รายการครุภัณฑ์ เขตสุขภาพที่ 8 ทั้งหมดจำนวน 241 รายการ - ร่าง จัดทำแผนแล้ว จำนวน 238 รายการ - ร่าง แต่งตั้งบุคคล/คกก. จำนวน 164 รายการ - ร่าง กำหนด TOR/BOQ จำนวน 74 รายการ รายการก่อสร้าง เขตสุขภาพที่ 8 ทั้งหมดจำนวน 14 รายการ - ร่าง จัดทำแผนแล้ว จำนวน 7 รายการ - ร่าง แต่งตั้งบุคคล/คกก. จำนวน 6 รายการ - ร่าง กำหนด TOR/BOQ จำนวน 0 รายการ ภาพรวม แจ้งจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ส.ค. - ก.ย. 2568 *ข้อเสนอแนะ : 1) ขอให้ทุกจังหวัดดำเนินการจัดทำร่าง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR BOQ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป นายวิระวัฒน์ ศิริรัตน์ไพบุลย์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกำกับติดตามงบลงทุน งบค่าเสื่อม เขตสุขภาพที่ 8	- เห็นชอบ/รับทราบ - เห็นชอบ/รับทราบ - เห็นชอบ/รับทราบ

เรื่อง	มติที่ประชุม
แจ้งในที่ประชุม : ได้รับประสานจาก กบรส. ทุกเขตทั่วประเทศถูกตัดรายการครุภัณฑ์ คือ ชุดตรวจสุขภาพระบบแพทย์ทางไกลแบบสถานีให้บริการพร้อมระบบการบริหารจัดการข้อมูลส่วนกลางและแอปพลิเคชันข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล วงเงิน 450,000 บาท ทั้งนี้ ได้แจ้งไปยังผู้รับผิดชอบงานทุกจังหวัดแล้ว แพทย์หญิงบุญศิริ จันศิริมงคล สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 8 ที่ปรึกษาคณะกรรมการกำกับติดตามงบลงทุน งบค่าเสื่อม เขตสุขภาพที่ 8 แจ้งในที่ประชุม : มอบทีมเลขา 1) สรุปจำนวน/ วงเงิน/ หน่วยงาน งบเสี่ยงพื้นที่ กบรส. ได้ดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว 2) ประสาน กบรส. สามารถเพิ่มรายการที่เสี่ยงใหม่ ที่ยังไม่ได้แจ้งได้หรือไม่	- เห็นชอบ/รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 อื่นๆ	
นัดหมายครั้งถัดไป การประชุมการกำกับ ติดตาม และประเมินความก้าวหน้าการบริหารจัดการงบลงทุน เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2568 เวลา 13.30 – 16.30 น. ผ่านระบบวิดีโอผ่านทางไกล	- เห็นชอบ/รับทราบ

นางสาวสุภารัตน์ วัฒนธรรม

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้ช่วยเลขานุการ

นายวีระวัฒน์ ศิริรัตน์ไพบูลย์

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

ผู้ช่วยเลขานุการ

นายแพทย์ยอดลักษณ์ สัยลังกา

ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย

กรรมการและเลขานุการ

รายงานความก้าวหน้า

การบริหารจัดการ งบประมาณ

เขตสุขภาพที่ 8

29 กรกฎาคม 2568




CPO R8way
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8




ภาพรวมการบริหารจัดการงบลงทุนเขตสุขภาพที่ 8

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

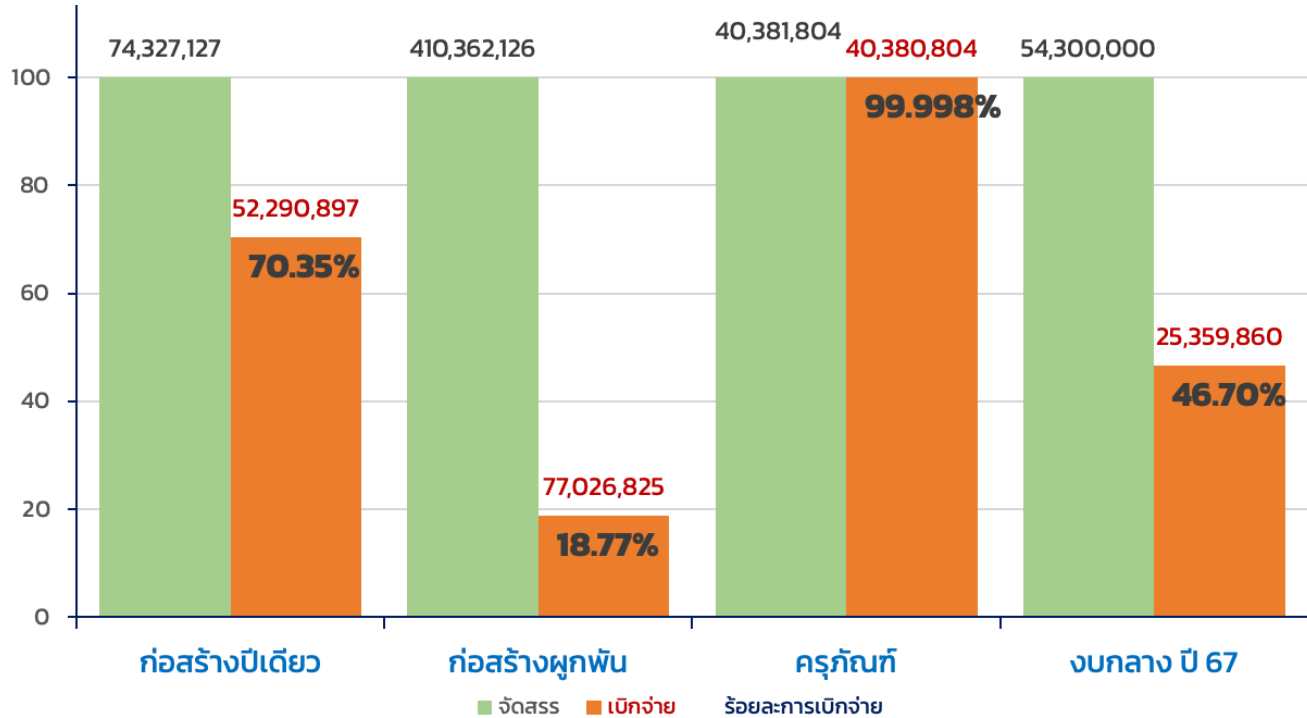

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568

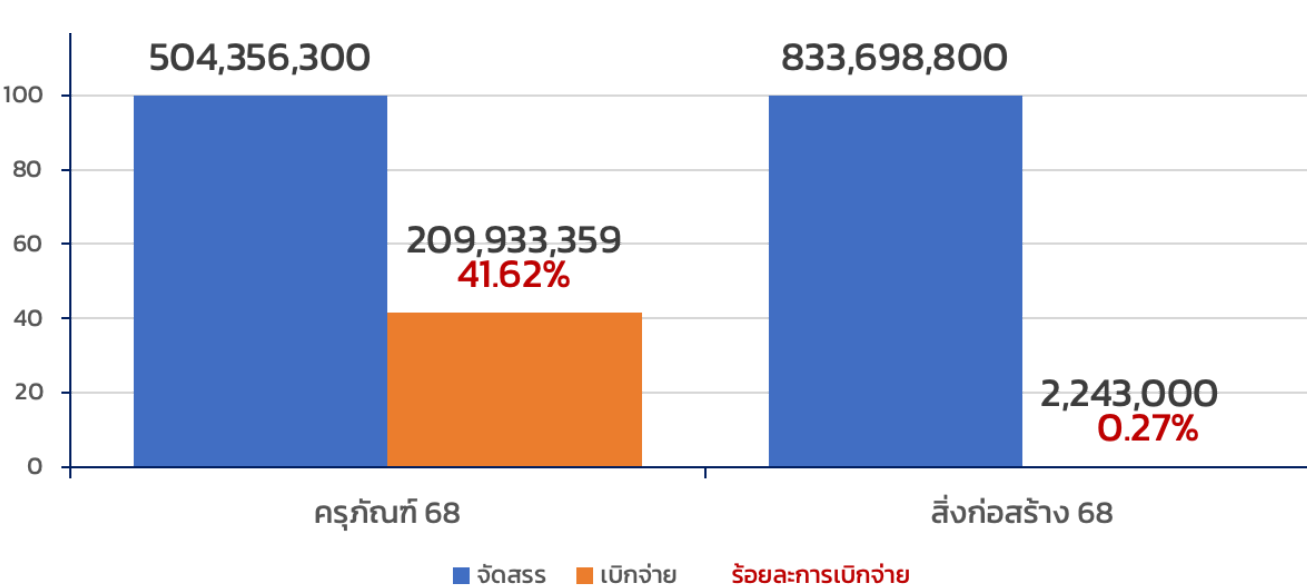

รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณ งบลงทุน เขตสุขภาพที่ 8 แยกรายจังหวัด

ลำดับ	จังหวัด	ก่อสร้างปีเดียว				ก่อสร้างผูกพัน				ครุภัณฑ์				ผลรวม			
		กันเงินสุทธิ	เบิกจ่าย	%การเบิกจ่าย	งบคงเหลือ	กันเงินสุทธิ	เบิกจ่าย	%การเบิกจ่าย	งบคงเหลือ	กันเงินสุทธิ	เบิกจ่าย	%การเบิกจ่าย	งบคงเหลือ	กันเงินสุทธิ	เบิกจ่าย	%การเบิกจ่าย	งบคงเหลือ
1	อุดรธานี	3,313,575.00	3,313,575.00	100.00%	-	36,647,100.00	8,441,200.00	23.03%	28,205,900.00				0	39,960,675.00	11,754,775.00	29.42%	28,205,900.00
2	สกลนคร	4,362,500.00	4,362,500.00	100.00%	-	100,232,000.00	19,215,700.00	19.17%	81,016,300.00	2,936,004.00	2,936,004.00	100.00%	-	107,530,504.00	26,514,204.00	24.66%	81,016,300.00
3	นครพนม				0	58,444,900.00	0	0.00%	58,444,900.00	1,899,000.00	1,898,000.00	99.95%	1,000.00	60,343,900.00	1,898,000.00	3.15%	58,445,900.00
4	เลย	37,724,043.09	27,763,131.75	73.60%	9,960,911.34	50,375,700.00	17,773,469.94	35.28%	32,602,230.06	23,493,000.00	23,493,000.00	100.00%	-	111,592,743.09	69,029,601.69	61.86%	42,563,141.40
5	หนองคาย	13,371,290.87	9,465,835.93	70.79%	3,905,454.94	116,685,618.00	13,108,500.00	11.23%	103,577,118.00	12,053,800.00	12,053,800.00	100.00%	-	142,110,708.87	34,628,135.93	24.37%	107,482,572.94
6	หนองบัวลำภู				0	8,308,600.00	0	0.00%	8,308,600.00				0	8,308,600.00	0	0.00%	8,308,600.00
7	บึงกาฬ	15,555,718.00	7,385,854.60	47.48%	8,169,863.40	39,668,207.95	18,487,955.31	46.61%	21,180,252.64				0	55,223,925.95	25,873,809.91	46.85%	29,350,116.04
ผลรวม		74,327,126.96	52,290,897.28	70.35%	22,036,229.68	410,362,125.96	77,026,825.25	18.77%	333,335,300.71	40,381,804.00	40,380,804.00	100.00%	1,000.00	525,071,056.92	169,698,526.54	32.32%	355,372,530.38

ลำดับ	จังหวัด	งบลงทุนปี 67 (งบกลาง)				งบลงทุนปี 68 (ครุภัณฑ์)				งบลงทุนปี 68 (สิ่งก่อสร้าง)				ผลรวม			
		กันเงินรวม(บาท)	เบิกจ่าย	%การเบิกจ่าย	งบคงเหลือ	กันเงินรวม(บาท)	เบิกจ่าย	%การเบิกจ่าย	งบคงเหลือ	กันเงินสุทธิ	เบิกจ่าย	%การเบิกจ่าย	งบคงเหลือ	กันเงินสุทธิ	เบิกจ่าย	%การเบิกจ่าย	งบคงเหลือ
1	อุดรธานี	13,000,000.00	695,700.00	5.35%	12,304,300.00	45,792,400.00	23,778,793.50	51.93%	22,013,606.50	559,523,300.00	916,000.00	0.16%	558,607,300.00	618,315,700.00	25,390,493.50	4.11%	592,925,206.50
2	สกลนคร	11,800,000.00	3,500,000.00	29.66%	7,700,000.00	194,340,000.00	9,032,700.00	4.65%	35,507,300.00	113,665,200.00	0	0.00%	113,665,200.00	319,805,200.00	12,532,700.00	3.92%	307,272,500.00
3	นครพนม	550,000.00	0	0.00%	5,500.00	33,100,000.00	33,075,600.00	99.93%	24,400.00					33,650,000.00	33,075,600.00	98.29%	574,400.00
4	เลย	16,850,000.00	16,833,205.00	99.90%	16,795.00	51,393,000.00	51,286,000.00	99.79%	107,000.00	12,377,100.00	300,000.00	2.42%	12,077,100.00	80,620,100.00	68,419,205.00	84.87%	12,200,895.00
5	หนองคาย	7,600,000.00	3,087,000.00	40.62%	4,513,000.00	137,720,500.00	61,700,200.00	44.80%	76,020,300.00	92,429,900.00	0	0.00%	92,009,200.00	237,750,400.00	64,787,200.00	27.25%	172,963,200.00
6	หนองบัวลำภู	3,350,000.00	0	0.00%	453,000.00	24,385,400.00	13,791,075.00	56.55%	196,975.00	34,894,300.00	1,027,000.00	2.94%	33,047,900.00	62,629,700.00	14,818,075.00	23.66%	47,811,625.00
7	บึงกาฬ	1,150,000.00	1,243,955.00	108.17%	-	17,625,000.00	17,268,990.00	97.98%	356,010.00	20,809,000.00	0	0	20,809,000.00	39,584,000.00	18,512,945.00	46.77%	21,071,055.00
ผลรวม		54,300,000.00	25,359,860.00	46.70%	24,992,595.00	504,356,300.00	209,933,358.50	41.62%	134,225,591.50	833,698,800.00	2,243,000.00	0.27%	830,215,700.00	1,392,355,100.00	237,536,218.50	17.06%	1,154,818,881.50

1.การบริหารจัดการงบลงทุนปี 2567 ที่กันเงินเหลื่อมปีไว้ใช้จ่ายในปี 2568

รายการงบลงทุนปี 2567 เหลื่อมปี 2568(ก่อสร้างปีเดียว) แยกรายจังหวัด

ลำดับ	จังหวัด	จำนวน ทั้งหมด (รายการ)	ทำถึงขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง							จำนวนงวดงานที่ล่าช้า					
			ประกาศผู้ชนะ เสนอราคา	รอลงนาม สัญญา	ลงนามสัญญา	เริ่มงานก่อสร้าง ตามแผน	กรรมการตรวจ รับงานจ้าง	เบิกจ่ายเงินตาม งวดงาน	เบิกจ่ายงวด สุดท้ายแล้วเสร็จ	ไม่มีล่าช้า	ช้า 1 งวด	ช้า 2 งวด	มากกว่า 2 งวด		ไม่มีข้อมูล
													จำนวน	ร้อยละ	
1	อุดรธานี	3	0	0	0	0	0	1	2	1	2	0	0	0.00%	0
2	สกลนคร	4	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0.00%	0
3	นครพนม														
4	เลย	8	0	0	0	0	0	3	5	5	1	2	0	0.00%	0
5	หนองคาย	7	0	0	0	4	0	0	3	6	1	0	0	0.00%	0
6	หนองบัวลำภู														
7	บึงกาฬ	10	0	0	0	2	0	8	0	1	8	0	1	10.00%	0
ผลรวม		32	0	0	0	6	0	12	14	17	12	2	1	3.13%	0

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2568 เวลา 16.00 น.

รายการงบลงทุนปี 2567 เหลื่อมปี 2568 (ก่อสร้างปีเดียว) ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

- หนองคาย 4 รายการ
 - sw.สต.ด้านศรีสุข
 - sw.สต.บ้านเทพประทับ
 - sw.สต.บ้านท่าสำราญ
 - sw.สต.บ้านผือ
- บึงกาฬ 2 รายการ
 - sw.สต.บ้านสมสนุก
 - sw.สต.ดอนหญ้านาง

1.การบริหารจัดการงบลงทุนปี 2567 ที่กันเงินเหลื่อมปีไว้ใช้จ่ายในปี 2568

1.1 รายการงบลงทุนปี 2567 เหลื่อมปี 2568(ก่อสร้างปีเดียว) ที่ ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ แยกรายจังหวัด

ลำดับ	ชื่อรายการตาม พรบ.	ชื่อสถานที่	จังหวัด	ทำถึงขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง	วันที่ลงนามจริง	วันครบกำหนดส่งมอบตามสัญญา	วันที่เบิกจ่ายเงินจริง	จำนวนงวดงานปี 2568 (ระบุงวดงาน)	ปัจจุบันดำเนินการถึงงวดงานที่	จำนวนงวดงานที่ล่าช้า	สาเหตุความล่าช้า
25	บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ ปฏิบัติการ/ อาวุโส/ ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่านศรีสุข ตำบลด่านศรีสุข อำเภอไพร่ตง จังหวัดหนองคาย 1 หลัง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่านศรีสุข	หนองคาย	18.ผู้ควบคุมงานรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน	7/3/2025	3/9/2025	3/9/2025	5	4	0ไม่มีล่าช้า	ส่งมอบงานงวด 1-2 เบิกจ่ายแล้ว แจ้งส่งมอบงานงวด 3 กำหนดตรวจรับงานวันที่ 30 ก.ค.68 อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 4
26	บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ ปฏิบัติการ/ อาวุโส/ ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเทพประทับ ตำบลนาข้าว อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 1 หลัง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเทพประทับ	หนองคาย	18.ผู้ควบคุมงานรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน	14/3/2025	10/9/2025	เบิกจ่ายงวดที่ 1 วันที่ 8 ก.ค.68	5	3	1	ส่งมอบงานงวด 1 เบิกจ่ายแล้ว อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 2-3
27	บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ ปฏิบัติการ/ อาวุโส/ ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าสำราญ ตำบลน้ำโมง อำเภอกำป๋อ จังหวัดหนองคาย 1 หลัง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าสำราญ	หนองคาย	18.ผู้ควบคุมงานรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน	7/3/2025	3/9/2025	10/6/2025	5	4	0ไม่มีล่าช้า	ส่งมอบงานงวด 1 เบิกจ่ายแล้ว แจ้งส่งมอบงานงวด 2-3 กำหนดตรวจรับงานวันที่ 29 ก.ค.68 อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 4
29	บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ ปฏิบัติการ/ อาวุโส/ ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผือ ตำบลบ้านผือ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 1 หลัง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผือ	หนองคาย	18.ผู้ควบคุมงานรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน	20/9/2024	19/3/2025	10/6/2025	5	5	0ไม่มีล่าช้า	อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 5 (สุดท้าย) คาดว่าจะส่งมอบงานงวด 3-5 วันที่ 29 ก.ค.68
47	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสมสนุก ตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 1 หลัง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสมสนุก	บึงกาฬ	17.ผู้รับจ้างก่อนเริ่มงานก่อสร้างตามแผนแผนบริหารสัญญาและแผนควบคุมงาน	30/8/2024	26/2/2025	งวดที่ 1 เบิกจ่าย 16/12/67 งวดที่ 2 เบิกจ่าย 28/3/2568 งวดที่ 3 เบิกจ่าย 17/06/2568	5	4	1	เบิกจ่ายงวดงานที่ 1 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2567 เบิกจ่ายงวดงานที่ 2 เมื่อวันที่ 28/03/2568 เบิกจ่ายงวดงานที่ 3 เมื่อวันที่ 17/06/2568 และงวดที่ 4-5 ตามแผนผู้รับจ้างปรับใหม่คาดว่าจะผู้รับจ้างส่งมอบงวดที่ 4-5 ในเดือนกรกฎาคม 2568 (เงินกันเหลื่อมปีงบประมาณปี 2567 เบิกหมดในเดือน กรกฎาคม 2568)
48	บ้านพักข้าราชการระดับอำนวยการต้น/ ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนหญ้านาง ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 1 หลัง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนหญ้านาง	บึงกาฬ	17.ผู้รับจ้างก่อนเริ่มงานก่อสร้างตามแผนแผนบริหารสัญญาและแผนควบคุมงาน	21/3/2025	19/7/2025	๒	4	2	2	ส่งมอบงวดงานที่ 1 เมื่อวันที่ 19 กค 2568 ตามแผนผู้รับจ้างปรับใหม่คาดว่าจะผู้รับจ้างส่งมอบ งวดที่ 2-4 ในเดือนสิงหาคม 2568 (เงินกันเหลื่อมปี งบประมาณปี 2567 เบิกหมดในเดือน สิงหาคม 2568)

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2568 เวลา 16.00 น.

1.การบริหารจัดการงบลงทุนปี 2567 ที่กันเงินเหลื่อมปีไว้ใช้จ่ายในปี 2568

ภาพรายการงบลงทุนปี 2567 เหลื่อมปี 2568(ก่อสร้างผูกพัน) แยกรายจังหวัด

ลำดับ	จังหวัด	จำนวนทั้งหมด (รายการ)	ทำถึงขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง						จำนวนงวดงานที่ล่าช้า					
			จัดทำ แผน/TOR/BOQ/ ร่างประกาศ	รอลงนาม สัญญา	ลงนามสัญญา	เริ่มงาน ก่อสร้างตาม แผน	ผู้ควบคุมงาน รายงานสรุป	เบิกจ่ายเงินตาม งวดงาน	ไม่มีล่าช้า	ช้า 1-2 งวด	ช้า 3-4งวด	5 งวดขึ้นไป		ไม่มีข้อมูล
												จำนวน	ร้อยละ	
1	อุดรธานี	5	0	0	0	2	0	3	0	4	1	0	0.00%	0
2	สกลนคร	4	0	1	0	2	0	1	1	0	0	2	50.00%	0
3	นครพนม	2	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0.00%	0
4	เลย	3	0	0	0	3	0	0	1	2	0	0	0.00%	0
5	หนองคาย	3	0	0	0	1	0	2	2	0	1	0	0.00%	0
6	หนองบัวลำภู	2	0	0	2	0	0	0	0	1	0	1	50.00%	0
7	บึงกาฬ	2	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	50.00%	0
	ผลรวม	21	1	1	2	11	0	6	4	9	2	4	19.05%	0

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2568 เวลา 16.00 น.

รายการงบลงทุนปี 2567 เหลื่อมปี 2568 (ก่อสร้างผูกพัน) ที่ยังไม่ลงนามสัญญา/ก่อสร้างล่าช้าเกิน 5 งวดงาน

- เสียงพัน 11 รายการ(อุดรธานี 1, สกลนคร 3, นครพนม 2, เลย 1, หนองบัวลำภู 2, บึงกาฬ 2)
- ➡ ○ ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง 1 รายการ(อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น sw.นาหว้า นครพนม)
- ➡ ○ ยกเลิกผลการประกวดราคา 1 รายการ(อาคารอาคาร OPD/ER sw.พังโคน สกลนคร)
- ➡ ○ ก่อสร้างล่าช้า 5 งวดขึ้นไป 4 รายการ(บึงกาฬ1, สกลนคร2, หนองบัวลำภู1)

1.การบริหารจัดการงบลงทุนปี 2567 ที่กันเงินเหลื่อมปีไว้ใช้จ่ายในปี 2568

1.2 รายการงบลงทุนปี 2567 เหลื่อมปี 2568(ก่อสร้างผูกพัน) ที่ดำเนินงานล่าช้า/เสี่ยงพับ แยกรายจังหวัด

ลำดับ	ชื่อรายการตาม พ.ร.บ.	ชื่อสถานที่	จังหวัด	ทำถึงขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง	วันที่คาดว่าจะลงนามสัญญา	วันที่ลงนามจริง	วันครบกำหนดส่งมอบตามสัญญา	งวดงานที่ถึงสิ้น	จำนวนงวดงานปี 2568 (ระบุงวดงาน)	ปัจจุบันดำเนินการถึงงวดงานที่	จำนวนงวดงานที่ล่าช้า	สาเหตุความล่าช้า
1	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,724 ตารางเมตร โรงพยาบาลสุวรรณคูหา ตำบลสุวรรณคูหา อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 1 หลัง	โรงพยาบาลสุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	15.ส่งสำเนาสัญญา/ข้อตกลง ให้ สตง. และกรมสรรพากร	๒	29/10/2024	๒	10	4	2	2	ลงนามสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2567 จำนวน 10 งวด ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้าง งวดที่ 2 ตกเสาเข็ม จำนวน 61 ต้นแล้ว เริ่มเทเสาตอม่อ วางฝังเทคอนกรีต ถังเก็บน้ำใต้ดิน อยู่ระหว่างปรับพื้นที่เพื่อทดสอบเสาเข็ม เมื่อผ่านแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการแก้ไขสัญญา และเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินการรายงานผลทดสอบเสาเข็มเพื่อประชุมคณะกรรมการขอแก้ไขแบบรูปรายการ และจะประชุมการแก้ไขแบบรูปรายการก่อสร้างระหว่าง 22-23 พค.2568 คาดว่าจะผู้รับจ้างจะส่งงานงวดที่ 1 และ 2 พร้อมกันภายในเดือน พฤษภาคม 2568 แต่ยังล่าช้าอยู่ 90 วัน คาดว่าผูกพันงวด 3
2	อาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 936 ตารางเมตร โรงพยาบาลหนองบัวลำภู ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 1 หลัง	โรงพยาบาลหนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	14.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดภายหลังพ้นจากระยะเวลาอุทธรณ์	10/4/2025	11/4/2025	๒	8	8	0	8	ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง เรียบร้อยแล้ว เลขที่ 21/2568 ลงวันที่ 11 เมษายน 2568 ดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 360 วัน จำนวน 8 งวดเงิน-งวดงาน จะสิ้นสุดสัญญาวันที่ 6 เมษายน 2569 และคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ นัดประชุมในวันที่ 18 เมษายน 2568 การประชุมครั้งที่ 1/2568 เรื่องพิจารณาการขอใช้วัสดุและขอความร่วมมือเร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้าง ส่งมอบงาน งวดที่ 1 และ 2 ให้ทัน ก่อนวันที่ 30 กันยายน 2568
7	อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,796 ตารางเมตร โรงพยาบาลหนองหาน ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง	โรงพยาบาลหนองหาน	อุดรธานี	18.ผู้ควบคุมงานรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน	๒	26/11/2024	21/7/2026	12	3	1	2	- ประชุมเพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงฐานรากเสาเข็มเจาะ เป็นฐานรากชนิดแผ่ เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 68 - มีมติอนุมัติในหลักการให้ผู้รับจ้างก่อสร้างฐานรากแบบแผ่ และอยู่ระหว่างส่งเอกสารแบบแปลนให้กองแบบแผนพิจารณา - กองแบบแผนพิจารณางานเปลี่ยนแปลงฐานรากอาคาร (ฐานรากแผ่) แล้ว ตรงตามข้อกำหนดและรูปแบบ เห็นควรให้ผู้รับจ้างใช้เป็นแนวทางในการก่อสร้างได้ (ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างฐานรากแผ่แล้วเสร็จ) - ผู้รับจ้างได้ดำเนินงานก่อสร้างฐานรากชนิดแผ่เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดที่ 1 - 6 ภายในเดือน กันยายน 2568 ผู้บริหารมีการติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง - อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง คาดว่าจะเบิกจ่ายงานงวดที่ 1 และงวดที่ 2 ภายใน กรกฎาคม 2568 - อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างงานงวดที่ 3
19	หอผู้ป่วยใน 7 ชั้น (จำนวน 156 เตียง) เป็นอาคาร คสล.7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,184 ตารางเมตร (โครงสร้างคานพื้นดินไหว) โรงพยาบาลวังสะพุง ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 1 หลัง	โรงพยาบาลวังสะพุง	เลย	18.ผู้ควบคุมงานรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน	9มค68	9มค68	7ธค69	20	20	2	0ไม่มีล่าช้า	อยู่ระหว่างงานงวด 3
40	อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุฉุกเฉิน นวัตกรรมรักษาและสำนักงาน เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 11,600 ตารางเมตร โรงพยาบาลพังโคน ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 1 หลัง	โรงพยาบาลพังโคน	สกลนคร	11.จัดทำบันทึกรายงานผลการพิจารณา	12-30 เม.ย.2568	-	๒	19	6	0	19	- สำนักงบประมาณเห็นชอบความเหมาะสมของราคาของรายการอาคารผู้ป่วยนอกฯ (หนังสือด่วนที่สุดที่ นร 0712/2465 ลว. 31 ม.ค.68) - รวบ.สาธารณสุขลงนามอนุมัติขยายเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีถึงปี 2571 (3 มี.ค.68) - ผู้เสนอราคารายที่ 1 ไม่ยื่นราคา - อยู่ระหว่างเสนอ ยกเลิกประกวดราคา

1.การบริหารจัดการงบลงทุนปี 2567 ที่กันเงินเหลื่อมปีไว้ใช้จ่ายในปี 2568

1.2 รายการงบลงทุนปี 2567 เหลื่อมปี 2568(ก่อสร้างผูกพัน) ที่ดำเนินงานล่าช้า/เสี่ยงพับ แยกรายจังหวัด(ต่อ)

ลำดับ	ชื่อรายการตาม พรบ.	ชื่อสถานที่	จังหวัด	ทำถึงขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง	วันที่คาดว่าจะลงนามสัญญา	วันที่ลงนามจริง	วันครบกำหนดส่งมอบตามสัญญา	งวดงานทั้งสิ้น	จำนวนงวดงานปี 2568 (ระบุงวดงาน)	ปัจจุบันดำเนินการถึงงวดงานที่	จำนวนงวดงานที่ล่าช้า	สาเหตุความล่าช้า
41	อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,919 ตารางเมตร โรงพยาบาลบ้านม่วง ตำบลม่วงอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 1 หลัง	โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต	สกลนคร	17.ผู้รับจ้างก่อนเริ่มงานก่อสร้างตามแผนแผนบริหารสัญญาและแผนควบคุมงาน	🚫	-	5/9/2026	10	0	1	10	- อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 1
รายการที่ กบรส.ติดตามเป็นพิเศษ												
42	ห้องชุดครอบครัว 24 ครอบครัว เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 819 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่องดาว ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 1 หลัง	โรงพยาบาลพระอาจารย์วัน อุตต	สกลนคร	17.ผู้รับจ้างก่อนเริ่มงานก่อสร้างตามแผนแผนบริหารสัญญาและแผนควบคุมงาน	-	31/10/2024	26/10/2025	8	6	6	0ไม่มีล่าช้า	- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงานงวดที่ 6
45	อาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง (มาตรฐาน) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,508 ตารางเมตร (โครงสร้างชั้นแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลศรีสงคราม ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 1 หลัง	โรงพยาบาลศรีสงคราม	นครพนม	17.ผู้รับจ้างก่อนเริ่มงานก่อสร้างตามแผนแผนบริหารสัญญาและแผนควบคุมงาน	🚫	14/3/2025	11/3/2026	8	6	1	2	ลงนามสัญญาวันที่ 14 มีนาคม 2568 สิ้นสุดสัญญา 11 มีนาคม 2569 ผู้รับจ้างดำเนินการตามงวดงานที่ 1 สำเร็จเฉพาะ คองกรีต 16 ต้น, ฐานรากคอนกรีตไปแล้ว 35 ฐาน, เสาตอม่อคอนกรีตไปแล้ว 30 ต้น คาดว่าน่าจะส่งมอบงวดงานที่ 1 ได้ไม่เกิน 25 สิงหาคม 2568
รายการที่ กบรส.ติดตามเป็นพิเศษ												
46	อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,919 ตารางเมตร (โครงสร้างชั้นแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลนาหว้า ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 1 หลัง	โรงพยาบาลนาหว้า	นครพนม	3.กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ/ขอบเขตของงาน (TOR) /BOQ	28/8/2025	🚫	🚫	10	1	0	0ไม่มีล่าช้า	อยู่ระหว่างเสนอผู้มีอำนาจลงนามเผยแพร่ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา
รายการที่ กบรส.ติดตามเป็นพิเศษ												
57	อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 23,765 ตารางเมตรโรงพยาบาล บึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 หลัง	โรงพยาบาลบึงกาฬ	บึงกาฬ	17.ผู้รับจ้างก่อนเริ่มงานก่อสร้างตามแผนแผนบริหารสัญญาและแผนควบคุมงาน	🚫	22/3/2024	5/3/2026	23	23	1	6	เนื่องจาก สัญญาจ้างก่อสร้าง ลงนามในวันที่ 11 มีนาคม 2567 เริ่มเข้าดำเนินการก่อสร้างในเดือนเมษายน 2567 ** การดำเนินงานก่อสร้าง ในงวดงานที่ 1 การก่อสร้างฐานราก อยู่ในช่วงฤดูฝน ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2567- เดือน สิงหาคม 2567 มีน้ำท่วมทั้งฐานราก และบริเวณโครงการก่อสร้างเป็นบ่อน้ำเต็ม (ตมั่ว) ทำให้น้ำซึม ส่งผลให้ไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างได้
58	อาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,487 ตารางเมตร (โครงสร้างชั้นแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลบึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 หลัง	โรงพยาบาลบึงกาฬ	บึงกาฬ	18.ผู้ควบคุมงานรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน	🚫	11/9/2024	🚫	14	9	3	1	ตรวจรับงวด 3 วันที่ 21 มีนาคม 2568 เนื่องจากเบิกจ่ายไม่ทัน จึงทำเรื่องขอยกยเวลาเบิกจ่ายงวด 3 วงเงิน 3 ล้านบาท

2.การบริหารจัดการงบลงทุนปี 2568

2.1 การบริหารงบลงทุน(ครุภัณฑ์)ปี 2568

ลำดับ	จังหวัด	เงินทั้งหมด(รายการ)	จัดทำแผน/กำหนด spec		ประกาศเชิญชวน		รอลงนามสัญญา		ลงนามสัญญา		รอส่งมอบ/ตรวจรับ		เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	
			7/7/2025	28/7/2025	7/7/2025	28/7/2025	7/7/2025	28/7/2025	7/7/2025	28/7/2025	7/7/2025	28/7/2025	7/7/2025	28/7/2025
1	อุดรธานี	495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	495	494
2	สกลนคร	36	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	35	29
3	นครพนม	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28
4	เลย	73	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	72	73
5	หนองคาย	127	0	0	0	0	10	0	0	1	0	16	117	110
6	หนองบัวลำภู	502	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	500	502
7	บึงกาฬ	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15
รวม		1,276	0	0	0	0	11	0	0	1	3	24	1262	1251

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2568 เวลา 16.00 น.

ภาพรวมรายการงบลงทุนปี 2568 (ครุภัณฑ์)

- เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 1,251 หน่วย (98.04%)
- รอส่งมอบ/อยู่ระหว่างการตรวจรับพัสดุ 13 รายการ 25 หน่วย
 - อุดร 1 รายการ 1 หน่วย
 - สกลนคร 7 รายการ 7 หน่วย
 - หนองคาย 5 รายการ 17 หน่วย

2.การบริหารจัดการงบลงทุนปี 2568

2.1 การบริหารงบลงทุน(ครุภัณฑ์)ปี 2568 เฉพาะรายการที่รอส่งมอบ/อยู่ระหว่างการตรวจรับพัสดุ แยกรายจังหวัด

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย(บาท)	จำนวน	ชื่อสถานที่	จังหวัด	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	ทำถึงขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง	วันที่ลงนามสัญญาจริง	วันครบกำหนดส่งมอบตาม	เดือนที่คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้ว	สาเหตุความล่าช้า
5	เครื่องเร่งอนุภาคแบบอุโมงค์หมุนด้วยอัตราความเร็วสูง พร้อมระบบภาพนำวิถี ชนิดกิโวลต์	150,000,000.00	1	โรงพยาบาลสกลนคร	สกลนคร	E_bidding	17.ส่งสำเนาสัญญา/ข้อตกลงให้ สตง. และกรมสรรพากร	21/5/2025	15/2/2026	🚫	
12	เครื่องดมยาสลบชนิดมาตรฐาน	1,700,000.00	1	โรงพยาบาลวานรนิวาส	สกลนคร	E_bidding	19.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับพัสดุจากผู้ขาย	7/1/2025	7/4/2025	1/4/2025	
68	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ระดับความคมชัดสูง 3 หัวตรวจ	2,500,000.00	1	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน	สกลนคร	E_bidding	17.ส่งสำเนาสัญญา/ข้อตกลงให้ สตง. และกรมสรรพากร	3/12/2067	3/3/2025	🚫	
69	กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวิดีโอทัศนแบบคมชัดสูง พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ	3,700,000.00	1	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน	สกลนคร	E_bidding	17.ส่งสำเนาสัญญา/ข้อตกลงให้ สตง. และกรมสรรพากร	3/12/2067	3/3/2025	🚫	
85	เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า พร้อมรีโมทคอนโทรล	1,760,000.00	1	โรงพยาบาลวานรนิวาส	สกลนคร	E_bidding	17.ส่งสำเนาสัญญา/ข้อตกลงให้ สตง. และกรมสรรพากร	2/1/2025	2/4/2025	1/4/2025	
86	เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน	2,200,000.00	1	โรงพยาบาลวานรนิวาส	สกลนคร	E_bidding	17.ส่งสำเนาสัญญา/ข้อตกลงให้ สตง. และกรมสรรพากร	7/1/2025	7/4/2025	1/4/2025	
87	โคมไฟฟ้าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 แลช หลอดแอลอีดี	1,450,000.00	1	โรงพยาบาลวานรนิวาส	สกลนคร	E_bidding	17.ส่งสำเนาสัญญา/ข้อตกลงให้ สตง. และกรมสรรพากร	2/1/2025	2/4/2025	1/4/2025	
176	กล้องส่องตรวจและผ่าตัดกระดูกสันหลัง	6,000,000.00	1	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ	หนองคาย	E_bidding	16.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดภายหลังพ้นจากระยะเวลาอุทธรณ์	1/5/2068	29/8/2025	🚫	
181	เครื่องตรวจวินิจฉัยมะเร็งเรื้องต้นประสิทธิภาพสูงแบบครบวงจร	25,000,000.00	1	โรงพยาบาลหนองคาย	หนองคาย	E_bidding	17.ส่งสำเนาสัญญา/ข้อตกลงให้ สตง. และกรมสรรพากร	31/3/2025	29/7/2025	1/9/2025	ผู้ขายได้แจ้งนัดส่งมอบ วันที่ 30 มิถุนายน 2568
182	เครื่องเอกซเรย์ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 mA แบบส่องตรวจภาพดิจิทัลโดยใช้ชุดแปลงสัญญาณภาพ	15,000,000.00	1	โรงพยาบาลหนองคาย	หนองคาย	E_bidding	17.ส่งสำเนาสัญญา/ข้อตกลงให้ สตง. และกรมสรรพากร	31/3/2025	29/7/2025	1/9/2025	ผู้ขายได้แจ้งนัดส่งมอบ วันที่ 30 พ.ค.2568
184	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 4 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง (Central+ 4 parameter Monitor ECG ,BP, SpO2 IBP, PCO2 8 Beds)	3,600,000.00	4	โรงพยาบาลหนองคาย	หนองคาย	E_bidding	17.ส่งสำเนาสัญญา/ข้อตกลงให้ สตง. และกรมสรรพากร	31/3/2025	29/7/2025	1/9/2025	ผู้ขายได้แจ้งนัดส่งมอบ วันที่ 30 มิถุนายน 2568
185	เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร และความดัน พร้อมระบบเครื่องอัตโนมัติ	1,500,000.00	10	โรงพยาบาลหนองคาย	หนองคาย	E_bidding	19.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับพัสดุจากผู้ขาย	17/6/2025	15/10/2025	1/9/2025	
71	กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวิดีโอทัศนแบบคมชัด พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ	2,000,000.00	1	โรงพยาบาลบ้านผือ	อุดรธานี	E_bidding	17.ส่งสำเนาสัญญา/ข้อตกลงให้ สตง. และกรมสรรพากร	28/4/2025	28/4/2025	🚫	เรียกให้มาทำสัญญา 28 พ ย 68

2.การบริหารจัดการงบลงทุนปี 2568

2.2 การบริหารงบลงทุน(สิ่งก่อสร้าง)ปี 2568

ลำดับ	จังหวัด	จำนวนทั้งหมด (รายการ)	ทำถึงขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง							
			จัดทำ แผน/TOR/BOQ/ ร่างประกาศ	ประกาศเชิญชวน	รอลงนาม สัญญา	ลงนามสัญญา	เริ่มก่อสร้าง/ จัดหาตามแผน	คกก.ตรวจสอบ	เบิกจ่ายเงินงวด สุดท้าย	ส่งคืนงบประมาณ
1	อุดรธานี	14	0	0	1	0	2	4	5	2
2	สกลนคร	4	0	0	1	0	3	0	0	0
3	นครพนม									
4	เลย	3	0	0	0	0	2	0	1	0
5	หนองคาย	4	0	0	2	0	2	0	0	0
6	หนองบัวลำภู	7	0	0	1	2	1	0	3	0
7	บึงกาฬ	5	0	0	0	0	5	0	0	0
รวม		37	0	0	5	2	15	4	9	2

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2568 เวลา 16.00 น.

รายการงบลงทุน68(สิ่งก่อสร้าง) ที่ยังไม่เริ่มดำเนินการก่อสร้าง

- รอลงนาม 5 รายการ(รพศ.อุดรธานี จ.อุดรธานี , รพ.พังโคน จ.สกลนคร, รพ.โพนพิสัย และ รพ.รัตนวาปี จ.หนองคาย, รพ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู)
- ลงนามสัญญาแล้ว 2 รายการ(รพ.นาหวาง รพ.หนองบัวลำภู(2รายการ))

2.การบริหารจัดการงบลงทุนปี 2568

2.2 การบริหารงบลงทุน(สิ่งก่อสร้าง)ปี 2568 เฉพาะรายการที่ยังไม่ลงนามสัญญา แยกรายจังหวัด

ลำดับ	รายการ	วงเงินรวม(บาท)	ชื่อสถานที่	จังหวัด	ประเภท จ้าง	วันที่คาดว่าจะลง นามสัญญา	วันที่ลงนาม จริง	ทำถึงขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง	วันครบกำหนด ส่งมอบตาม สัญญา	วันที่คาดว่าจะส่ง มอบงานงวด สุดท้าย	งวดงาน ทั้งสิ้น	จำนวน งวดงานปี 2568	สาเหตุความล่าช้า
10	หอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (จำนวน 114 เตียง) เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,797 ตารางเมตร	108,861,600.00	โรงพยาบาลพังโคน	สกลนคร	ก่อสร้าง ผูกพัน	สิ้นเดือน กรกฎาคม	-	13.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อน การลงนามในสัญญา		๒	14		- อยู่ระหว่างเรียกทำสัญญาจ้าง
2	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง เป็นอาคาร คสล.7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,908 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	75,239,200.00	โรงพยาบาล โพนพิสัย	หนองคาย	ก่อสร้าง ผูกพัน	30/7/2025	๒	13.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อน การลงนามในสัญญา		18/1/2027	15	5	เว้นระยะอุทธรณ์ก่อนลงนาม สัญญา สิ้นสุด 25 ก.ค.68
33	อาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพ (ระดับปฐมภูมิ) เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 611 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	13,481,000.00	โรงพยาบาลรัตนวาปี	หนองคาย	ก่อสร้างปี เดียว	30/7/2025	๒	13.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อน การลงนามในสัญญา		5/3/2026	6	2	เว้นระยะอุทธรณ์ก่อนลงนาม สัญญา สิ้นสุด 25 ก.ค.68
8	อาคารทันตกรรม 8 ยุติต เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 766 ตารางเมตร	25,147,900.00	โรงพยาบาล สุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	ก่อสร้าง ผูกพัน	10/7/2025	21/5/2025	11.จัดทำบันทึกรายงานผลการ พิจารณา		20/4/2026	8	2	คณะกรรมการพิจารณาผล ประชุม วันที่ 25 กค. 2568 และ จะรายงานผล ภายใน 30 กค. 68
31	ปรับปรุงห้อง DATA/Monitoring	100,000.00	โรงพยาบาลนาหวัง เฉลิมพระเกียรติ 80 วสสช	หนองบัวลำภู	ก่อสร้างปี เดียว	๒	๒	11.ส่งสำเนาสัญญา/ข้อตกลง ให้ สตง. และกรมสรรพากร		๒	1		อยู่ระหว่างดำเนิน การปรับปรุง
32	ปรับปรุงห้อง telemedicine	50,000.00	โรงพยาบาลนาหวัง เฉลิมพระเกียรติ 80 วสสช	หนองบัวลำภู	ก่อสร้างปี เดียว	๒	๒	11.ส่งสำเนาสัญญา/ข้อตกลง ให้ สตง. และกรมสรรพากร		๒	1		อยู่ระหว่างดำเนิน การปรับปรุง
1	อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.9 ชั้น และ 1 ชั้นใต้ดิน พื้นที่ใช้สอยประมาณ 31,420 ตารางเมตร	537,170,000.00	โรงพยาบาลอุดรธานี	อุดรธานี	ก่อสร้าง ผูกพัน	15/7/2025	๒	11.จัดทำบันทึกรายงานผลการ พิจารณา		๒			ขั้นตอนการจัดทำราคากลาง ขั้นตอนการขออนุมัติราคากลาง ล่าช้า

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2568 เวลา 16.00 น.



การจัดทำร่าง พรบ.รายจ่ายงบประมาณ

รายการงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เขตสุขภาพที่ 8

29 กรกฎาคม 2568



การบริหารจัดการงบประมาณปี 2569

สรุปรายการ (ร่าง) พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 เขตสุขภาพที่ 8 **รายการสิ่งก่อสร้าง**

จังหวัด	หน่วยงาน	จำนวนรายการทั้งหมด	จำนวนรายการการดำเนินงานจัดทำ (ร่าง)			หมายเหตุ
			แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง	แต่งตั้งบุคคล/กรรมการจัดทำร่าง TOR/ BOQ	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ/ ขอบเขตงาน (TOR)/ BOQ	หากไม่ลงว่าดำเนินการแล้ว จะไม่นับเป็น 1
อุดรธานี	รพ.บ้านดุง	1	0	0	0	แจ้งแล้วเสร็จ ก.ย.68 - อยู่ระหว่างรอแบบแปลน และ BOQ จากกองแบบแผน
	รพ.ทุ่งฝน	1	0	0	0	แจ้งแล้วเสร็จ ก.ย.68 - อยู่ระหว่างรอแบบแปลน และ BOQ จากกองแบบแผน
สกลนคร	รพ.สกลนคร	2	0	0	0	แจ้งแล้วเสร็จ ส.ค. 68
นครพนม	รพ.นาหว้า	1	1	0	0	แจ้งแล้วเสร็จ ส.ค. 68 - อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดและราคากลาง
เลย	รพ.ผาขาว	1	1	1	0	แจ้งแล้วเสร็จ ส.ค.68 - อยู่ระหว่างรอแบบแปลน และ BOQ จากกองแบบแผน
	รพ.ภูหลวง	1	1	1	0	แจ้งแล้วเสร็จ ส.ค.68 - อยู่ระหว่างรอแบบแปลน และ BOQ จากกองแบบแผน
	รพ.นาแห้ว	1	1	1	0	แจ้งแล้วเสร็จ ส.ค.68 - อยู่ระหว่างรอแบบแปลน และ BOQ จากกองแบบแผน
	รพ.หนองหิน	1	1	1	0	แจ้งแล้วเสร็จ ส.ค. 68
หนองคาย	สสจ.หนองคาย	1	1	1	0	แจ้งแล้วเสร็จ ส.ค.68 - อยู่ระหว่างรอแบบแปลน และ BOQ จากกองแบบแผน
	รพ.โพนพิสัย	1	1	1	0	แจ้งแล้วเสร็จ ส.ค.68 - อยู่ระหว่างรอแบบแปลน และ BOQ จากกองแบบแผน
หนองบัวลำภู	รพ.ศรีบุญเรือง	1	0	0	0	แจ้งแล้วเสร็จ ส.ค. 68
	รพ.สุวรรณคูหา	1	0	0	0	แจ้งแล้วเสร็จ ส.ค. 68
บึงกาฬ	รพ.บึงกาฬ	1	0	0	0	แจ้งแล้วเสร็จ ก.ค. 68
รวม	เขต 8	14	7	6	0	

การบริหารจัดการงบลงทุนปี 2569

สรุปรายการ (ร่าง) พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 เขตสุขภาพที่ 8 **รายการครุภัณฑ์**

จังหวัด	หน่วยงาน	จำนวนรายการทั้งหมด	จำนวนรายการ การดำเนินงานจัดทำ (ร่าง)			หมายเหตุ
			แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง	แต่งตั้งบุคคล/กรรมการจัดทำร่าง TOR/ BOQ	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ/ ขอบเขตงาน (TOR)/ BOQ	
อุดรธานี	รวม	47	45	45	10	
	สสจ.อุดรธานี	35	35	35	0	แจ้งแล้วเสร็จ ก.ย.68
	รพ.อุดรธานี	10	8	8	8	แจ้งแล้วเสร็จ ส.ค. 68
	รพ.กุมภวาปี	2	2	2	2	ดำเนินการครบทุกรายการ
สกลนคร	รวม	65	65	57	57	
	สสจ.สกลนคร	37	37	37	37	ดำเนินการครบทุกรายการ
	รพ.สกลนคร	20	20	20	20	ดำเนินการครบทุกรายการ
	รพ.สว่างแดนดิน	5	5	0	0	แจ้งแล้วเสร็จ ส.ค. 68
	รพ.วานรนิวาส	3	3	0	0	แจ้งเสร็จสิ้น ก.ค. 68
นครพนม	รวม	26	26	21	0	
	สสจ.นครพนม	21	21	21	0	แจ้งแล้วเสร็จ ส.ค. 68
	รพ.นครพนม	5	5	0	0	แจ้งแล้วเสร็จ ก.ค. 68
เลย	รวม	26	26	26	0	
	สสจ.เลย	21	21	21	0	แจ้งแล้วเสร็จ ส.ค. 68
	รพ.เลย	5	5	5	0	แจ้งแล้วเสร็จ ส.ค. 68
หนองคาย	รวม	42	42	2	2	
	สสจ.หนองคาย	19	19	0	0	แจ้งแล้วเสร็จ ก.ค. 68
	รพ.หนองคาย	2	2	2	2	ดำเนินการครบทุกรายการ
	รพ.ท่าบ่อ	21	21	0	0	แจ้งแล้วเสร็จ ก.ค. 68
หนองบัวลำภู	รวม	17	17	13	5	
	สสจ.หนองบัวลำภู	13	13	13	5	แจ้งแล้วเสร็จ ส.ค. 68
	รพ.หนองบัวลำภู	4	4	0	0	แจ้งแล้วเสร็จ ส.ค. 69
บึงกาฬ	รวม	18	17	0	0	
	สสจ.บึงกาฬ	15	14	0	0	แจ้งเสร็จสิ้น ก.ค. 68
	รพ.บึงกาฬ	3	3	0	0	แจ้งเสร็จสิ้น ก.ค. 68
เขต 8	รวม	241	238	164	74	



GROUP LINECPO



THANK YOU

FOR YOUR ATTENTION

 <https://r8way.moph.go.th>

