




การบริหารจัดการงบประมาณ ปี 2561 - 2562

PLATFORM

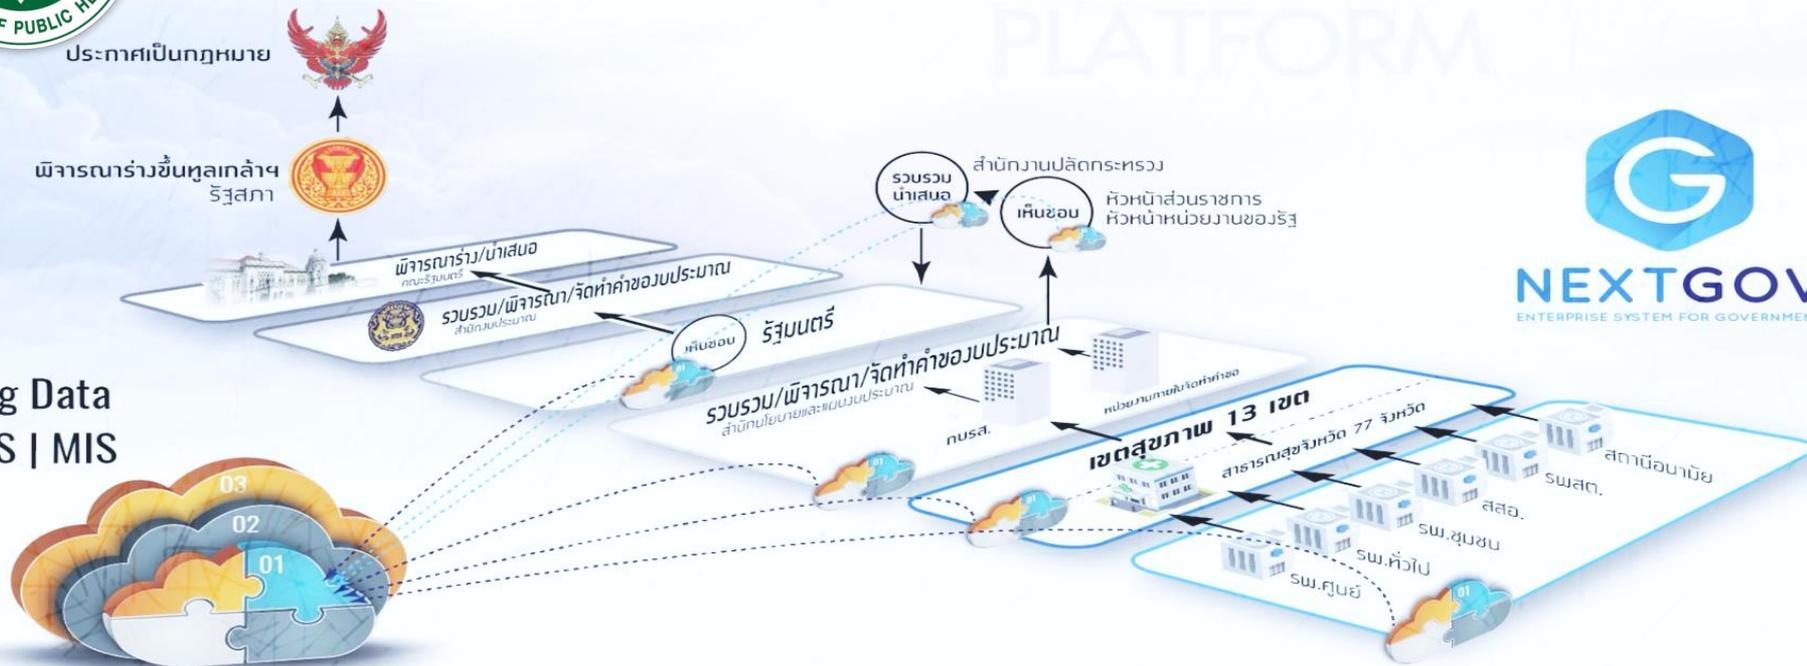

01 Private Cloud (Gateway)


กองบริหารการสาธารณสุข

17 September 2018

ผลการเบิกจ่าย งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ณ วันที่ 3 กันยายน 2561

ร้อยละการเบิกจ่าย

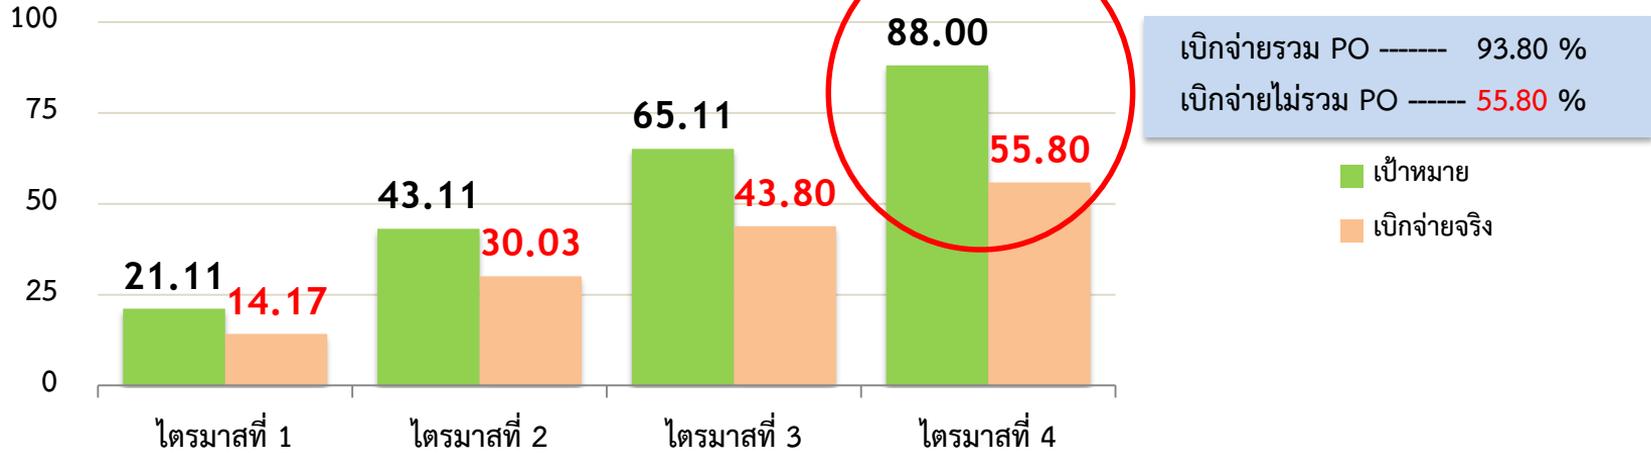

หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 188 ลว. 11 เม.ย.61

ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น เร่งรัดการก่องหน้ผูกพันรายจ่ายลงทุนรายการปีเดียวให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2561 สำหรับรายจ่ายลงทุนรายการก่องหน้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ให้เร่งดำเนินการและก่องหน้ผูกพันในโอกาสแรก

สรุปภาพรวมผลการดำเนินงาน งบลงทุน ค่าสิ่งก่อสร้างผูกพัน ปี 2561 (รายละเอียด) ที่ยังไม่ลงนามสัญญา ณ วันที่ 13 กันยายน 2561

★ ลงนามสัญญาครบทุกรายการ


ก่อสร้างผูกพัน 53 หน่วย

ลงนามแล้ว	48	หน่วย
ได้ผู้รับจ้าง (รอลงนาม)	2	หน่วย
ไม่ได้ผู้รับจ้าง	3	หน่วย

■ ไม่ได้ผู้รับจ้าง

■ ได้ผู้รับจ้าง (รอลงนาม)

จำนวนหน่วย
2

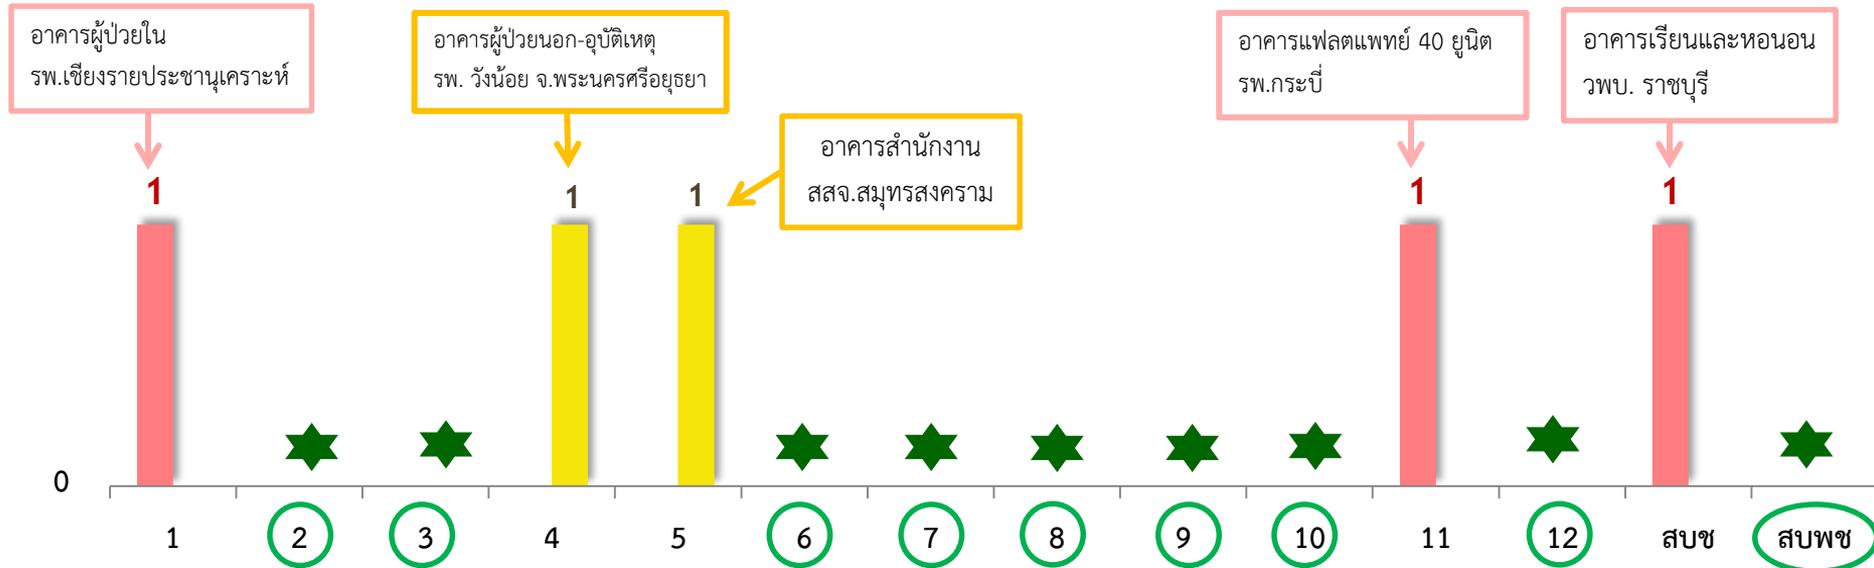

รายการก่อสร้างปี 2561 ที่ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง

ณ วันที่ 13 กันยายน 2561

ลำดับ	เขต	รายการ	วงเงิน (ล้านบาท)	ขั้นตอนปัจจุบัน
		ก่อสร้างผูกพัน จำนวนทั้งสิ้น 3 รายการ		
1	1	อาคารผู้ป่วยใน รพ.เชียงใหม่ประชานุเคราะห์	132.058	<ul style="list-style-type: none"> - เนื่องจากราคากลางเกินงบประมาณที่ได้รับ 19% สป.สร.เสนอเรื่องไปยัง สงป. เมื่อ 14 ส.ค.61 - สงป.เห็นชอบวงเงิน 132.058 ลบ. เมื่อ 5 ก.ย.61 - ปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอหนังสือแจ้งจังหวัด เรื่อง สงป.เห็นชอบวงเงิน - คาดว่าจะลงนามสัญญา 12 ต.ค.61
2	11	อาคารแฟลตแพทย์ 40 ยูนิต รพ.กระบี่	48.948	<ul style="list-style-type: none"> ครั้งที่ 1 (วิธีประกวดราคา) ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ครั้งที่ 2 (วิธีคัดเลือก) เสนอราคา 59.5 ลบ. สงป.เห็นชอบ 51.3954 ลบ. (สป.สร.แจ้งจังหวัดให้ต่อรองราคาให้อยู่ในวงเงิน 51.3954 ลบ. ซึ่งผู้รับจ้างลดลง คงเหลือ 56.0 ลบ. ยังสูงกว่าราคาที่สงป.เห็นชอบ 4.604 ลบ. จึงยกเลิกและจัดจ้างใหม่) ครั้งที่ 3 (วิธีประกวดราคา) ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อของจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการฯ คาดว่าจะลงนาม 19 ธ.ค. 61
3	สบช.	อาคารเรียนและหอนอน วพบ. ราชนบุรี	134.541	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการจัดจ้างครั้งที่ 2 เนื่องจากครั้งที่ 1 การจัดหาไม่เป็นไปตามระเบียบ (เอกสารเผยแพร่ใน website วพบ. ไม่ครบถ้วน) - ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา - คาดว่าจะลงนามสัญญา ต.ค.61

รายการก่อสร้างผูกพันใหม่ ปี 2561 ที่ได้ผู้รับจ้าง (รอลงนามสัญญา)

ณ วันที่ 13 กันยายน 2561


ลำดับ	เขต	รายการ	วงเงิน (ล้านบาท)	ขั้นตอนปัจจุบัน
		จำนวนทั้งสิ้น 2 รายการ		
1	4	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ รพ. วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา	87.30	<ul style="list-style-type: none"> - เนื่องจากราคากลางสูงกว้างประมาณ 15% (สงป.อนุมัติราคากลาง 83.36 ลบ., ราคากลางท้องถิ่น 92.05 ลบ.) - จังหวัดประกวดราคาได้ 87.3 ลบ. - สป.สร. จึงขออนุมัติวงเงินเพิ่มเติมไปยัง สงป. จาก 83.36 ลบ เป็น 87.3 ลบ. และสงป.เห็นชอบวงเงินดังกล่าว - รองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบ เรื่องขออนุมัติวงเงินเพิ่มเติมจากกรม.ในวงเงิน 87.3 ลบ. - เสนอเรื่องไปยังเลขา ครม. เมื่อ 4 ก.ย.61 - ปัจจุบันรอบรรจุในวาระ ครม. เพื่อพิจารณา
2	5	อาคารสำนักงาน สสจ.สมุทรสงคราม	45.3	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการครั้งที่ 2 เนื่องจากผู้รับจ้างไม่ขยายวันยื่นราคา - ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ในวงเงิน 45.3 ลบ. ตามราคาที่สงป.อนุมัติ - ปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอผลการจัดจ้างไปยัง ผวจ. - คาดว่าจะลงนามสัญญา 27 ก.ย.61

ภาพรวม ร่าง พรบ. 2562 รายการลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ปัจจุบัน ผ่านการพิจารณาจาก สนช.ในวาระ 2-3 เมื่อวันที่ 30 ส.ค.61


วงเงินรวมทั้งสิ้น 12,589,989,000 บาท

สัดส่วนตามแผนงาน

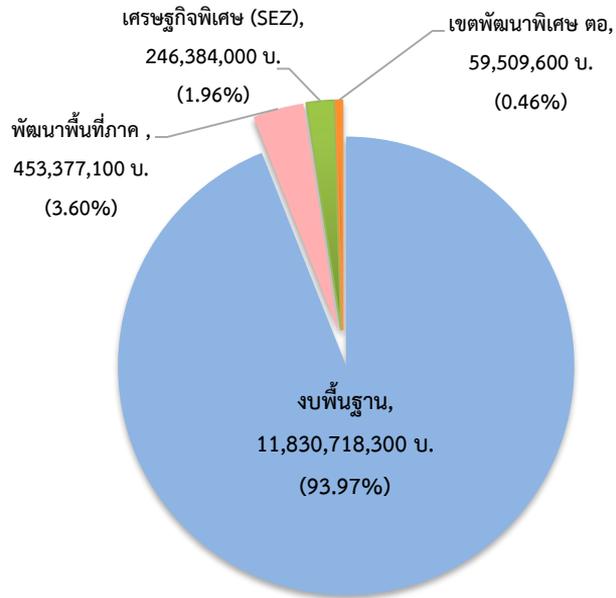

สัดส่วนตามประเภทการลงทุน

วงเงินรวม (8,530 หน่วย) 12,589.9 ลบ.

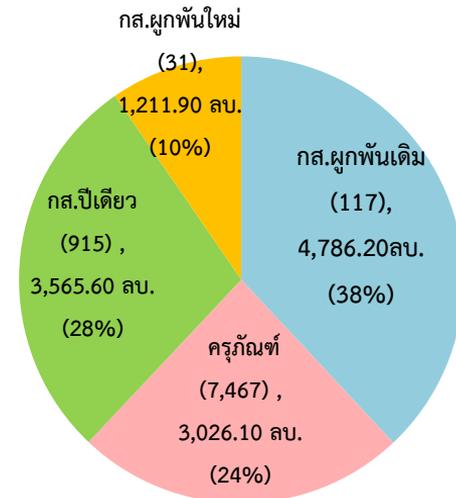

(ไม่รวม สบช.และ สบพช.)

นโยบายการบริหารงบประมาณ รายการงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562



1. ห้ามเปลี่ยนแปลงรายการ รูปแบบรายการสิ่งก่อสร้างและสถานที่ก่อสร้าง
2. กรณีไม่สามารถดำเนินการได้ ให้แจ้งคืบงบประมาณพร้อมชี้แจงเหตุผลภายในไตรมาสที่ 1
3. ให้ดำเนินการตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด
4. กรณีงบปีเดียว หากมีเงินเหลือจ่าย ให้แจ้งโอนเงินกลับคืนส่วนกลาง **ทันที**เมื่อมีการลงนามสัญญาแล้ว
5. กรณีงบบุคลากรเพิ่ม ขอให้ดำเนินการตามงวดงาน/งวดเงินในสัญญา ตามแผนการดำเนินงานที่ส่งไปยังสำนักงบประมาณ
6. สป.สร. จะติดตามผลการดำเนินงานผ่านโปรแกรมติดตามงบประมาณ ของ กบรส. เท่านั้น
 - ▶ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ในโปรแกรมติดตามงบประมาณ ---> กบรส. สรุปผลความก้าวหน้า โดยใช้ข้อมูลจากโปรแกรมฯ ทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ และนำเสนอผู้บริหาร
 - ▶ ก่อสร้างผูกพันเดิม ---> กบรส. สรุปผลความก้าวหน้าโดยใช้ข้อมูลจากโปรแกรมฯ ทุกวันที่ 25 ของเดือนและนำเสนอผู้บริหาร

แนวทางการดำเนินงานตามมาตรการ

กรมบัญชีกลาง

แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดจัดหาพัสดุตาม พรบ. 2562
หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 334 ลว. 24 ก.ค. 2561

สป.สร.

1. แจ้งรายการ วงเงินเบื้องต้น ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการฯ
หนังสือด่วนที่สุดที่ สร. 0207.03/20529 ลว.31 ก.ค. 2561
2. แจ้งเวียนแนวทางเร่งรัดจัดหาพัสดุตาม พรบ. 2562 ตามแนวทางกรมบัญชีกลาง
3. ขออนุมัติจัดสรรอย่างเป็นทางการ เมื่อทราบวงเงินชัดเจนจากสำนักงบประมาณ
--> 7 ก.ย. 2561 (ขณะนี้ สป.อยู่ระหว่างเสนอผู้บริหารขออนุมัติจัดสรร
งบประมาณ ปี พ.ศ.2562)

หน่วยงานที่ ได้รับ จัดสรร

1. เมื่อได้รับเอกสารรายการ วงเงินเบื้องต้น ให้ตรวจสอบความถูกต้อง รายการ /วงเงิน
/แบบแปลน / BOQ / งานงวดเงิน
2. จัดทำแบบฟอร์มตรวจสอบความพร้อมรายการ ส่ง กรบส. ภายในวันที่ 10 ส.ค. 2561
3. จัดทำแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ส่ง กบรส.ภายในวันที่ 20 ส.ค. 2561
4. เตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้างและสามารถลงนามสัญญาได้ทันทีเมื่อได้รับจัดสรร
งบประมาณ

การส่งแบบตรวจสอบความพร้อมรายการ งบลงทุน ปีงบประมาณ 62

(จำแนกรายเขต) ข้อมูล ณ วันที่ 14 ก.ย. 61



กำหนดส่งเอกสารวันที่ 10 ส.ค. 2561

ภาพรวมส่งเอกสาร

84.91 %

ครุภัณฑ์


6,324 / 7,467 รายการ
(84.70 %)

ก่อสร้าง

819 / 946 รายการ
(86.58%)

การส่งแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายการงบประมาณ ปีงบประมาณ 62

(จำแนกรายเขต) ข้อมูล ณ วันที่ 14 ก.ย. 61

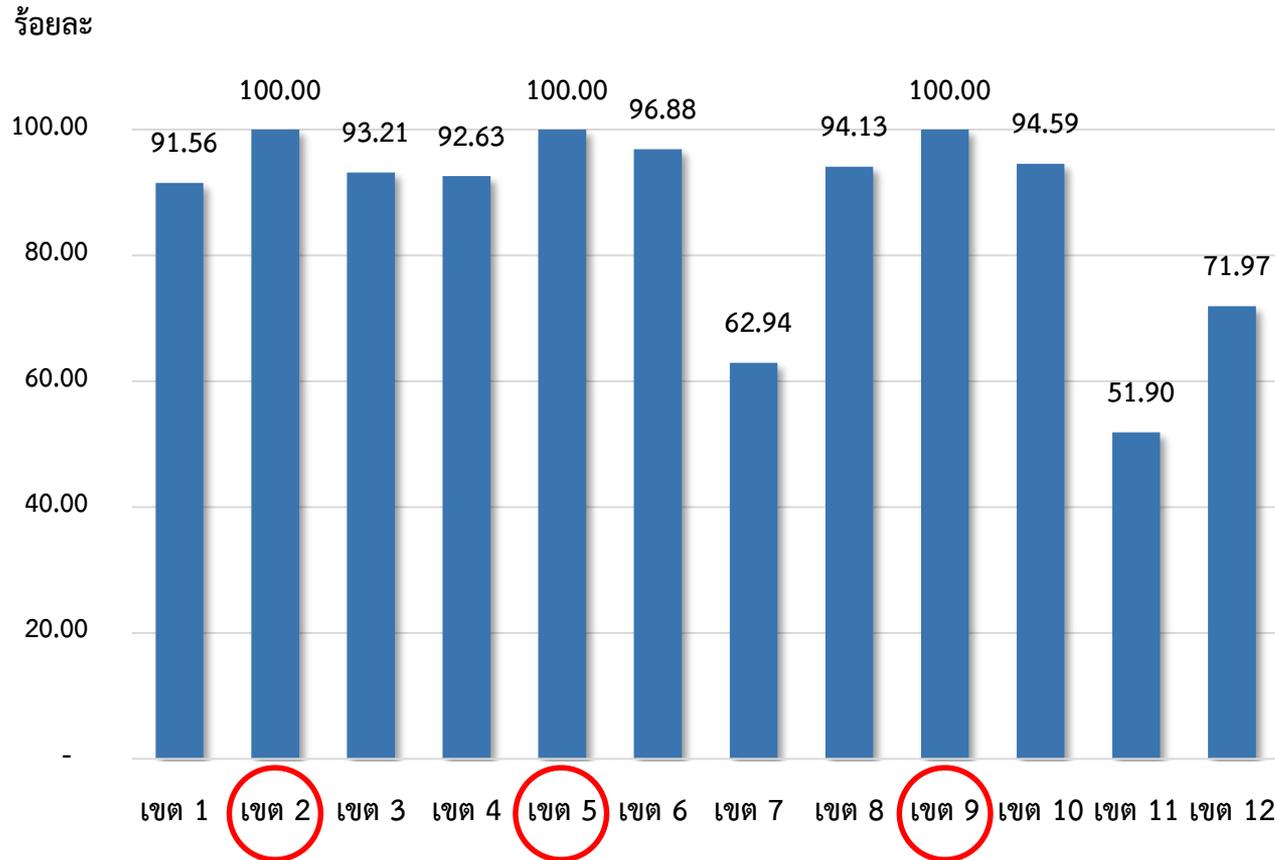

กำหนดส่งเอกสารวันที่ 20 ส.ค. 2561

ภาพรวมการส่งแผนฯ
87.21 %

ครุภัณฑ์
6,514 / 7,467 รายการ
(87.25 %)

ก่อสร้าง
822 / 946 รายการ
(86.89 %)

แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดจัดหาพัสดุตาม พรบ. 2562

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 334 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2561



1. หน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณ ที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง พ.ศ.2560 หมายความว่า วงเงินงบประมาณเมื่อนุกรมราชการฯได้พิจารณาร่าง พรบ.2562 รายหน่วยงานของรัฐเป็นที่สิ้นสุดแล้วก่อนที่จะนำเสนอคณะกรรมการวิสามัญ



2. ดำเนินการ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง / เผยแพร่ในระบบ / ปิดประกาศ และรีบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้พร้อมที่จะทำสัญญาได้ทันทีเมื่อ พรบ.2562 มีผลบังคับใช้ กล่าวคือ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้จนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้ขาย หรือผู้รับจ้างไว้ก่อนได้ เว้นแต่ ขั้นตอนการลงนามสัญญาหรือข้อตกลง



3. กำหนด เป็นเงื่อนไขในเอกสารประกาศไว้ด้วยว่า “การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามสัญญาหรือข้อตกลงได้ต่อเมื่อ พรบ. 2562 มีผลบังคับใช้และได้รับจัดสรรงบประมาณ จากสำนักงบประมาณแล้ว” กรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรในครั้งดังกล่าว หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดหาได้



4. บันทึก ข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ได้ทันทีโดยไม่ต้องระบุรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งเงิน แต่ หน่วยงานของรัฐต้องบันทึกรหัสดังกล่าวให้แล้วเสร็จก่อนการลงนามสัญญา

แผนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมปี 2563

เตรียมความพร้อมบัญชีอ้างอิงรายการครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง และโปรแกรมค่าของงบประมาณ

จัดทำและชี้แจงร่างแนวทางการขอ โดยเบื้องต้นวงเงินแต่ละเขตไม่เกิน 1,000 ลบ. ทุกแผนงาน
(อยู่ระหว่างเสนอแนวทางให้ผู้บริหารพิจารณา)

แจ้งจังหวัดให้เตรียมความพร้อมรายการตามแผนค่าขอปี 2563 (ประมาณ 21 กันยายน 61)

จังหวัดบันทึกข้อมูลค่าขอผ่านโปรแกรมของกองบริหารการสาธารณสุข ภายใน 12 ตุลาคม 2561

ส่งแผนค่าขอพร้อมหนังสือนำส่งลงนามโดยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ไปยังกบรส.

***** ทั้งนี้ แนวทางการจัดทำค่าขอ 2563 อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามยุทธศาสตร์การจัดสรร และปฏิทินงบประมาณ 2563 *****



Health Administration Division

กองบริหารการสาธารณสุข
