

ความก้าวหน้าการเปิดหน่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โรงพยาบาลกุดบาก



9 กุมภาพันธ์ 2569

โรงพยาบาลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร



ความเป็นมา

อาคารศูนย์ไตเทียมโรงพยาบาลกุดบาก ได้รับบริจาคจัดสร้างโดย พระครูภาวนาสกลธรรม (หลวงปู่ขาว พุทธรักขิต) ปลุกสร้างในเขตพื้นที่โรงพยาบาลกุดบาก **พื้นที่ใช้สอย 400 ตร.ม. จำนวนเตียงทั้งหมด 16 เตียง** (มีห้องแยกโรค 1 เตียง) เป็น**จ้างเหมาบริการเอกชนมาดำเนินการ**





วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในเขตอำเภอกุดบากและใกล้เคียง ได้รับการบำบัดแทนไต โดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในสถานบริการใกล้บ้าน
2. เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ป่วยและญาติ ที่ต้องเดินทางไปฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร หรือโรงพยาบาลต่างอำเภอ
3. เพื่อให้กลุ่มผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะ 4 - 5 ที่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณ และไม่มีญาติพาไปรับบริการ สามารถเข้าถึงบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมได้มากขึ้น




อาคารและการจัดพื้นที่หน่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม





อาคารและการจัดพื้นที่หน่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

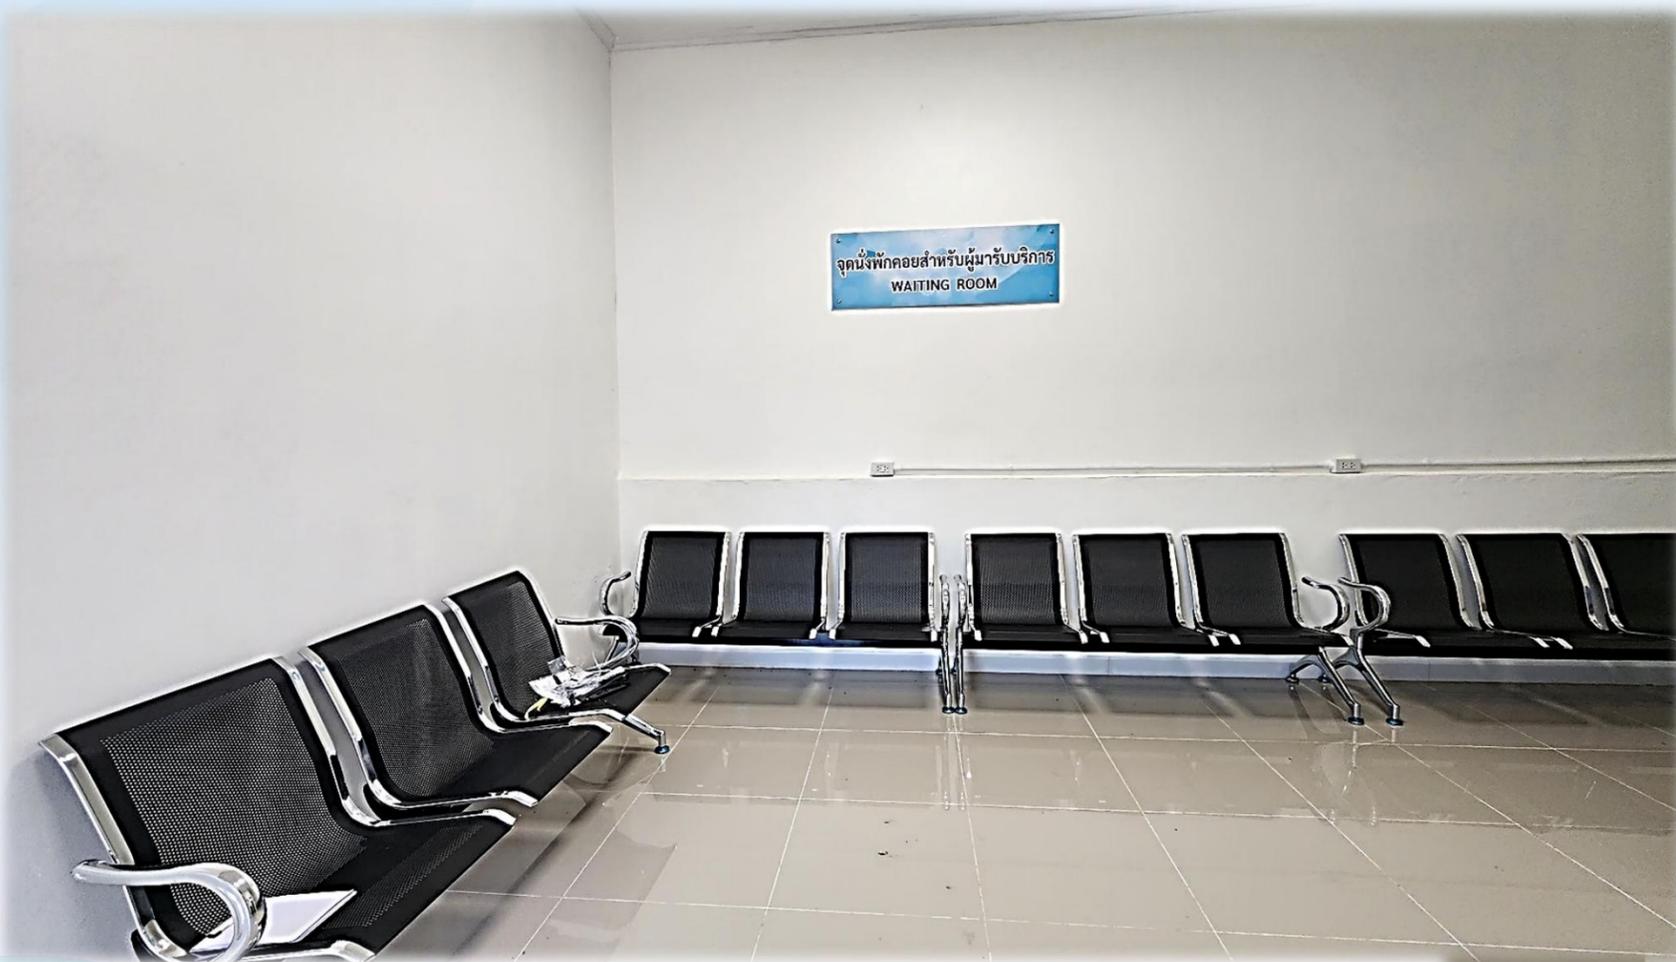

โซนพักคอยผู้ป่วย





ระบบสำรองน้ำ

- ❖ แหล่งต้นน้ำ จากบ่อบาดาล โรงพยาบาลกุดบาก เป็นระบบประปาใช้ทั้งโรงพยาบาล
- ❖ ระบบน้ำสำรอง เก็บในถังขนาด 2000 ลิตร จำนวน 10 ถัง





ระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย จะอยู่ด้านหลังอาคาร



จำนวนผู้ป่วยที่คาดการณ์จะเข้ารับบริการ

จำนวนผู้ป่วย HD อ.กุดบาก ปี 69 ที่รักษาที่ รพศ.สกลนคร

- ต.กุดบาก 13 คน
- ต.กุดไฮ 27 คน
- ต.นาม่อง 15 คน

รวม 55 คน

จำนวนผู้ป่วย HD เขตรอยต่อ ปี 69 ที่รักษาที่ รพศ.สกลนคร

- ต.นาใน (อ.พรรณานิคม) 3 คน
- ต.หนองบัว (อ.นิคมน้ำอูน) 2 คน

รวม 5 คน



คาดการณ์ประมาณ 60 คน



ขั้นตอนการดำเนินการเปิดหน่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม รพ.กุดบาก

ว.ด.ป.	การดำเนินการ
11 มิ.ย. 68	รับมอบอาคารไตเทียม จากพระครูภาวนาสกลธรรม(หลวงปู่ขาว พุทธรักขิตโต
29 ก.ค. 68	มีมติเห็นชอบให้เปิดหน่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมรพ.กุดบาก
สค-ก.ย. 68	ศึกษาระบบงานตามมาตรฐาน ศึกษาTOR และจัดทำร่างTOR
ต.ค. 68	เสนอการจัดบริการฟอกเลือดฯ เข้าแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2569
พ.ย. 68	รออนุมัติแผนฯ
ธ.ค. 68	เผยแพร่ร่าง TOR
ม.ค. 69	ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และพิจารณาผล
ก.พ.- มี.ค. 69	ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ทำสัญญา และผู้ชนะเข้าปรับปรุง ติดตั้งระบบ
เม.ย.-พ.ค. 69	รับประเมิน คกก.เขต / คกก.ศรต / ยื่นสมัคร สป.สช.
มิ.ย.69	เริ่มเปิดบริการ



ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

1. ดำเนินการล่าช้า เนื่องจาก ได้รับมอบอาคาร ช่วงปลายปีงบประมาณ 2568 ต้องได้รอบรรจุเข้าแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงฯ ปี 2569
2. TOR มีรายละเอียดซับซ้อน ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ และพิจารณาผล



โรงพยาบาลกุดบาก
Kutbak Hospital

THANK YOU
